

## الأبنية التعليمية

تقرير تفصيلي عن الانجازات والمشروعات المنتهية في الفترة من 2016/7/1 حتى 2016/12/31

القطاع	اسم / وصف المشروع	الموقع	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	نسبة التنفيذ	جدوى المشروع
الهيئة العامة للأبنية التعليمية	خلف الراس السودان تجريبي بنات - 42 فصل	السيوف قبلى 1 - المنتزة أول	2016/5/16	2016/10/30	9.852	9.852	%100	توفير الخدمة التعليمية للاهالى
	خلف الراس السودان تجريبي بنين - 42 فصل	السيوف قبلى 1 - المنتزة أول	2017/2/6	2016/10/30	11.975	11.975	%100	توفير الخدمة التعليمية للاهالى
	المرحومة احسان خالد تربية خاصة - 16 فصل	السيوف قبلى 1 - المنتزة أول	2016/2/23	2016/9/1	5.673	5.673	%100	توفير الخدمة التعليمية للاهالى
	المتفوقين ببرج العرب	مدينة برج العرب	2015/10/7	2016/12/8	32.737	32.737	%100	توفير سكن للطلاب
<b>الإجمالي</b>					<b>60.237</b>	<b>60.237</b>		



تقرير تفصيلي عن موقف المشروعات الجارى تنفيذها

المعوقات	نسبة التنفيذ %	المنصرف بالمليون جنية	الاعتماد بالمليون جنية	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	الموقع	اسم المشروع	القطاع
لا يوجد	%1	6.081	24.325	2018/1/17	2017/2/19	السيوف قبلى - المنتزة	المدرسة المصرية اليابانية	الهيئة العامة للإبائية التعليمية
لا يوجد	%22	1.229	6.612	2017/11/30	2016/11/21	ابيس وخورشيد - شرق	ابيس الاولى	
لا يوجد	%22	0	3.809	2017/10/29	2016/11/30	عزبة سعد - شرق	الابراهيمية	
لا يوجد	%45	1.566	3.857	2017/7/15	2016/5/15	ابيس وخورشيد - شرق	التحرير تجريبي	
لا يوجد	%65	1.990	3.862	2017/5/2	2016/4/25	ابيس وخورشيد - شرق	التحرير تعليم اساسى	
لا يوجد	%18	0	3.443	2017/11/30	2016/11/30	حجر النواتية - شرق	الصالحية الابتدائية	
لا يوجد	%18	3.443	8.866	-	2015/8/2	حجر النواتية - شرق	العوايد اساسى	
لا يوجد	%1	0	2.192	2018/1/1	2017/2/1	عزبة الصفيح - شرق	رياض الاعدادية بنين	
لا يوجد	%67	1.682	3.301	2017/6/17	2016/7/27	امبروزو محرم بك	ابن انس التجريبية	
لا يوجد	%35	0.865	2.609	2017/9/15	2016/9/20	قطاع النهضة - وسط	ابيس 10	
لا يوجد	%55	1.214	2.576	2017/6/4	2016/8/10	امبروزو محرم بك - وسط	الشهيد على صالح	
-	%0	0	2.598	-	2016/11/3	محرم بك - وسط	عزبة الصيادين	
لا يوجد	%55	2.572	5.052	2017/6/12	2016/6/13	غيظ العنب - غرب	الزهور اساسى	
لا يوجد	%36	0.603	2.245	2017/6/3	2016/5/6	الوردبان قبلى - غرب	السيدة عائشة ب	
لا يوجد	%47	0.920	2.526	2017/7/2	2015/12/28	المتراس - غرب	النور	
لا يوجد	%24	0.312	2.598	2017/9/15	2016/11/14	العجمى البحرية	اللواء محمد نجيب	
لا يوجد	%24	0.180	2.079	2017/9/13	2016/11/15	البيطاش شرق - العجمى	حمزة بن عبد المطلب	
لا يوجد	%0	0	3.262	2017/12/18	2017/2/20	البيطاش - العجمى	د . سميرة موسى ث . بنات	
لا يوجد	%1	0	3.855	2018/2/9	2017/2/6	البيطاش شرق - العجمى	طلانح العجمى	
لا يوجد	%15	0	2.845	2017/11/5	2017/1/5	قطاع النهضة - العامرية	الحضارة تعليم اساسى	
لا يوجد	%5	0	8.129	2017/10/17	2016/12/20	زاوية عبد القادر - العامرية	السيدة ام سلمة	
لا يوجد	%85	1.855	3.174	2017/3/8	2016/9/19	زاوية عبد القادر - العامرية	العرجى ب	
التراخيص	%0	0	4.038	-	2016/2/23	قطاع مريوط - برج العرب	بنجر 5	
لا يوجد	%65	2.135	4.028	2017/3/30	2016/5/3	الغربانيات - برج العرب	نجع الصحفاق	
التراخيص	%1	0	3.354	-	2016/5/16	الجويرة - برج العرب	نجع مصباح	
		<b>26.647</b>	<b>115.235</b>			<b>الاجمالى</b>		

## الكهرباء

المشروعات التنموية التي تم تنفيذها فى نطاق محافظة الإسكندرية من 2016/7/1 الى 2016/12

القطاع	اسم / وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	التكلفة بالمليون جنية	نسبة التنفيذ %	العائد من المشروع	
الكهرباء	تغذية مشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط الغنب (خدمة عامة)	٠٣/٠٣/٢٠١٦	٠٧/٠٩/٢٠١٦	6.680	100	توصيل التيار الكهربائى واضاءة عامة	
	تغذية إسكان شباب طوسون	١٤/٠٣/٢٠١٣	٢٧/٠٧/٢٠١٦	10.727	100		
	تغذية الشركة العامة للصوامع السلام (توسعات وخدمة عامة)	٢٢/٠٩/٢٠١٥	٠١/٠٩/٢٠١٦	2.136	100		
	تغذية المجاورة الثانية وجزء من الأولى بالحي السكنى الخامس - جهاز برج العرب (توسعات وخدمة عامة)	٢٨/٠٥/٢٠١٦	٠١/٠٨/٢٠١٦	22.289	100		
	تغذية محطة رفع + 2 خزان أرضى لدى المسطحات لمياه الصرف الصحى (توسعات وخدمة عامة) - البيطاش	٣١/٠٥/٢٠١٦	٢٤/١١/٢٠١٦	0.909	100		
	تغذية جهاز مشروعات أرضى القوات المسلحة 117 تنظيم شارع محمد على على طريق 14 مايو مع شارع مسجد حاتم امام نادى الجياد	٣١/٠٥/٢٠١٦	٢٠/١١/٢٠١٦	3.310	100		
	تغذية مستشفى جمال عبد الناصر بطريق الحرية - الهيئة العامة للتأمين الصحى	٠٦/٠٢/٢٠١٦	١٨/١١/٢٠١٦	1.552	100		
	تغذية صومعة الصباحية أمام مرور أبيس خلف الهندسة الزراعية منطقة الصباحية	١٢/٠٩/٢٠١٥	٢٠/١٢/٢٠١٦	0.592	100		
	إحلال شبكة الموقف الجديد (إضاءة عامة)	٢٢/٠٣/٢٠١٦	١٩/٠٩/٢٠١٦	0.113	100		
	مربع سور نادى سبورتنج (إضاءة عامة)	٠١/٠٨/٢٠١٦	١٥/١١/٢٠١٦	0.210	100		
	مربع لاجيتيه (إضاءة عامة)	٠١/٠٨/٢٠١٦	١٥/١١/٢٠١٦	0.216	100		
	تغذية بدالة الكيلو 21 تغذية بدالة الصفا والمروة (الصرف الصحى)	2016/5/16	2016/10/23	0.059			
	اجمالى			48.793			

صور المشروعات :

مشروع غيظ الغنب :



الموقف الجديد :



## المشروعات التنموية الجارى تنفيذها


القطاع	اسم / وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	التكلفة بالمليون جنية	نسبة التنفيذ	صعوبات تعوق استكمال وتنفيذ المشروع تحتاج لتدخل وزارى من عدمه
الكهرباء	تغذية الإسكان الإجتماعى 258 عمارة برج العرب	٢٨/٠٦/٢٠١٥	جارى العمل	35	%100	باقى إطلاق التيار وتوريد المهمات بمعرفة المشترك
	تغذية عدد (4) ثلاجات خدمة عامة - العامرية (القوات المسلحة إدارة التعيينات)	٠٨/٠١/٢٠١٥	جارى العمل	8.154	%100	باقى إطلاق التيار
	إحلال وتطوير موزع ك 34.5 صرف صحى (توسعات وخدمة عامة)	٢٣/٠٣/٢٠١٥	جارى العمل	0.130	%100	جارى تركيب العدادات لم يقم المشترك بتدعيم آبار أراضى الموزع
	برك الأكسدة - طريق الحزام الأخضر (توسعات وخدمة عامة)	٠٧/٠٢/٢٠١٦	جارى العمل	7.690	%50	متوقف على إخطار تلافى الملاحظات بالمبنى
	محطة صرف صحى رقم (5) شارع القاعدة البيطاش (توسعات وخدمة عامة)	٢١/٠٣/٢٠١٦	جارى العمل	0.601	%75	باقى على توريد المحولات
	صرف صحى رقم 2 ك 26 طريق إسكندرية / القاهرة مرغم (توسعات وخدمة عامة)	٠٥/٠٤/٢٠١٦	جارى العمل	1.289	%100	باقى قيام المشترك باستخراج تصاريح الحفر وتوريد المهمات
	صرف صحى رقم 3 ك 25 طريق إسكندرية / القاهرة مرغم (توسعات وخدمة عامة)	٠٥/٠٤/٢٠١٦	جارى العمل	0.569	%100	باقى قيام المشترك باستخراج تصاريح الحفر وتوريد المهمات
	صرف صحى المطورين أ.ب.ج منطقة صناعية الخامسة أ.ب (توسعات وخدمة عامة)	٠٥/٠٥/٢٠١٦	جارى العمل	7.808	%75	باقى قيام المشترك بتوريد المهمات ، وتجهيز الموزع بنظام إطفاء Co2 بالغمر
	المجاورة الأولى بالحي السكنى السابع - جهاز برج العرب (توسعات وخدمة عامة)	٣١/٠٥/٢٠١٦	جارى العمل	0.359	%100	باقى تدعيم البئر الأرضى بمعرفة المشترك وجارى أعمال الإختبارات
	تطوير الطريق الصحراوى من كوبرى مرغم وحتى كارتة الرسوم (إضاءة عامة)	٢٦/٠٧/٢٠١٤	جارى العمل	5.497	%100	باقى إطلاق التيار وتوريد المهمات بمعرفة المشترك
	إحلال وتجديد طريق محور التعمير من كوبرى القبارى وحتى كوبرى الملح (إضاءة عامة)	٠٦/١٢/٢٠١٤	جارى العمل	5.610	%100	باقى إطلاق التيار وتوريد المهمات بمعرفة المشترك
	<b>الإجمالى</b>				<b>72.707</b>	

صور المشروعات :

الطريق الصحراوى :



محور التعمير :

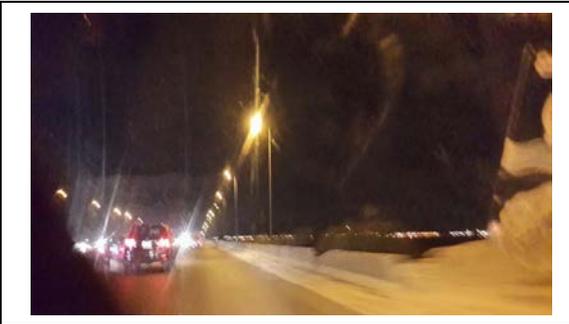

## الإسكان

المشروعات الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات التنموية التى تنتهى فى تاريخ 2017/6/30

القطاع	اسم المشروع	وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	التكلفة بالمليون جنية	نسبة التنفيذ	صعوبات تعوق استكمال وتنفيذ المشروع وهل تحتاج لتدخل وزارى من عدمه	الجهة المشاركة فى التنفيذ	الجهة المسنولة عن إدارة المشروع
تطوير العشوائيات	إنشاء مساكن بديلة للصيادين المقيمين على جانبى حوض مجرى الطرد بمنطقة المكس	جارى تنفيذ عدد (9) عمارات بإجمالى عدد (215) وحدة سكنية بقطعة الأرض المقابلة للعشش التى يسكن بها الأهالى مراعاة للجانب الاجتماعى و طبيعة عملهم كصيادين بمجرى المكس . ينتظر الانتهاء من الوحدات السكنية بالكامل فى شهر يوليو 2017	2015/4/26	2017/7/1	16.914 مليون بخلاف الأعمال المستجدة والعمارة رقم (9)	%85	عدم إسناد جهاز ترميم الساحل الشمالى تنفيذ العمارة رقم (9) حتى تاريخه لحدى الشركات المنفذة مما يترتب عليه تعطيل إزالة وإعادة تسكين قاطنى منطقة المكس فى المواعيد المحددة نظرا للتأخر فى أعمال إسناد العمارة المتبقية .	صندوق تطوير العشوائيات "جهة ممولة"	جهاز ترميم الساحل الشمالى
الإسكان	انشاء عدد 51 عمارة اسكان الشباب بالابجيكاب بالهاتفويل - حى العجمى	1224 علي ثلاث مجموعات أ، ب، ج	2009	—	(أ) 23.437 (ب) 21.079 (ج) 19.738	%77 %45 %60	العمل متوقف نتيجة لعدم صرف مستحقات المقاول والموضوع بالقضاء	—	—

مساكن ظلمبات المكس :



مساكن الايجيكاب :



## الغاز الطبيعي

المشروعات الجارى تنفيذها فى مناطق إمتياز شركة تاون جاس

الحى	اسم المشروع	المنطقة	الموقع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ	المعوقات
شرق	تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي الأرضية	منطقة الاسكان الصناعى – ش الشركة العربية بجوار قسم شرطة رمل ثانى	منطقة الاسكان الصناعى – ش الشركة العربية بجوار قسم شرطة رمل ثانى	2017/1/31	2017/3/31	%90	لا يوجد معوقات ويوجد تعاون من جميع أجهزة المحافظة
	تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي الأرضية	أبوسليمان	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش) أحمد أبو سليمان – ش العشرين – ش الترعة المرذومة – ش دنا العمومى )	2016/10/1	2017/5/31	%70	لا يوجد معوقات ويوجد تعاون من جميع أجهزة المحافظة
	تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي الأرضية	منطقة زعرانة والظاهرية بحرى السكة الحديد	منطقة زعرانة والظاهرية بحرى السكة الحديد	2016/5/29	2017/3/31	%80	لا يوجد معوقات ويوجد تعاون من جميع أجهزة المحافظة
	تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي الأرضية	منطقة عزبة سكنية القديمة والجديدة	منطقة عزبة سكنية القديمة والجديدة	2016/8/6	2017/3/31	%80	لا يوجد معوقات ويوجد تعاون من جميع أجهزة المحافظة
المنتزه أول	تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي الأرضية	منطقة الفلكى	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش16- ش السلام – ش أحمد عبد الوهاب – ش مدخل عزبة زقزوق – ش مصطفى كامل )	2016/6/19	2017/4/30	%80	لا يوجد معوقات ويوجد تعاون من جميع أجهزة المحافظة
المنتزه ثانى	تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي الأرضية	أرض بشاى وعرامة	المنطقة المحصورة بين شوارع :- (ش45 – ش 30 عرامة – ش النبوى المهندس – ش مصطفى كامل )	2016/11/22	2017/7/30	%50	لا يوجد معوقات ويوجد تعاون من جميع أجهزة المحافظة

## الصحة

### المشروعات التنموية التي تم تنفيذها فى نطاق محافظة الإسكندرية عام 2017/2016

القطاع	وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	التكلفة بالمليون جنية	نسبة التنفيذ	العائد من المشروع
الصحة	انشاء شبكة الحريق بمستشفى أبو قير العام - حى المنتزة ثان	2015/12/29	2016/3	0.466	%100	تنفيذ توصيات ادارة السلامة والصحة المهنية وتأمين مبنى المستشفى ضد اخطار الحريق
	انشاء شبكة الحريق بمستشفى أطفال الرمل - حى شرق	2015/5/2	2016/4	1.418	%100	تنفيذ توصيات ادارة الحماية المدنية وتأمين المستشفى ضد اخطار الحريق
	تجهيزات طبية وغير طبية للمبنى الجديد مستشفى الجمهورية - حى غرب	2015/4/1	2016/7	8	%100	تجهيز المركز التخصصى الجديد بالتجهيزات الطبية وغير طبية لادخاله المنظومة الصحية
	انشاء شبكة الغازات الطبية بمستشفى برج العرب الجديدة - برج العرب	2015/7	2017/2	0.362	%100	امداد المستشفى بشبكة غازات طبية جديدة
	تطوير وحدة قرية الأسد - حى العامرية	2015/1/26	2016/11	الاعتماد المخصص لدى وزارة الصحة وهى جهة الاسناد	%100	تقديم الخدمة الصحية لأهالى القرية
	تطوير وحدة قرية طبية 2 - حى العامرية	2015/1/26	2016/11		%100	تقديم الخدمة الصحية لأهالى القرية
	الاجمالى				10.246	

## تقرير تفصيلي عن موقف المشروعات الجارى تنفيذها

الموقف التنفيذي	المعوقات	نسبة التنفيذ %	تاريخ النهو	تاريخ البدء	الموقف المالى			جهة التنفيذ	وصف المشروع	اسم المشروع	القطاع
					ماتم صرفه	القيمة التعاقدية	مصادر التمويل				
<p>تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى بالكامل ومغلف بالطوب .                      وبتاريخ 2017/1/2:                      - تم الانتهاء من الدهانات الداخلية (أعمال المحارة) للأدوار الثالث والرابع من المبنى الرئيسى وذلك بالتوافق مع أعمال الصاج وشبكة الحريق لنفس الأدوار .                      - جارى انتظار اعتماد الرسم الهندسى الخاص بمبنى القوى الكهربائية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء فى بناء مبنى القوى الكهربائية .                      - جارى التنسيق مع الشركة الخاصة لتوريد المولدات والمحولات للتسليم .                      - تم بناء المبنى الإدارى ( مخازن للمستشفى )                      - تم طلب قيمة إستخراج التراخيص توصيل المرافق ( كهرباء - مياه - صرف صحى ) بمبلغ 193 ألف جنيه من قطاع التخطيط الاستراتيجى بالوزارة .                      - تعتبر نسبة التنفيذ 52% من كامل المشروع .</p>	لا يوجد معوقات	52%	ديسمبر 2017	2014/10/29	35% كما يوجد بالتعاقد وجرى صرف مبلغ 25 مليون بأمر الدفع الالكترونى بتاريخ 2016/12/24	130 مليون	خزانة عامة بنك الاستثمار القومى	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المشروعات الكبرى)	هدم وإعادة بناء	م. العجمى المركزى 100 سرير G	الصحة

تقرير تفصيلي عن موقف المشروعات الجارى تنفيذها

المعوقات	نسبة التنفيذ	المنصرف جنية	الاعتماد مليون جنية	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	الموقع	اسم المشروع	القطاع
لا يوجد	70%	- مبلغ 167.901 ألف جنية - مبلغ 137.450 ألف جنية - مبلغ 343.504 ألف جنية	0.680	نهاية 2017	2015/7/5	حي المنتزة ثان	تطوير عنبرين 9،10 رجال وحريم مستشفى صدر المعمورة	الصحة
لا يوجد	75%	مبلغ 121.825 ألف جنية - مبلغ 132.385 ألف جنية	0.500	نهاية 2017	2015/6/12	حي غرب	تطوير عنبرين 1،3 مستشفى صدر كوم الشقافة	
لا يوجد	55%	- 35% دفعة تعاقد ودفعة مقدمة - تم صرف 25 مليون جنية	130	نهاية 2017	2014/11/29	حي العجمى	هدم وبناء مستشفى العجمى المركزى	
لا يوجد	70%	4.7 مليون جنية	7	نهاية 2017	2015/2014	حي العامرية	- تطوير مستشفى العامرية العام لتصبح مستشفى نموذجي - انشاء شبكة حريق - احلال وتجديد شبكة الكهرباء	
لا يوجد	25%	لدى وزارة الصحة وهي جهة التعاقد والاسناد	1.6	2018/2017	2016/2/9	مركز ومدينة برج العرب	تطوير وحدة قوية 19 بنجر السكر	
			139.78				الاجمالي	

تقرير تفصيلي عن الانجازات والمشروعات المنتهية **للكباري والأنفاق** في الفترة من 2016/7/1 حتى 2016/12/31

القطاع	اسم / وصف المشروع	تاريخ البدء	التكلفة بالمليون جنية	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ	جدوى المشروع ومدى الافادة للمواطنين
الكباري والأنفاق	احلال وتجديد كوبرى الصيادين (ترعة اكاسيا) صيانة الكوبرى القديم واصلاح البلاطات وقد تم ازالة الغطاء الخرساني للكوبرى ومراشمة ودهان الحديد القديم وتم الدهانات العازلة للبلاطات وتم التسليم الابتدائي للكوبرى بتاريخ 2016/10/25	2015/9/6	2.5	2016/9/6	100	صيانة الكوبرى القديم لسلامة المواطنين
	احلال وتجديد كوبرى مشاه امام مدرسة نبوية موسى ازالة الكوبرى القديم وانشاء كوبر جديد تم نهو الخوازيق والاساسات وتركيب المعبرة المعدنية والسلاسم وتم التسليم الابتدائي للكوبرى بتاريخ 2016/6/19	-	4	2016/6/19	100	تسهيل عبور المشاة للطريق
	الاجمالي		6.5			

كوبرى مشاه نبوية موسى



المشروعات الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات التنموية التى تنتهى فى تاريخ 2017/6/30

القطاع	اسم / وصف المشروع	تاريخ البدء	التكلفة بالمليون جنية	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ حتى تاريخه	جدوى المشروع ومدى الافادة للمواطنين
كبارى وانفاق	<u>استكمال نفق كليوباترا :</u> الوصف : اضافة فتحه اضافية للنفق الاصلى بعرض 10 متر	2015/6/8 من وقت اصدار تصاريح السكة الحديد	50	2017/6/30	%85	زيادة السعة المرورية لنفق كليوباترا وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة
	<u>مشروع احلال وتجديد كوبرى الملح بالعجمى :</u> الوصف : كوبرى من الخرسانة المسلحة بطول 562 متر وعرض حوالى 17 متر	2015/4/9	40.5 بخلاف نقل المرافق ومقايسة السكة الحديد	2017/3/17	%81	احلال وتجديد الكوبرى القائم نظرا لسوء حالته وخطورتها
الاجمالى			90.5			

## صور المشروعات :

نفق كليوباترا



كوبرى الملح :



## الصرف الصحي

المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في نطاق محافظة الإسكندرية من 2016/7/1 الى 2016/12

القطاع	اسم / وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	التكلفة بالمليون جنية	نسبة التنفيذ	العائد من المشروع
الصرف الصحي (احلال وتجديد)	تدعيم الفواصل لبعض الفرعات بخط الانحدار مجمع سيدى بشر قطر 1500م فى الجزء المحصور من شارع عبادى وحتى شارع خليل حمادة - طريق الكورنيش - المنتزة اول	2016/9/6	2017/1/5	3.004	%100	
	احلال وتجديد شارع 591 خلف مدرسة تدريب الكلاب بسيدى بشر قبلى - المنتزة اول	2016/10/9	2017/1/8	1.265	%100	
	احلال وتجديد الفرعات الرئيسية بشوارع 30 وتقاطعها مع الصفا والمروة حتى شارع 45 منطقة عرامة - المنتزة ثان	2016/5/21	2016/11/5	4.313	%82	
	احلال وتجديد بعض الفرعات ضمن مشروع تحسين الصرف الصحى بمنطقة حجر النواتية (شارع بيومى القصبى وشارع خماروية وشارع حجر النواتية حتى شارع مصطفى كامل ) شرق	2016/8/15	2016/12/31	1.353	%100	
	احلال وتجديد مجمع شارع منشية الزهراء بمنطقة المحروسة - شرق	2016/5/30	2017/2/29	3.126	%47	
	استكمال احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بشارع عبد الله عزت واحمد محسن والمنطقة المحيطة وربطها على مطبق نفق المنطقة الشرقية بشارع باشور (منطقة السيوف) شرق	2016/6/29	2016/8/28	1.061	%100	
	احلال وتجديد الفرعات بشوارع 2 وانشاء فرعة الربط من شارع 2 وحتى مطبق النفق وذلك باسلوب الدفع النفقى الموجه لفصل شوارع 1 ، 2 بعزبة عبد المنعم رياض - شرق	/11/12 2016	2017/5/12	0.697	%94	رفع كفاءة شبكات الصرف الصحى لتحسين المستوى البيئى بشوارع الاسكندرية ورفع المستوى الصحى
	احلال وتجديد وتدعيم شبكة الصرف الصحى بشارع العزيز البديع وبعض تفرعاته ورفع كفاءة محطة رفع حجر النواتية بعزبة القلعة - شرق	/11/28 2016	2017/11/27	7.186	%16	
	احلال وتجديد وتدعيم شارع مدارس القدس وطيبة بعزبة العمراوى الصغرى - شرق	2016/4/21	2016/11/18	4.070	%74	
	احلال وتجديد خط الصرف الصحى بعزبة بدوى واراض محمد اسماعيل وشارع الكرامة حتى النفق بشوارع 20 بمنطقة شرق طريق المحمودية - شرق	2015/4/24	2017/1/9	3.353	%68	
	احلال وتجديد وتدعيم شارع انوبيس بشبكة صرف صحى (ببارة - شنايش - خط طرد) - وسط	2016/12/8	2017/4/7	1.034	%67	
	احلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع (بطلان - البصرة - عارف - الشاشى - محرزى - مسجد جابر) محرم بك وسط	2015/3/26	2016/8/5	6.269	%63	
	احلال وتجديد شارع مسجد الحضرى وشارع عمر بن الخطاب - وسط	2015/9/15	2017/3/14	6.654	%55	
	احلال وتجديد قناة السويس البطيء وتفرعاته حتى طريق المحمودية مارا بميدان الغربانى - وسط		24 شهر من تاريخ البدء	12.426	%1	
	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بشارع شيديا من مطبق شارع ممفيس حتى مطبق مجمع شارع بورسعيد والفرعات مع ربط شارع عبد المنعم سند (سينما اوديون) على مطبق العداية الجديدة بمنطقة كامب شيزار - وسط	2016/7/9 تشوينات	2017/1/8	3.720	%42	
	احلال وتجديد وتدعيم شبكة الصرف الصحى بشارع فرنسا بدءا من نفق المنطقة الوسطى وحتى مجمع قصر راس التين والتفرعات - الجمرک	/12/31 2016	2018/12/30	15.327	%8	
احلال وتجديد وتدعيم لجزء من مجمع شارع 218 والمربوط على مطبق المنطقة الغربية (W-3) (اعادة ربط شوارع 8,7,6,5 بمنطقة نجع العرب على شارع 4) - غرب	2015/4/20	2017/4/19	26.050	%28		
احلال وتجديد خط الانحدار الرئيسى الخاص بمحطة رفع العوامى - العجمى	2016/9/6	2017/3/3	2.235	%47		
<b>الاجمالي</b>				<b>103.143</b>		

ملاحظة : هذا بخلاف ما يتم تنفيذه لاحلال وتجديد الشبكات ضمن مشروعات (سنوية شوارع مختلفة وسنوية الهبوطات) واحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الشركة

## المشروعات التنموية الجارية تنفيذها

القطاع	اسم / وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	الاعتماد بالمليون جنية	نسبة التنفيذ %	صعوبات تعوق استكمال وتنفيذ المشروع تحتاج لتدخل وزارى من عدمه
الصرف الصحي	احلال وتجديد الفرعات الرئيسية بشارع 30 وتقاطعها مع الصفا والمروة حتى شارع 45 منطقة عرامة - المنتزة ثان	2016/5/21	2016/11/5	1.443	%99	تم النهو
	احلال وتجديد وتدعيم شارع مدارس القدس وطيبة بعزبة العمراوى الصغرى - المنتزة ثان	2016/4/21	2016/11/18	1.585	%33	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد شارع 591 خلف مدرسة تدريب الكلاب بسيدى بشر قبلى - المنتزة أول	2016/10/9	2017/1/8	1.261	%86	جارى الاستلام وتحرير المستخلص الختامى
	احلال وتجديد وتدعيم شبكة الصرف الصحى بشارع العزيز البديع وبعض تفرعاته ورفع كفاءة محطة رفع حجر النواتية بعزبة القلعة - شرق	2016/11/28	2017/11/27	2	%42	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد خط الصرف بعزبة بدوى وارض محمد اسماعيل وشارع الكرامة حتى النفق بشارع 20 - شرق	2015/4/24	2017/1/9	1.348	%64	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد وتحسين الصرف الصحى بمنطقة الظاهرية للشوارع الفرعية لشارع عثمان محرم وعبد المنعم - شرق	2017/2/5	2017/11/4	0.725	%28	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد الفرعات بشارع 2 وانشاء فرعة الربط من شارع 2 وحتى مطبق النفق لفصل شوارع 1،2 بعزبة عبد المنعم رياض - شرق	2016/11/12	2017/5/12	0.710	%91	جارى الاستلام وتحرير المستخلص الختامى
	احلال وتجديد مجمع شارع منشية الزهراء بمنطقة المحروسة - شرق	2016/5/30	2017/2/29	1.797	%65	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بشارع عبد الله عزت واحمد محسن والمنطقة المحيطة وربطهما على مطبق نفق المنطقة الشرقية بشارع باشور (منطقة السيوف) شرق	2016/6/26	2016/12/28	0.845	%89	جارى الاستلام وتحرير المستخلص الختامى
	احلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع (بطلان - البصرة - عارف الشاشى محرزى - مسجد جابر) محرم بك - وسط	2015/3/26	2016/8/5	0.507	%33	جارى الاستلام وتحرير المستخلص الختامى
<b>الاجمالى</b>				<b>12.221</b>		

## المشروعات التنموية الجارى تنفيذها

القطاع	اسم / وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	التكلفة بالمليون جنية	نسبة التنفيذ %	صعوبات تعوق استكمال وتنفيذ المشروع تحتاج لتدخل وزارى من عدمه
الصرف الصحى	احلال وتجديد شارع مسجد الحضرى وشارع عمر بن الخطاب - وسط	2015/9/15	2017/3/14	2.145	62%	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد قناة السويس البطيء وتفرعاته حتى طريق المحمودية مارا بميدان الغرباى - وسط	24 شهر من تاريخ البدء		0.500	1%	جارى اجراءات البدء فى التنفيذ
	احلال وتجديد وتدعيم شارع انوبيس بشبكة صرف صحى (بيارة - شنايش - خط طرد) وسط	2016/12/8	2017/4/7	0.539	36%	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بشارع شديدا من مطبق شارع ممفيس حتى مطبق مجمع شارع بورسعيد والفرعات مع ربط شارع عبد المنعم سند (سينما اديون) على مطبق العداية الجديدة بمنطقة كامب شيزار - وسط	2016/7/9 تشوينات	2017/1/8	1.486	70%	متوقف لحين الحصول على تصريح المرور
	احلال وتجديد وتدعيم شبكة الصرف الصحى بشارع فرنسا بدءا من نفق المنطقة الوسطى وحتى مجمع قصر رأس التين - الجمرك	2016/12/31	2018/12/30	2.500	26%	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد وتدعيم لجزء من مجمع شارع 218 والمربوط على مطبق المنطقة الغربية اعادة ربط شوارع 8،7،6،5 بمنطقة نجع العرب على ش المنطقة الغربية (4(W-3) غرب	2015/4/20	2017/4/19	4.500	68%	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد خط الانحدار الرئيسى الخاص بمحطة رفع العوامى - العجمى	2012/9/6	2017/3/3	2.235	47%	جارى التنفيذ
	الاجمالى				13.905	

ملاحظة :

هذا بخلاف ما يتم تنفيذه لاحلال وتجديد الشبكات ضمن مشروعات (سنوية شوارع مختلفة و سنوية الهبوطات) و احلال وتجديد كفاءة محطات الشركة .

## السياحة والمصايف

تقرير تفصيلي عن الانجازات والمشروعات المنتهية في الفترة من 2016/7/1 حتى 2016/12/31

القطاع	اسم / وصف المشروع	تاريخ البدء	التكلفة بالمليون جنية	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ حتى تاريخه	جدوى المشروع ومدى الافادة للمواطنين
السياحة والمصايف	كازينو ومطعم وشاطئ الشاطبي	201/9/26	-	2016/9/15	100% تم ايجاره بمبلغ 4.250 مليون جنية سنويا بزيادة 4% كل عام لمدة 15 سنة باجمالى 85.100 مليون جنية	

### كازينو الشاطبي :



المشروعات الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات التنموية التى تنتهى فى تاريخ 2017/6/30

القطاع	اسم / وصف المشروع	تاريخ البدء	التكلفة بالمليون جنية	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ	جدوى المشروع ومدى الافادة للمواطنين
رفع كفاءة طريق الكورنيش	يشمل صيانه الكورنيش من المنتزة حتى راس التين (وحدات سور الكورنيش - بلاطات - ارصفة - بردورات - اغطية انفاق - صيانة الاعمال الكهربائية - البلازات - دهانات - الطوب الحرارى ) وصيانة 14 نفق مشاه وكوبرى استانلى وشامل تطوير بنر مسعود الوصف : شبكة رى - شبكة كهرباء - ترميم وصب عدد 34 كرسي تغير الارضيات التالفه وتركيب بلاط ارضيات جديدة	2016/7/1	5	2017/6/30	%24	الحفاظ على المظهر الجمالى لمحافظة الاسكندرية وحماية شواطئها
السياحة والمصايف	مطعم وكافتيريا بنر مسعود	2016/10/5	—	جارى	%50	—

تطوير الكورنيش :



## مياه الشرب

المشروعات التنموية التي تم تنفيذها فى نطاق محافظة الإسكندرية من 2016/7/1 الى 2016/12

العائد من المشروع	نسبة التنفيذ %	التكلفة بالمليون جنية	تاريخ النهو	تاريخ البدء	اسم / وصف المشروع	القطاع
تقليل الفاقد وزيادة الضغوط	100	0.016	2016/7	2016/7	مد وتدعيم شبكات بمواسير بلاستيك قطر 4" بطول 120 متر بنجع الحول بكنج مريوط قبلي	مياه الشرب
		11.340	2016/11	2016/7	إحلال وتجديد خط مواسير 500 مم زهر مرن المغذى من قرية 7 إلى رافع بنجر السكر 2 (دخول الرافع) ومن رافع بنجر السكر 2 حتى قرية 5 بأخر 500 مم بلاستيك	
		1.162	2016/9	2016/8	إحلال وتجديد بقرية الجلاء - مريوط الزراعية بمواسير بلاستيك قطر 4" بطول 6100 متر وقطر 6" بطول 800 متر	
		7.152	2016/12	2016/8	إحلال وتجديد خط متهالك 18 بوصة اسبستوس إلى خط 20 بوصة بلاستيك بطول 4200 متر	
		0.168	2016/8	2016/8	إحلال وتجديد بقرية سند 1 بمواسير بلاستيك قطر 6" بطول 800 متر	
		0.684	2016/8	2016/8	إحلال وتجديد شبكات قرية العلا الغربية بمواسير بلاستيك قطر 8" بطول 2000 متر	
		0.513	2016/11	2016/8	إحلال وتجديد بقرية البيضا بنزينة بخط مواسير قطر 4" بطول 3500 متر	
		0.224	2016/9	2016/9	مد وتدعيم شبكات بمواسير بلاستيك قطر 4" بطول 1500 متر بنجع القطعان أول سور المدافن	
		0.492	2016/9	2016/9	إستكمال إحلال وتجديد شبكات قرية العلا الغربية بمواسير بلاستيك قطر 4" بطول 1500 متر	
		2.361	2017/2	2016/11	إحلال وتجديد خط متهالك قطر 10" إسبستوس إلى خط قطر 12" زهر مرن بطول 800 متر بشوارع الجمهورية بالعامرية	
		0.712	2017/1	2016/12	مد وتدعيم شبكات بمواسير زهر مرن قطر 500 مم بطول 250 متر	
				24.824		

المشروعات التنموية التي تم تنفيذها فى نطاق محافظة الإسكندرية من 2016/7/1 الى 2016/12

القطاع	وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	التكلفة بالمليون جنية	نسبة التنفيذ	العائد من المشروع
مياه الشرب	أعمال عداية ماسورة قطر 700 مم بجوار كوبرى الحويحى أعلى ترعة النوبارية - منطقة النهضة	2013/12/21	2016/12/31	1.425	%100	تغذية مناطق النهضة فى محافظتى الاسكندرية والبحيرة
	إحلال وتجديد رافع مياه المفروزة بالقبارى	2014/12/16	2016/12/31	3.713	%100	انشاء خزان وعنبر طلبات لزيادة السعة التخزينية ورفع الضغوط لتغذية حى غرب ومناطق القبارى والورديان والمكس وحتى الدخيلة
	استكمال الجزء الأيمن من الخزان الأرضى وتأهيل الطرق الداخلية برفع مرغم	2016/7/16	2018/7/15	9.864		انشاء خزان لزيادة السعة التخزينية اللازمة لتشغيل الرافع وزيادة الضغوط بمناطق الخدمة فى العامرية والمنطقة الحرة والساحل الشمالى بدءا من ك 21
	تصميم وتصنيع وتوريد عدد 3 خزانات لمياه الشرب سعة 1000م <sup>3</sup> فى مدينة 6 أكتوبر	2016/9/11	2016/12/1	2.565	%100	حل مشكلة ضعف المياه بالشبكة الداخلية للمدينة والمنفذة بمعرفة جمعية 6 أكتوبر وتوفير سعة تخزينية لزيادة كمية المياه ورفع الضغوط بشبكة المدينة
	الإجمالى			17.567		

احلال وتجديد رافع مياه المفروزة بالقبارى



أعمال عداية ماسورة قطر 700مم بجوار كوبرى الحويحى أعلى ترعة النوبارية



تصميم وتصنيع وتوريد عدد 3 خزانات لمياه الشرب سعة 1000م3 فى مدينة 6 اكتوبر



المشروعات التنموية الجارى تنفيذها

القطاع	اسم / وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	التكلفة بالمليون جنية	نسبة التنفيذ %	صعوبات تعوق استكمال وتنفيذ المشروع تحتاج لتدخل وزارى من عدمه
مياه الشرب	ترحيل خط مواسير بلاستيك قطر 4" بطول 300 متر ومواسير زهر مرن قطر 4" بطول 85 متر وذلك لإنشاء الطريق البديل لموقع محطة الصرف الصحي ( 9 ن ) وذلك بناءً على طلب محافظة الاسكندرية لتنفيذ طريق أسفنتي والمودي إلى محطة صرف 9 ن بنجع القطعان حيون بجوار سور المدافن وذلك للصالح العام	2017/2/21		0.185	10%	لا يوجد
	تأهيل منشآت الشركة بمحطة مربوط (ك40)	2015/10/3	2017/10/2	14.160	70% اعمال اساسية 90% اعمال اضافية	جارى استكمال المشروع طبقا للتعاقد
	إعادة تأهيل وترميم منشآت الشركة بمحطة شرقى	2016/1/23	2017/1/22	3.706	75% من الأعمال المدنية	جارى اعتماد مدة اضافية لوجود اعمال مستجدة
	عملية استكمال الجزء الأيمن من الخزان الأرضى وتأهيل الطرق الداخلية برفع مرغم	2016/7/16	2018/7/15	9.864	16% اعمال اساسية 13% اعمال اضافية	جارى استكمال المشروع طبقا للتعاقد
	عملية إعادة تأهيل وترميم منشآت الشركة بمحطة المنشئية (1) وتجهيز فرع إدارى وهندسى بمحطة المنشئية (2) بأبيس	2016/6/22	2017/8/21	6.670	42% من اجمالى الأعمال الأساسية والاضافية	جارى استكمال المشروع طبقا للتعاقد
	عملية صيانة وترميم بعض محطات وروافع الشركة التى تقع غرب وجنوب المحافظة	2016/5/15	2017/5/14	2.780	85%	جارى استكمال المشروع طبقا للتعاقد
	احلال وتجديد أسقف خزانات رافع برج العرب الساحلى القديم	2016/12/27	2017/12/27	1.873	11.5%	جارى استكمال المشروع طبقا للتعاقد
	<b>الاجمالى</b>				<b>39.238</b>	

تأهيل منشآت الشركة بمحطة مريوط 2 (ك 40)

إعادة تأهيل وترميم منشآت الشركة بمحطة شرقي



عملية إعادة تأهيل وترميم منشآت الشركة بمحطة المنشية 1 وتجهيز فرع

إدارى وهندسى بمحطة المنشية 2 بأبيس

