

الفهرس

رقم الصفحة		
٥-٢		انجازات الخطة الاستثمارية للمحافظة
٨-٦		انجازات الخطة الاستثمارية للأحياء
		انجازات الإدارات
١١-١٠		وحدة تطوير العشوائيات
١٣-١٢		الحدائق المركزية
١٥-١٤		الحماية المدنية
١٧-١٦		المشروعات والورش
١٧		النظافة وتجميل المدينة
١٨		التخطيط والتنمية العمرانية
		المديريات
٢٤-١٩		الشئون الصحية
٢٦-٢٥		التضامن الاجتماعي
٢٨-٢٧		الإسكان
٣٠-٢٩		الشباب والرياضة
٣٢-٣١		التموين
٣٣		الزراعة
٣٩-٣٤		الطب البيطرى
		الشركات والهيئات والأجهزة
٤١-٤٠		شركة مياه الشرب
٤٣-٤٢		شركة توزيع الكهرباء
٤٦-٤٤		شركة الصرف الصحى
٤٧		شركة غاز مصر - ناتجاس
٤٨		شركة تاون جاس
٥٩-٥٢		هيئة الأبنية التعليمية

٦٠-٦١		الهيئة العامة للتأمين الصحي
٦٢-٦٤		جامعة الاسكندرية
٦٥-٦٦		جهاز تعمير الساحل الشمالى
٦٧		جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

٦١١ مليون جنية اجمالي المنصرف من الخطة الاستثمارية للمحافظة

القيمة بالمليون جنية



للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

القطاع	البيان	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
الكهرباء	اجمالي الاحياء	٤٥,٤	٣٤,٧٨٣٣٥	٢٠١٩/١٢/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
	اجمالي المشروعات المشتركة	٧,٨٥	٧,٧٤٥	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي الكهرباء		٥٣,٢٥	٤٢,٥٢٨٣٥		
الرصف	اجمالي الاحياء	١١٤	١١١,٣٢	٢٠١٩/٩/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
	اجمالي المشروعات المشتركة	٦٢,٩٠٣	٦٢,٨٢٨	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي الرصف		١٧٦,٩٠٣	١٧٤,١٤٨		
الكبارى والأنفاق	اجمالي الاحياء	٩	٩	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
	اجمالي المشروعات المشتركة	١٢٨,٩٨٦	١٢٨,٩٧٥	٢٠١٩/٢/١٣	٢٠٢٠/٢/١٣
اجمالي الكبارى والأحياء		١٣٧,٩٨٦	١٣٧,٩٧٥		
تحسين البيئة		١,٣٠٨	٢,٠٨٥٦	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
تدعيم وحدات محلية		٢٠,٢١٦	١٩,٤٤٨٨	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي احتياجات مديرية الطب البيطري		٧,٥١٧	٧,٥٠٨	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
شراء معدات نظافة للإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة (عمرات جسيمة للمعدات)		١,٣٨٩	١,٣٨٩	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي احتياجات إدارة المخلفات الخطرة		١٣,٥	٧,٧٠٨٩٢	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي تطوير محور المحمودية واعتماد المخطط الاستراتيجي لمحافظة الاسكندرية		١١٩,١٠٦	١١٩,١٠٦	٢٠١٨/٧/١	
شراء عدد ٣ سيارات هوك ليفت لحمل الصناديق والحاويات		٢	.	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي نشاط الامن والاطفاء والمرور وشرطة المرافق		١٢٥,٧٣٤	٨٢,٨١١	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي احتياجات الإدارة العامة للمشروعات والورش		٠,٧	٠,٦٠٥	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي مشروعات إدارة التخطيط والتنمية العمرانية		٢,٢٦٤٥	٢,٢٦٤٥	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي احتياجات مديرية الإسكان والمرافق (من أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها وطابعات ليزر واللات تصوير ومراوح حوائط وأجهزة بصمة)		٠,٢٣٢	٠,٢٣١	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار		١٠	١٠	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي احتياجات الديوان العام		٢,٥	٢,٣٣٢	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي اجتياحات مبني ديوان عام حي المنتزه ثاني		٠,٩٠٣	٠,٩٠٣	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠
اجمالي الخطة الاستثمارية		٦٧٥,٥٠٢٢	٦١١,٠٤٤١٧		

المشروعات المشتركة

القطاع	وصف	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ
الكهرباء	استكمال انارة الطريق الدائري	٣,٠٣٩	٣,٠٣٩	٢٠١٩/١٢/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٠٠
	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنطاق المحافظة (مشروعات مشتركة)	٤,٨١١	٤,٧٠٦	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥١
اجمالي مشروعات الكهرباء المشتركة		٧,٨٥٠	٧,٧٤٥			
الرصيف	مشروع ضوايح تنظيم وفروق احكام	٣,١٨٨	٣,١١٣	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٩٨
	تطوير وتجميل الكورنيش	٦	٦	٢٠٢٠/٣/٢٩	٢٠٢٠/٦/٢٩	%١٠٠
	رصيف طرق وأرصفة بنطاق المحافظة	٥٣,٧١٥	٥٣,٧١٥	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٠٠
اجمالي مشروعات الرصيف المشتركة		٦٢,٩٠٣	٦٢,٨٢٨			
الكبارى والأنفلق	إحلال وتجديد كوبري سيارات ومشاه خرساني علي مصرف العامية بالطابية – حي المنتزه ثان	٢,٦٥	٢,٦٤٢	٢٠١٩/٢/١٣	٢٠٢٠/٢/١٣	%١٠٠
	استكمال نفق سيارات كليوباترا . حي شرق	٢,٨	٢,٨	٢٠١٥/٦/٨	٢٠١٨/٣/١٣	%١٠٠
	كوبري مشاه عند الكيلو ٣٢ صحراوي – حي عامرية اول	١,١٠٥	١,١٠٥	٢٠١٧/١/٥	٢٠١٨/١/٥	%١٠٠
	كوبري مشاه عند مدخل قرية الجلاء	٣	٣		٩ اشهر من تاريخ استلام الموقع	%١٠٠
	انشاء كوبر سيدى كرير	٩٩,٥٨٩٥	٩٩,٥٨٩٥			
	عمرات جسيمة للكبارى والانفاق	١٩,٩٣٦	١٩,٩٣٣	٢٠١٨/٥/١٣	٢٠١٩/٤/١٧	%١٠٠
اجمالي الكبارى والأنفاق المشتركة		١٢٨,٩٨٦	١٢٨,٩٧٥			
احتياجات مديرية الطب البيطري من تطوير مجازر	استكمال إحلال وتجديد باقي عنابر مجزر ابوقير	٠,٧٣	٠,٧٣	٢٠١٩/٣/٦	٨ اشهر من تاريخ البدء	%١٠٠
	استكمال إحلال وتجديد باقي عنابر المجزر الالى	١,٠٩٢	١,٠٩٢	٢٠١٩/٤/١٨	١٠ اشهر من تاريخ البدء	%١٠٠
	استكمال إحلال وتجديد عنبر الخنزير بالمجزر الالى	٥,٦٨٦	٥,٦٨٦	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٠٠
	رصف الطرقات الداخلية للمجزر الالى	٠,٠٢٧	٠	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٠
اجمالي احتياجات مديرية الطب البيطري		٧,٥١٠,٧	٧,٥٠٨			
احتياجات إدارة المخلفات الخطرة	انشاء خلية دفن	٩	٧,٠٠٨,٩٢	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٨٥
	شراء عدد ٢ محرقة	٤,٥	٠,٧	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٦
اجمالي احتياجات إدارة المخلفات الخطرة		١٣,٥	٧,٧٠٨,٩٢			
نشاط الأمن والاطفاء والمرور وشرطة المرافق	الحماية المدنية (الامن والاطفاء)	١٠٤,٧٣٤	٦١,٨١١	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٩
	احتياجات إدارة المرور	١٦,٦	١٦,٦	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٠٠
	احتياجات شرطة المرافق	٤,٤	٤,٤	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٠٠
اجمالي الأمن والاطفاء والمرور وشرطة المرافق		١٢٥,٧٣٤	٨٢,٨١١			
مشروعات إدارة التخطيط والتنمية العمرانية	اعمال الرفع المساحي	٢,١٣٧٥	٢,١٣٧٥	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٠٠
	اعمال تطوير الادارة	٠,١٢٧	٠,١٢٧	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٠٠
اجمالي مشروعات إدارة التخطيط والتنمية العمرانية		٢,٢٦٤٥	٢,٢٦٤٥			
احتياجات الديوان العام	سيارة اسعاف مجهزة للديوان العام والإدارات التابعة	١	٠,٨٤	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٨٤
	شراء تجهيزات	١,٥	١,٤٩٢	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٩٩
اجمالي احتياجات الديوان العام		٢,٥	٢,٣٣٢			


انجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

القطاع	البيان	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية
كهرباء	أحياء	٤٥,٤	٣٤,٧٨٣٣٥
رصف	أحياء	١١٤	١١١,٣٢
كبارى وانفاق	أحياء	٩	٩
تحسين بيئة	أحياء	١,٣٠٨	٢,٠٨٥٦
تدعيم وحدات محلية	أحياء	٢٠,٢١٦	١٩,٤٤٨٨
مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنطاق المحافظة	مشروعات مشتركة	٧,٨٥	٧,٧٤٥
مشروعات الرصف	مشروعات مشتركة	٦٢,٩٠٣	٦٢,٨٢٨
الكبارى والأنفاق	مشروعات مشتركة	١٢٨,٩٨٦	١٢٨,٩٧٥
احتياجات مديرية الطب البيطري	تطوير مجازر	٧,٥١٧	٧,٥٠٨
الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة	(عمرات جسيمة للمعدات)	١,٣٨٩	١,٣٨٩
إدارة المخلفات الخطرة	انشاء خلية دفن - شراء ٢ محرقة	١٣,٥	٧,٧٠٨٩٢
محور المحمودية	تطوير محور المحمودية واعتماد المخطط الاستراتيجي لمحافظة الاسكندرية	١١٩,١٠٦	١١٩,١٠٦
شراء عدد ٣ سيارات هوك ليفت لحمل الصناديق والحاويات		٢	.
اجمالي نشاط الامن والاطفاء والمرور وشرطة المرافق		١٢٥,٧٣٤	٨٢,٨١١
اجمالي احتياجات الإدارة العامة للمشروعات والورش		٠,٧	٠,٦٠٥
اجمالي مشروعات إدارة التخطيط والتنمية العمرانية		٢,٢٦٤٥	٢,٢٦٤٥
اجمالي احتياجات مديرية الإسكان والمرافق (من أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها وطابعات ليزر واللات تصوير ومراوح حوائط وأجهزة بصمة)		٠,٢٣٢	٠,٢٣١
اجمالي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار		١٠	١٠
اجمالي احتياجات الديوان العام		٢,٥	٢,٣٣٢
اجمالي اجتياحات مبني ديوان عام حي المنتزه ثاني		٠,٩٠٣	٠,٩٠٣
اجمالي الخطة الاستثمارية		٦٧٥,٥٠٢٢	٦١١,٠٤٤١٧

للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠

١٨٥,٦٢ مليون جنيه إجمالي المنصرف من الخطة الاستثمارية

القيمة بالمليون جنيه

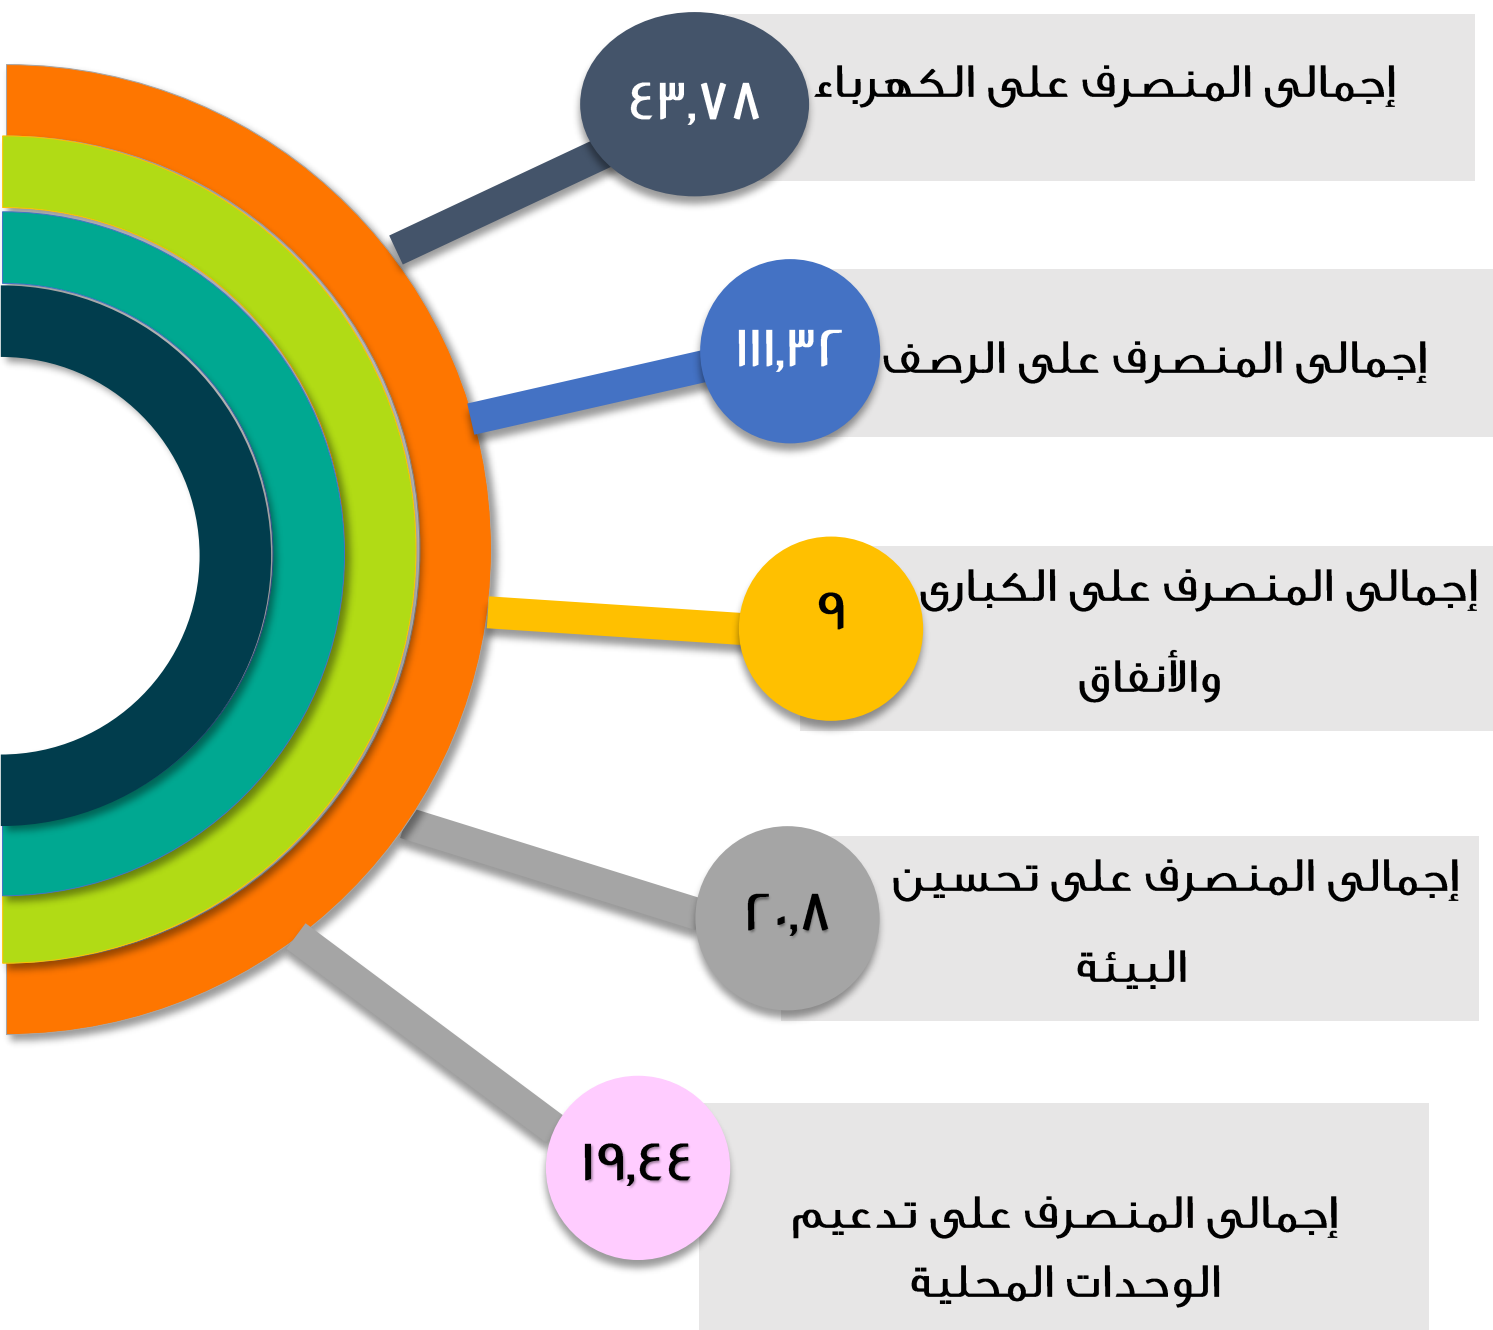

القطاع	الحي	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ
الكهرباء	المنتزه ثان	٣,٥	٢,٩٩٦	٢٠١٩/١٢/٥	٢٠٢٠/٤/٥	%٨٦
	المنتزه اول	٣,٥	٢,٩٧٢٣٥	٢٠١٩/١٢/٤	٢٠٢٠/٤/٤	%٨٥
	شرق	٥,٧	٥,٠٩٦	٢٠١٩/١٢/٨	٢٠٢٠/٤/٨	%٨١
	وسط	٥,٥	٣,٩٨٣	٢٠١٩/١٢/١	٢٠٢٠/٤/١	%٦٤
	الجمرك	٣,٥	٣,٥	٢٠١٩/١٢/٣	٢٠٢٠/٤/٣	%١٠٠
	غرب	٢,٥	٢,٤٦٨	٢٠١٩/١٢/٢	٢٠٢٠/٤/٢	%٩٩
	العجمي	٤,٥	٢,٧٧	٢٠١٩/١٢/١٢	٢٠٢٠/٤/١٢	%٦٢
	العامة اول	٣	٢,٤٦	٢٠١٩/١٢/٩	٢٠٢٠/٤/٩	%٨٢
	العامة ثان	٢,٦	٢,٤١٥	٢٠١٩/١٢/١٠	٢٠٢٠/٤/١٠	%٩٣
	مركز ومدينة برج العرب	١١,١	٦,١٢٣	٢٠١٩/١٢/١١	٢٠٢٠/٤/١١	%٥١
الاجمالي		٤٥,٤	٣٤,٧٨٣٣٥			

القطاع	الحي	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ
الرصف	المنتزه ثان	٨	٨	٢٠١٩/٩/٥	٢٠٢٠/٦/٣	%١٠٠
	المنتزه اول	٧	٧	٢٠١٩/٩/١	٢٠٢٠/٦/٣	%١٠٠
	شرق	١٨	١٨	٢٠١٩/٩/٦	٢٠٢٠/٦/٣	%١٠٠
	وسط	٩,٥	٩,٥	٢٠١٩/٩/١	٢٠٢٠/٦/٣	%١٠٠
	الجمرك	٧	٧	٢٠١٩/٩/١	٢٠٢٠/٦/٣	%١٠٠
	غرب	٨	٨	٢٠١٩/٩/١	٢٠٢٠/٦/٣	%١٠٠
	العجمي	١٢	١٢	٢٠١٩/٩/١	٢٠٢٠/٦/٣	%١٠٠
	العامة اول	٩,٥	٩,٥	٢٠١٩/٩/٤	٢٠٢٠/٦/٣	%١٠٠
	العامة ثان	١٥	١٥	٢٠١٩/٩/١٥	٢٠٢٠/٦/٣	%١٠٠
	مركز ومدينة برج العرب	٢٠	١٧,٣٢	٢٠١٩/٩/١	٢٠٢٠/٦/٣	%٨٧
الاجمالي		١١٤	١١١,٣٢			

القطاع	المشروع	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ
الكبارى والأنف اق	انشاء نفق مشاه للربط بين شارع النصر وشارع المواسير - حي شرق	٣	٣	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢١/٦/٣	%١٠٠
	عمرات جسيمة للكباري والانفاق (كوبري ناريمان) حي وسط	٤,٥	٤,٥	٢٠٢٠/٢/٢٢	٢٠٢١/١١/٢٢	%١٠٠
	انشاء كوبري مشاه امام مدخل قرية الهوارية - حي العامة ثان	١,٥	١,٥	٢٠٢٠/٣/٢٢	٢٠٢١/١٢/٢٢	%١٠٠
الاجمالي		٩	٩			

للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠

القطاع	الحي	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ
تحسين البيئة	المنتزه ثان	٢٠٠	١٧٣٣	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٨٧%
	المنتزه اول	١٧	١٦٦٢	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٩٨%
	شرق	٢٠	١٩٨٣	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٩٩%
	وسط	١٩٢	١٩٢	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	١٠٠%
	الجمرك	٧	٦٥٨	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٩٤%
	غرب	٥	١٠٥	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢١%
	العجمي	١	٩٨٦	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٩٩%
	العامرية	٢	١٦٧٥	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٨٤%
	اول العامرية ثان مركز ومدينة برج العرب	٠	٠	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	١٠٠%
الاجمالي		١,٣٠٨	٢,٠٨٥٦			

القطاع	الحي	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ
تدعيم وحدات محلية	المنتزه ثان	١,٧٩٥	١,٧٩٣	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	١٠٠%
	المنتزه اول	١	٩٦٧	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٩٧%
	شرق	٩٢	٩١	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٩٩%
	وسط	١,٥٣٩	٩٣٠,٨	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٦٠%
	الجمرك	٢٠,٩	٢٠,٩	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	١٠٠%
	غرب	٢,٤٨٢	٢,٤٨٢	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	١٠٠%
	العجمي	١,٤١	١,٤١	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	١٠٠%
	العامرية	٢,١٩٩	٢,١٩٩	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٣٠%
	اول العامرية ثان	٢,٢٨٣	٢,١٦	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٥%
	مركز ومدينة برج العرب	٧,٢٠٧	٧,٢٠٧	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	١٠٠%
الاجمالي		٢٠,٢١٦	١٩,٤٤٨٨			

انجازات الإدارات

- ١ وحدة تطوير العشوائيات
- ١ حدائق مركزية
- ١ الحماية المدنية
- ١ المشروعات والورش
- ١ النظافة وتجميل المدينة
- ١ التخطيط والتنمية العمرانية

- تم توقيع بروتوكولات تعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات في ديسمبر ٢٠١٩ لتمويل تطوير المناطق الغير مخططة **وعدها (٧) مناطق** باجمالي اعتماد **٨١٠,٩٥٨ مليون جنيه** لتحسين المرافق والخدمات وأعمال الصرف **وتنتهي الاعمال خلال ١٢ شهر من توقيع البروتوكولات**

نادي الصيد
٨٩,٨٠٤
مليون جنيه

سيدي بشر
قبلي
٧٤,٧٦٩
مليون جنيه

العصافرة
قبلي
٢٤٤,١٥
مليون جنيه

الدخيلة
الجبليّة
٨٥,٣٢٨
مليون جنيه

الحضرة
الجديدة
وتوابعها
١٤٨,٢٣١
مليون جنيه

دنا
والمحروسة
٦٠,٥٧٤
مليون جنيه

محسن
الكبري
١٠٨,٢٣٧
مليون جنيه

تطوير المناطق الغير مخططة :

الحى	المنطقة	وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
المنتزه ثان	العصافرة قبلي	مشروع تطوير وتحسين المرافق والخدمات بالمناطق العشوائية الغير مخططة بداية من تحسين المرافق وحتى نهو اعمال الرصف	٢٤٤,١٥	تم توقيع بروتوكولات تعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات في ديسمبر ٢٠١٩	٢٠٢٠/١٢
المنتزه اول	محسن الكبرى		١٠٨,٢٣٧		٢٠٢٠/١٢
	سيدي بشر قبلي		٧٤,٧٦٩		٢٠٢٠/١٢
شرق	دنا والمحروسة		٦٠,٥٧٤		٢٠٢٠/١٢
وسط	نادي الصيد		٨٩,٨٠٤	تمويل تطوير المناطق الغير مخططة	٢٠٢٠/١٢
	الحضرة الجديدة وتوابعها		١٤٨,٢٣١	و تنتهي الاعمال خلال ١٢ شهر من توقيع البروتوكولات	٢٠٢٠/١٢
العجمي	الدخيلة الجبلية		٨٥,٣٢٨		٢٠٢٠/١٢
الإجمالي			٨١٠,٩٥٨		

المناطق العشوائية التي تم نقلها الى مشروع بشاير الخير (٣)

اسم المنطقة	الحى	درجة الخطورة	عدد الاسر	الموقع البديل	التمويل المطلوب بالمليون	الإجراءات والخطط
فرن الجراية		٢	٨٠	بشاير الخير	١٧,٦	تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين محافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية وصندوق تطوير العشوائيات بشأن تنفيذ مشروع بشاير الخير "٣"
المفروزة ٢,١		٢	١٠٠	بشاير الخير	٢٢,٢	ويوصي بنقل سكان تلك المناطق بالمشروع نظرا لقرب السكن مراعاة للجانب الاجتماعي للسكان
مثلث السكة الحديد	غرب	٢	٨٢	بشاير الخير	٢٤,٦	
مأوي الصيادين		٢	١١٠	بشاير الخير	٣٣	
كوم الملح		٢	٦١٧	بشاير الخير	١٨٥,١	
الاجمالي			٩٨٩		٢٨٢,٥	

الادارة العامة للحدائق المركزية

عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

تقليم وتهذيب وتشكيل عدد
٢٥٣١ شجرة ٣٥٥٥٥ م ستائر
شجرية بالمواقع الحيوية
والاستراتيجية .

تقليم وتبليط عدد ٥٤٥٧ نخلة
بالأحياء التسعة ومركز ومدينة
برج العرب .

انتاج النباتات والاشجار بالجهود
الذاتية لتوفير احتياجات الاحياء
من تلك النباتات والاشجار في
الوقت المناسب عند طلبها .

تم صرف النباتات المنتجة بعدد ٣٨٢٩
أشجار وشجيرات ونباتات مزهرة وظل
والاشراف علي زراعة الكثير منها الي
إدارات الحدائق بالأحياء التسعة ومركز
ومدينة برج العرب والقطاعات التابعة
للحدائق المركزية والمباني الحكومية
والجهات الامنية .

تطوير مدخل الاسكندرية
الصحراوي والميادين العامة
بالجهود الذاتية ودون أي تكاليف
علي موازنة المحافظة :
صينية محرم بك - ستارة الشرطة
- امام مستشفى الشرطة
بمساحة حوالي (٦٦ ألف مترا
مربعاً) - منطقة الكمين بالجزيرة
الوسطى أمام كارفور والداون
تاون بالاستعانة بمؤسسات
المجتمع المدني (شركة مجاهد
ومؤسسة الأهرام).
- ميدان وحديقة زويل بنطاق حي
وسط

- اكنار وتربية نباتات الصوب
والعشبات الحولية والمعمرة.
- التجهيز لمعارض الزهور
السنوية بالربيع والخريف

اصلاح واحلال التالف من
شبكات الري بالحدائق أسفل
كوبري محرم بك امام ستارة
الشرطة والحضانة وأيضا
بقطاع محطة مصر وشراء

شراء جرار زراعي لقص النجيل
وذلك لانجاز أعمال قص
المسطحات الخضراء بالقطاع
الصحراوي والتي تصل الي ٦٦
الف مترا مربعا.

مبادرة معالي السيد رئيس
الجمهورية لتطوير العشوائيات
تم رفع كفاءة الطرق المؤدية
لمشروع بشاير الخير بنطاق حي
غرب وتقليم وتهذيب الأشجار
بالشوارع والحدائق وقص
المسطحات الخضراء وزراعة أشجار
الفيكس بالشوارع

مبادرة السيد الرئيس بزراعة
الاشجار المثمرة (برتقال - رمان -
ليمون ..الخ) تم زراعة حوالي ٨٠٠٠
شجرة مثمرة بالمدارس ومراكز
الشباب .

عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

أولاً: تقديم وتبليط عدد ٥٤٥٧ نخلة بالأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب .

ثانياً: تقديم وتهذيب وتشكيل عدد ٢٥٣١ شجرة + ٣٥٥٥ م ستائر شجرية بالمواقع الحيوية والاستراتيجية طبقاً لتكليفات السلطة المختصة وطلبات تقديم الأشجار الواردة من الأحياء التسعة والتي يتعذر عليهم القيام بها.

ثالثاً: قام مشتملى الإدارة العامة للحدائق المركزية (الرئيسي والفرعي) بالأعمال التالية :

– انتاج النباتات والأشجار بالجهود الذاتية وعدم تحميل المحافظة أى اعباء مالية لانتاجها وذلك لتوفير احتياجات الأحياء من تلك النباتات والأشجار في الوقت المناسب عند طلبها.
– اكثار وتربية نباتات الصوب والعشبيات الحولية والمعمرة.
– التجهيز لمعارض الزهور السنوية بالربيع والخريف بالجهود الذاتية.
– تم صرف النباتات المنتجة بعدد ٣٨٢٩ أشجار وشجيرات ونباتات مزهرة وظل تشمل : (الأكاليفيا والشفليرا والبيوتس والكروتون والسرور الليمون ونخيل سيكاس وورد البليانطا وأشجار الفيكس الدفلة و.....الخ) والإشراف على زراعة الكثير منها التي إدارات الحدائق بالأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب والقطاعات التابعة للحدائق المركزية والمباني الحكومية والجهات الأمنية .
رابعاً: تطوير مدخل الاسكندرية الصحراوي والميادين العامة بنطاق محافظة الاسكندرية :

– استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة مدخل الاسكندرية الصحراوي (صينية محرم بك – ستارة الشرطة – امام مستشفى الشرطة) بمساحة حوالي (٦٦ ألف متراً مربعاً) بالجهود الذاتية ودون أي تكاليف علي موازنة محافظة الاسكندرية.

– الاشتراك والإشراف علي أعمال تطوير ميدان وحديقة زويل بنطاق حي وسط ودعمه بالزراعات وتقديم النخيل بفرقة النخيل التابعة للحدائق المركزية.

– الاشتراك والإشراف علي أعمال تطوير مدخل الاسكندرية الصحراوي بمنطقة الكمين بالجزيرة الوسطي أمام كارفور والداون تاون بالاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني (شركة مجاهد ومؤسسة الأهرام).

– اصلاح واحلال التالف من شبكات الري بالحدائق أسفل كوبري محرم بك امام ستارة الشرطة والحضانة وأيضاً بقطاع محطة مصر وشراء ادوات السباكة.

– شراء جرار زراعي لقص النجيل وذلك لانجاز أعمال قص المسطحات الخضراء بالقطاع الصحراوي والتي تصل الي ٦٦ الف متراً مربعاً.


خامساً: الاشتراك في المبادرات والاحتفاليات :

– مبادرة السيد الرئيس بزراعة الأشجار المثمرة (برتقال – رمان – ليمون –الخ) بمحافظه الإسكندرية وذلك بتوفير الرعاية اللازمة لهذه الأشجار داخل مشتمل الإدارة و الموردة من جهات مختلفة وصرفها والمشاركة في زراعتها بالمدارس ومراكز الشباب وتم زراعة حوالي ٨٠٠٠ شجرة مثمرة.

– مبادرة معالي السيد رئيس الجمهورية لتطوير العشوائيات تم الاشتراك والإشراف علي أعمال رفع كفاءة الطرق المؤدية لمشروع بشاير الخير بنطاق حي غرب وتم تقديم وتهذيب الأشجار بالشوارع والحدائق وقص المسطحات الخضراء وايضاً زراعة أشجار الفيكس بالشوارع.



إجمالي المنصرف على شراء أجهزة ومعدات وسيارات الإطفاء والانقاذ وصيانة نقاط
الإطفاء وعمرات جسيمة للسيارات وماكينات الإطفاء

٦٤,٢٧٩ مليون
جنية

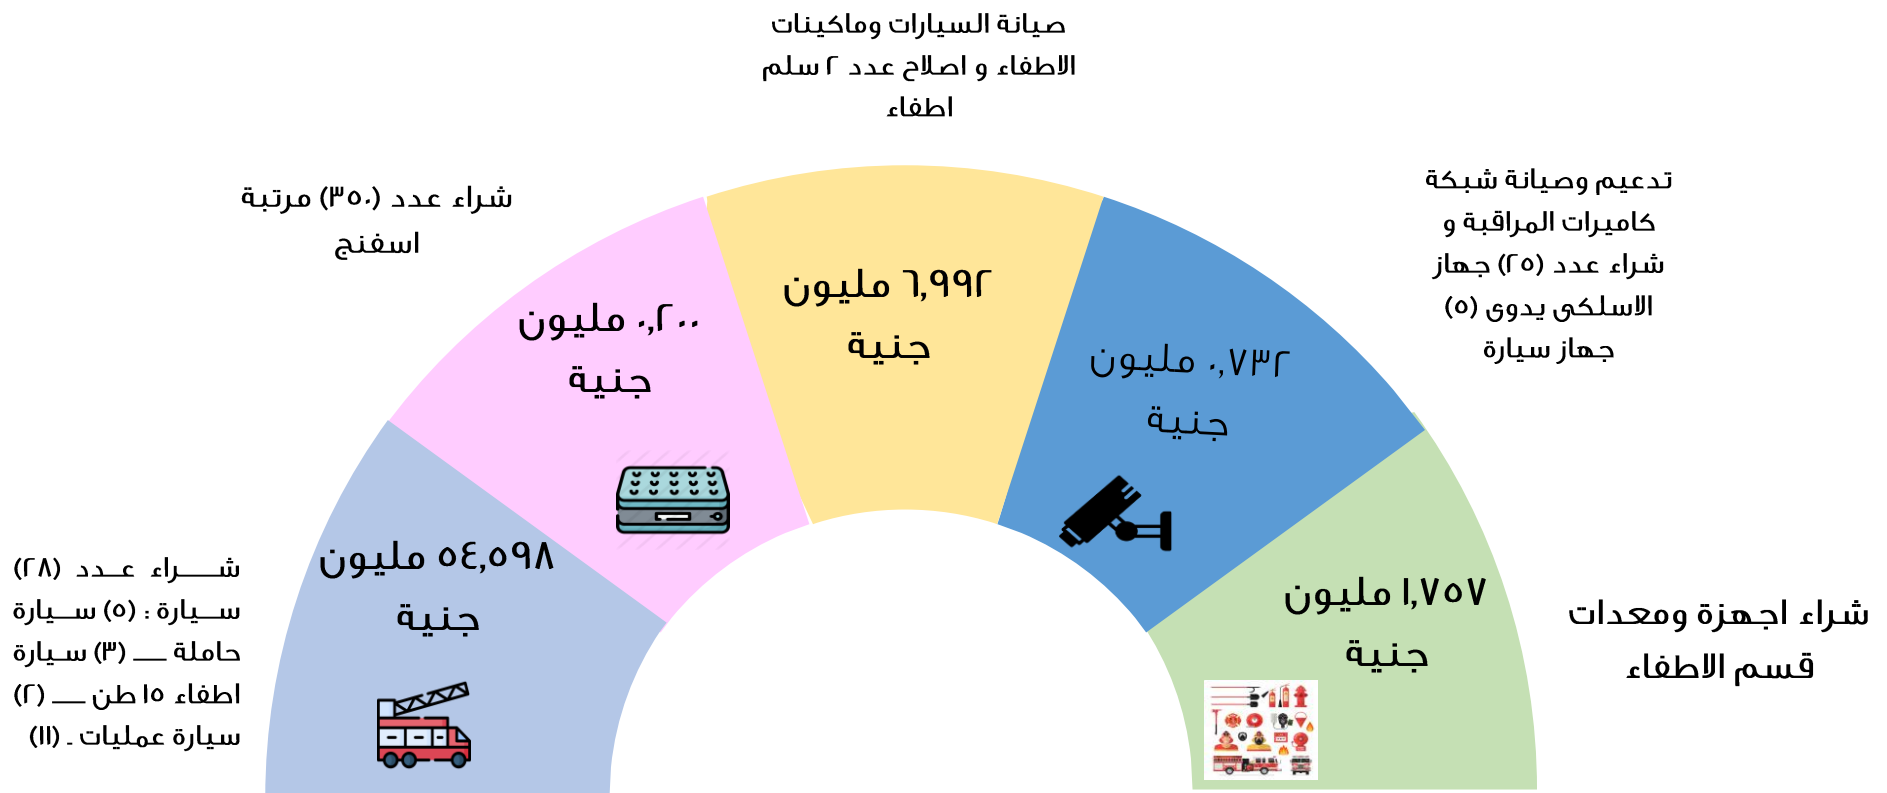

وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ	عدد المستفيدين
١- تدعيم اقسام الادارة باللات والمعدات	٣	١,٧٥٧	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٨,٥٥	
شراء اجهزة ومعدات قسم الاطفاء						
٢- تدعيم شبكة الحريق بمدينة الاسكندرية	٨٠٠,٠	٤٥٦,٠	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٩١,٤٦	
تدعيم وصيانة شبكة كاميرات المراقبة						
شراء عدد (٢٥) جهاز الاسلكى يدوى (٥) جهاز سيارة						
٣- عميرات جسيمة للسيارات وماكينات الاطفاء	٥٠٠,٠	٥٠٠,٠	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٠٠	
صيانة السيارات وماكينات الاطفاء						
اصلاح عدد ٢ سلم اطفاء وجارى تنفيذ عملية الاصلاح	٦,٤٩٢	٦,٤٩٢	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
٤- شراء اثاث وتجهيزات	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٠٠	
شراء عدد (٣٥٠) مرتبة اسفنج						
٥- شراء سيارات اطفاء	١٦,٧٨٨	١٦,٧٨٨	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
شراء عدد (٥) سيارة حاملة خزن مياة سعة ٨ طن						
شراء عدد ٢ سيارة اطفاء ١٥	١٠	١٠	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%١٠٠	نطاق
شراء عدد (٥) سيارة اطفاء متوسطة	١٨,٥٠٠	٩,٢٥٠	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	محافظة
٦- شراء سيارة اطفاء وانقاذ						الاسكندرية
عدد (٧) سيارة اطفاء :عدد ٦ متوسطة ، عدد ١ ١٥ طن	٥٤,٨٩٩	١٣,٧٢٥	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
عدد (٢) سيارة انقاذ برى : عدد ١ ثقيلة بونش ، عدد ١ متوسطة بونش						
٧- شراء عدد (٥) سيارة سقف عالى	٣,٩٣٥	٣,٩٣٥	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
عدد (٣) انقاذ نهري وعدد (٢) مفرقات	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
٨- شراء عدد ٢ سيارة عمليات	١,٣٨	.	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
٩- تجهيز غرفة العمليات	١٨٨,٠	.	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
١٠- صيانة نقطة الكيماويات	٣٩٧,٠	.	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
١١- شراء اثاث						
١٢- صيانة نقاط الاطفاء						
نقطة اطفاء القبارى	تحت اشراف	.	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
نقطة اطفاء الخشب	مديرية الاسكان	.	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
نقطة اطفاء ابوقير		.	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	%٥٠	
الاجمالى	١١٧,٦٣٧	٦٤,٢٧٩				


٤٢,٥٤ مليون جنيه اجمالي المنصرف على الانارة العامة تم توريد وتركيب

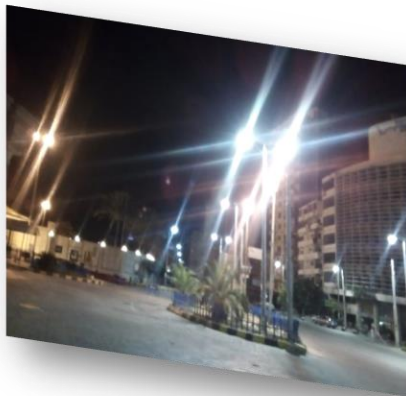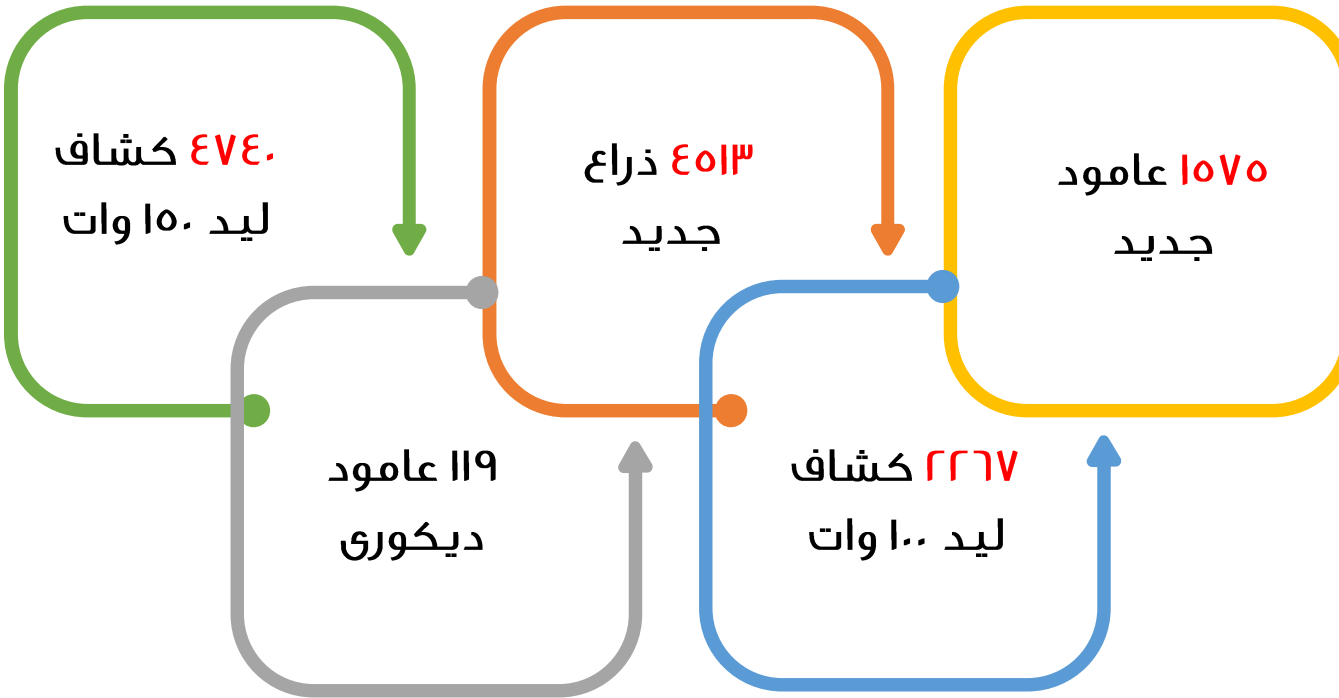

الجهة	وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبه التنفيذ %	عدد المستفيدي ن
محافظة الاسكندرية	الخطة الاستثمارية ٢٠١٩/٢٠٢٠ اعلي مستوي جميع الاحياء بمحافظة الاسكندرية	٤٢,٥٤	٤٢,٥٤	٢٠١٩	شهر ديسمبر ٢٠١٩ طبقا لكل حي بتسليم المواقع	٢٠٢٠	عدد السكان بالمناطق المنفذ بها الاعمال طبقا لكل حي
	تم توريد وتركيب عدد (١٥٧٥) عامود جديد						
	توريد وتركيب عدد (٤٥١٣) اذرع جديدة						
	توريد وتركيب كشاف ليد عدد (٤٧٤٠) ١٥٠ اوات						
	توريد وتركيب كشاف ليد عدد (٢٢٦٧) ١٠٠ اوات						
	توريد وتركيب عدد (١١٩) عامود ديكوري	-	-	٢٠١٩	٢٠٢٠	١٠٠٪	توفير استهلاك الطاقة بنسبة ٤٨ %
	تغيير كشافات الصوديوم بكشافات ليد طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة المالية والهيئة العربية للتصنيع لتوفير استهلاك الطاقة						
	تنفيذ المرحلة الثالثة باحمالى						
	عدد (٩٠٠٠) كشاف ليد ١٠٠ وات عدد (١٣٣٠١) كشاف ليد ١٥٠ وات عدد (٦٣٦) عداد تايمر ثلاثى						



تم التعاقد على شراء :
- عدد (٥) سيارات ٢٠ طن



تم توريد
عدد (١) لودر صغير
زاحف

تم :

١- اعادة عمل بعض اللجان المتوقفة بعد جائحة الكورونا
مثل لجان التثمين والحيز العمرانى لجنة الكنائس .

جارى :

١- دراسة مشروع اسكان اجتماعى وذلك بالتنسيق مع
الهيئة العامة للاوقاف والهيئة العامة للمساحة .
٢- مراجعة الدراسة لمشروع شرق المدينة التnmوى
والمعد بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى .
٣-

مراجعة الدراسة للمشروع التnmوى للمنطقة حول
بحيرة المطار المعد بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط
العمرانى تمهيدا لاعتماده من السيد الوزير المحافظ

انجازات المديرية

إ الشئون الصحية

إ التضامن الاجتماعي

إ الاسكان

إ الشباب والرياضة

إ التموين

إ الزراعة

إ الطب البيطرى

المبادرات الرئيسية

اجمالى عدد المستفيدين من مبادرة السيد رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة	١٨٣٥٩
اجمالى المترددات ١١٣٥٤ اجمالى حالات الفحص الأكلينيكي ١٢٢٢٧٠ اجمالى المستفيدين من فحص الأمراض غير السارية من خلال مبادرة صحة المرأة حتى يوم ٢٦ يولية ٢٠٢٠	١٩٧٥٧
اجمالى المنتفعات من مبادرة حقك تنظمي (تنظيم الاسرة) من يناير – يونيه ٢٠٢٠	٣.٤٢٧٩
اجمالى حالات المسح السمعي فى مبادرة المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة	٦٩٩٣
إجمالي السيدات الحوامل المستفيدات من مبادرة صحة الأم و الجنين	٢٩٣٥
اجمالى عدد الحالات التى تم علاجها من خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠	٦٤٢٠
تكلفة احلال وتجديد مستشفى العجمى المركزى لتقديم الخدمة العلاجية لجميع أهالى الأسكندرية و المحافظات المجاورة لها .	٣٥٢ مليون جنيه
اجمالى أعداد الحالات المترددة علي مراكز المعامل المركزية والاقليمية لحالات فيروس كورونا المستجد (معمل PCR مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والحميات)	١٢٨٩٢
اجمالى حقائب العلاج والمستلزمات لحالات (المخالطين بالمنازل) كورونا المستجد .	١٢٥٢٩
اجمالى عدد الندوات والجلسات التثقيفية باجمالى عدد ١٧٧١٥٩٤ مستفيد فى مجال التوعية للوقاية من الأمراض المعدية والصحة الانجابية وصحة الطفل والحياة الصحية والوقاية من فيروس كورونا	١٢٤١٦١
اجمالى القوافل العلاجية ١٠٢٤٢٦ اجمالى عدد المرضى المترددين	٨٩
عدد الحضانات للاطفال المبتسرين ٥١٦٣٢ عدد أيام العلاج	١٦٤
عدد ماكينات الغسيل الكلوى ١٢٢٩٢٨ إجمالي عدد الجلسات	٢١٩
عدد غرف العمليات المفعلة ٨٢٥٤١ اجمالى العمليات داخلى وخارجى	٥٧

أولا : المبادرات الرئاسية

١. مبادرة السيد رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة
(الفترة من ٢٢/٦/٢٠٢٠ حتي ٢٦/٧/٢٠٢٠)

الاجمالي العام	عيادات متنقلة					مراكز				عيادات الباطن ة
	اجمالي المتريدي ن	تامين صحي	نفقة الدولة			تامين صحي	نفقة الدولة			
			تجديد القرار وصرف العلاج	صرف العلاج لقرار سارى	اصدار قرار جديد وصرف العلاج		تجديد القرار وصرف العلاج	صرف العلاج لقرار سارى	اصدار قرار جديد وصرف العلاج	
١٨٣٥٩	٦٢٠	.	٨	٨٣	١٧٠	١٥٠٨	٢٠٤٠	٣٦٣١	٧٢٩	٩٥٧٠

٢. مبادرة صحة المرأة حتي يوم ٢٦ يوليو ٢٠٢٠

الامراض غير السارية							عدد حالات الفحص الالكلينيكي	عدد المترددات
كتلة اكبر من ٤٠	كتلة جسم اكبر من ٣٠	كتلة جسم اكبر من ٢٥	وزن من ١٨ – ٢٥ كيلو	وزن أقل من ١٨ كيلو	ضغط اكثر من ٩٠/١٤٠	سكر اكثر من ٢٠٠		
١٣١٧	٤١٨٧	٣٧٣٦	١٧٣٢	٢١١	٥٨١	٤٦٣	١١٣٥٤	١٩٧٥٧

٣. مبادرة حقك تنظيمي (تنظيم الاسرة)

انجاز تنظيم الاسرة من المنتفعات من يناير – يونيه ٢٠٢٠

البيان	من يناير – يونيه ٢٠٢٠
المنتفعات	٣٠٤٢٧٩
جديدة	٤٥٠٤٨
متردة	٢٤٢٩٨٩
الحاصلات على وسيلة	٢٨٨٠٣٧

٤. مبادرة المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة

➤ ارتفاع نسبة التغطية بمبادرة السمعيات خلال شهر يونيو إلي ٧٢,٦% حيث أن:

- إجمالي المواليد خلال شهر يونيو ٢٠٢٠ = ٩٦٠٣
- إجمالي حالات المسح السمعي خلال شهر يونيو ٢٠٢٠ = ٦٩٩٣

٥. مبادرة صحة الأم و الجنين

➤ تم اكتشاف عدد ١٤ حالة كبدي ب و عدد ٥ HIV و عدد ٧ زهري و يتم إلتوجيه إلي المنشآت الطبية المعنية و الموعد بالتاريخ طبقا لما يتم إظهاره عند الإدخال.

➤ نسبة التغطية بمبادرة صحة الأم و الجنين خلال شهر يونيو ٢٠٢٠ %٦٦ حيث أن:

- إجمالي السيدات الحوامل اللاتي تم عمل المبادرة لهنم خلال شهر يونيو ٢٠٢٠ = ٢٩٣٥
- إجمالي السيدات الحوامل المترددات علي الوحدات خلال شهر يونيو ٢٠٢٠ = ٤٤٦٨

٦. علاج حالات قوائم الانتظار بمحافظة الإسكندرية خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٠

تصنيف الاجراء	إجمالي عدد الحالات	الحالات التي تمت	وفاه قبل الاجراء	وفاه بعد الاجراء	رفض العلاج	علاج عن طريق الأهلية	الحالات الجديدة	الحالات الجارية	تأجيل بناء على الحالة الصحية	الغاء الاجراء واستبداله بعلاج دوائي	عدم التمكن من التواصل مع المريض
الإجمالي	٨٨٥٤	٦٤٢٠	٢٥	٤	٢٨	٢٧	١١٧٤	٧٦٧	٥٣	١٢٤	٢٣٢

ثانيا : استعدادات القسم الوقائي في ضوء ظهور فيروس كورونا المستجدة (COVID-١٩)

- تم عقد ٦ اجتماعات لرفع درجة الاستعداد والجاهزية والتأكيد على سلامة التجهيزات على مستوى محافظة الإسكندرية .
- تم عقد عدد ٧ تدريب لفرق الترصد و الأطباء والنواب وهيئة التمريض بمستشفيات الحميات و صدر المعمورة .
- بيان بحالات الاصابه و العزل المنزلي و الوفاه و المخالطين حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

عدد حالات الاصابة بـ COVID١٩		عدد حالات العزل المنزلي		عدد حالات الشفاء		عدد حالات الوفاة		عدد حالات الاصابة بالفريق الصحي		عدد حالات الوفاة من الفريق الصحي		عدد المخالطين		عدد الإيجابي من المخالطين		عدد المخالطين الذين انتهت فترة متابعتهم	
اليوم	حتى اليوم	اليوم	حتى اليوم	اليوم	حتى اليوم	اليوم	حتى اليوم	اليوم	حتى اليوم	اليوم	حتى اليوم	اليوم	حتى اليوم	اليوم	حتى اليوم	اليوم	حتى اليوم
١٣٩	٤٤١٤	١١٣	٩٢٩	١٩	٧٤٥	١	٢١٣	٥	٣٣٦	١	٦	٧٣١	٢٨٩٢٦	١٨	٥٢٨	٥٦٥	١٨٢٨٨

بيان بأعداد الحالات المترددة علي مراكز المعامل المركزية والاقليمية لحالات فيروس كورونا المستحد
معمل PCR مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والحميات بالاسكندرية

اجمالي عدد الحالات من البداية الى الان	١٢٨٩٢
عدد الحالات الايجابية تراكمي	٨٢٦٦
عدد الحالات السلبي تراكمي	٤٦٢٦

بيان صرف حقيقه العلاج والمستلزمات لحالات (المخالطين بالمنازل) كورونا المستجد
٥ احتي يوليو ٢٠٢٠

الاجمالي	اجمالي المخالطين تراكمي			منصرف الحقائق اليوم		اجمالي منصرف حقائق	نسبة تسليم الحقائق
	كبار	أطفال	اجمالي تراكمي	كبار	أطفال		
	١١٩٦٠	٣٩٠٥	١٥٨٦٥	١٥٧	٣١	١٢٥٢٩	٧٩٪
				١٨٨			

وحدة التخلص الامن من النفايات الخطرة

الاعمال التي تم انجازها بداية من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢٠

- تم تشغيل جهاز الفرغ والتعقيم بالعجمي بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٠ وتم الحصول علي الموافقة البيئية بصفة استثنائية نظرا لظروف انتشار مرض كورونا
- تم عمل اجتماع طارئ للظروف الطارئة مع كل من جهاز شئون البيئة وادارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الشؤون الصحية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية للتنسيق والمتابعة بين اجهزة المحافظة المعنية بمنظومة النفايات في ظل انتشار مرض كورونا
- تم المرور على المدينة الشبائية بابي قير و المدينة الجامعية بسموحة ومستشفى طلبة الجامعة و يتم التواصل وتلافي السلبيات و تدريب العاملين علي جمع ونقل وطرق التخزين الصحيحة والمخاطر و الالتزام بادوات الوقاية الشخصية للنفايات الطبية الخطرة
- يتم التنسيق مع منسقي النفايات يوميا باماكن العزل و المتابعة في نقل ومعالجة النفايات المنتجة
- يتم اخطار وزارة الصحة ببلاغ يومي بكميات النفايات الطبية الخطرة المنتجة واماكن العزل واماكن الفرز
- تم عمل اجتماع مع منسقي المستشفيات التابعة للمديرية وعمل جروب للتواصل اليومي بالكميات المنتجة من المستشفيات
- يتم نقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة المتولدة من اماكن العزل يوميا

احمالى ماتم معالجتة كمية (٣٣٠٨٥١,٥ كجم) خلال الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢٠

- تم معالجة كمية (١٩١٣٧ كجم) بجهاز الفرغ والتعقيم بمستشفى الحميات
- تم معالجة كمية (٦٩٦٤,٥ كجم) بجهاز الفرغ والتعقيم بمستشفى العجمي
- تم معالجة كمية (٨٤٤١١ كجم) بمحرقة صدر كوم الشقافة
- تم معالجة كمية (١٧٨٦٨ كجم) بمحرقة الجذام
- تم تنفيذ خطة الطوارئ بمعالجة كمية (٤٨٢٣٠ كجم) مع الشركات الخاصة التى لها تراخيص فى هذا المجال وسابقة اعمال كشركة نهضة مصر

الاجهزة الطبية :

- تم رفع كفاءة مستشفى الحميات بعدد ٦ اجهزة تنفس صناعي تبرع من المجتمع المدني
- تم رفع كفاءة مستشفى صدر كوم الشقافة من المجتمع المدني (تطويرالمعمل المركزى ,والعنبر الاقتصادي الذي يسع ٥ رجال وبداخله غرفتى عزل و قسم تحضير المطهرات)
- معمل العجمي لا يوجد به بكتريولوجي ولكن تم وضع حلول سريعه حيث تم اخذ ميديا جاهزة التحضير من مستشفيات المديرية الاخرى و تم شراء loopsمعهقه للعمل بها بدلا من benzene
- تم التغلب علي مشكله نقص المستلزمات بمعمل العجمي حيث تم شراء و توريد (troponin – D-dimer- urea – cuvet وقياس التجلط) وذلك بالامر المباشر و التبرع يوم ٢٦ مارس ٢٠٢٠

تم تخصيص عدد ١١ سيارة مكافحة عدوى لنقل حالات كورونا موزعه على :-

جون ١ - جون ٢ - سموحه١ - سموحه ٢ - محرم بك ١ - محرم بك ٢ - مرغم ١ - مرغم ٢ - مرغم ٣ - مرغم ٤ - المطار

ادارة الثقافة الصحية

تم عقد عدد ١٢٤١٦١ ندوة وجلسة تثقيفية فى مجال التوعية للوقاية من الأمراض المعدية والصحة الانجابية وصحة الطفل والحياة الصحية والوقاية من فيروس كورونا باجمالى عدد مستفيدين ١٧٧١٥٩٤ مستفيد .

ثالثا : المشروعات

المستشفى	وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ %	عدد المستفيدين
العمى	احلال وتجديد مستشفى العمى المركزى	٣٥٢,٢٧٩	عن طريق الوزارة	تم البدء فى البناء والأساسات بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٤	تم الإستلام الإبتائى للمشروع بتاريخ ٢٠١٩/٨/١	١٠٠%	تقديم الخدمة العلاجية لجميع أهالى الاسكندرية و المحافظات المجاورة لها

رابعا : القوافل

١. القوافل العلاجية بمحافظة الاسكندرية خلال سنة ٢٠١٩

عدد القوافل خلال السنة	عدد المرضى المتكررين	عدد التحاليل الطبية	التثقيف الصحي	الاشعه التلفزيونية	عدد المرضى المحولين للمستشفى	عدد حالات نفقة الدولة
٨٩	١,٢٤٢٦	٢٥٤١٥	٤٥٣٣٨	٢٣٠٧	٣٠٠٦	٣٠٨


٢- قوافل تنظيم الاسرة والعيادات المتنقلة والحملا

البيان	العدد
عدد القوافل	٣٢
عدد قوافل الوزارة	٩٦
قوافل الجمعيات الاهلية	٤٨
حملة تنظيم الاسرة	٢
الزيارات الاشرافية لمسئول العيادات المتنقلة	٩٦

خامسا : نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية :

البيان	مجانى	إقتصادى	الإجمالى
الاجمالى	٩١٤	٣٨٧	١٣٠١
العناية المركزة			
عدد أسرة العناية	عدد مرضى الخروج		عدد أيام العلاج
	خروج أحياء	خروج وفاة	
١٨٤	٦٢٧٤	١٢١٤	٤٩٩٨٣

أجهزة الأشعة والمناظير وأجهزة القلب



جهاز رسم قلب		جهاز أيكو		جهاز دوبلر		C.arm		رنين مغناطيسى		جهاز ماموجرام		الأشعة العادية		موجات فوق صوتية		المناظير		أشعة مقطعية	
عدد الأجهزة	عدد الحالات	عدد الأجهزة	عدد الحالات	عدد الأجهزة	عدد الحالات	عدد الأجهزة	عدد الحالات	عدد الأجهزة	عدد الحالات	عدد الأجهزة	عدد الحالات	عدد الأجهزة	عدد الحالات	عدد الأجهزة	عدد الحالات	عدد الأجهزة	عدد الحالات	عدد الأجهزة	عدد الحالات
١١١	٦٢٧٥	١٠	٤٥٨٩	١١	٧٣٤١	٧	٨٦٧	١	١٥٥٦	٣	٥٦٩	٣٢	١٣٨٦٠	٣٥	٩٢٠٨٠	١٨	١٣٠٦	٤	١١٣٧٠

نشاط وحدة المبتسرين


الغسيل الكلوى

البيان	نشاط وحدة المبتسرين		
	عدد الحضانات	عدد مرضى الخروج	
		خروج أحياء	خروج وفاة
الاجمالى	١٦٤	٥٥٦١	٤٤١

وحدة الغسيل الكلوى			
البيان	الإجمالى		إجمالى عدد الجلسات
	عدد الماكينات	عدد المرضى	
الإجمالى	٢١٩	٧٨٨	١٢٢٩٢٨

غرف العمليات

البيان	عدد غرف العمليات المفعله	عمليات الطوارئ والإستقبال	عمليات صغرى بالعيادات الخارجية	جملة العمليات (داخلى وخارجى)
الإجمالى	٥٧	٢٠٦٦٧	٣٤١١٥	٨٢٥٤١

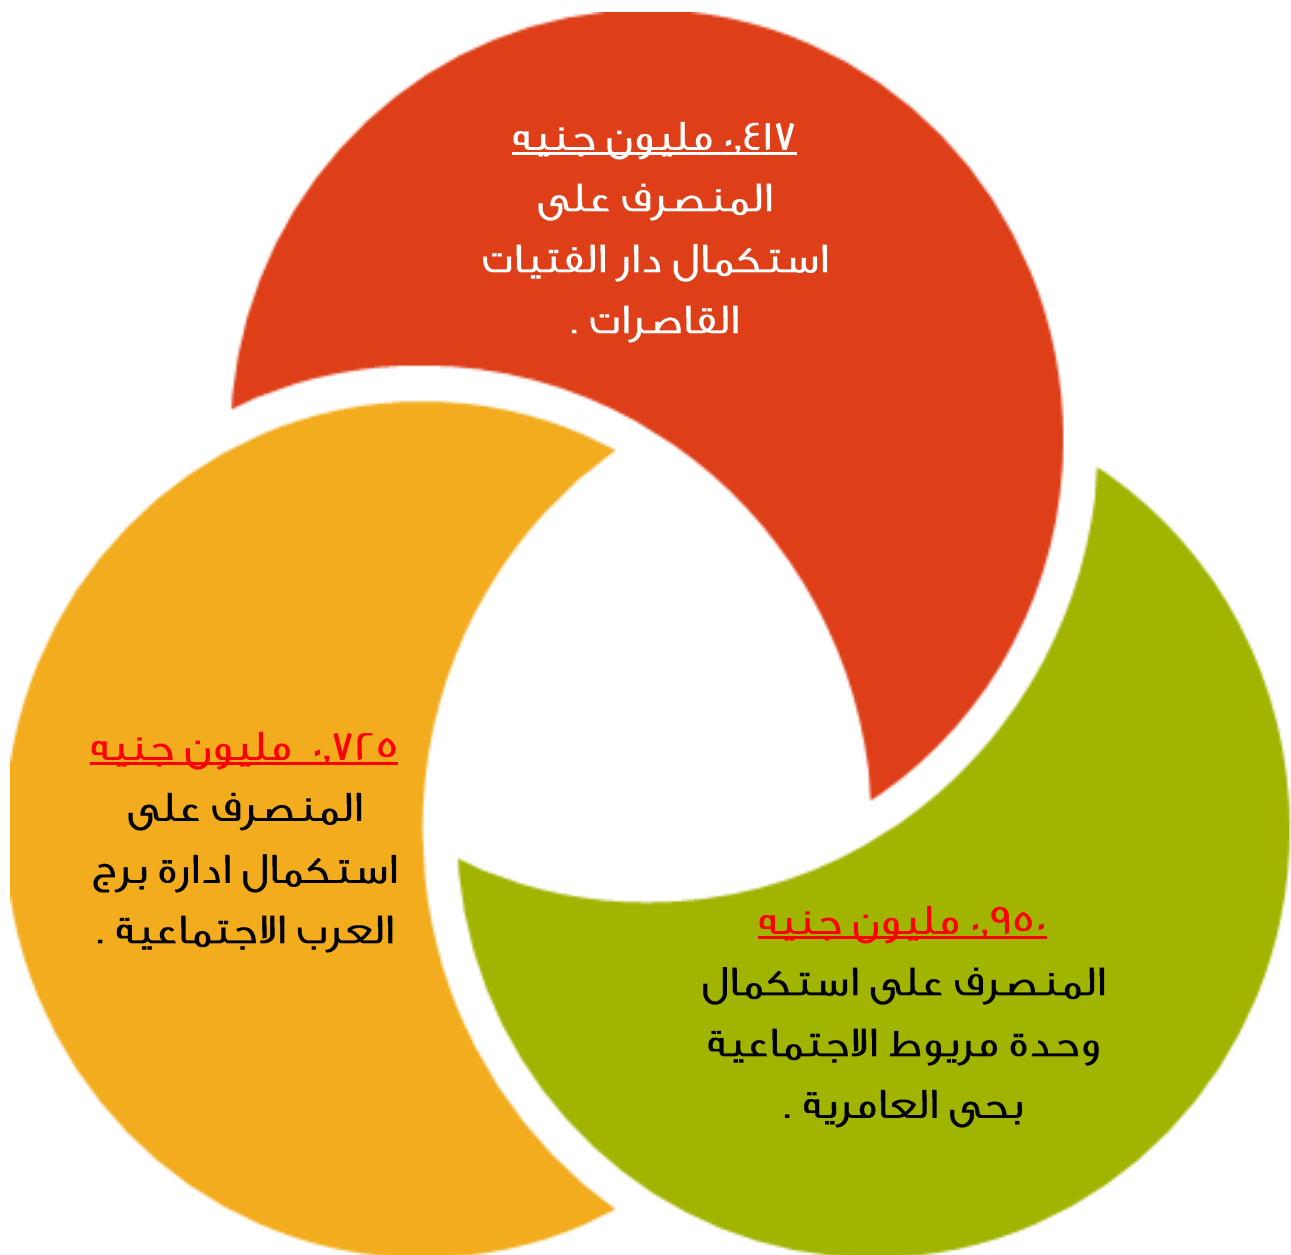

القطاع	وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ %	عدد المستفيدين
التضامن الاجتماعي	مشروع استكمال مجمعات الدفاع الاجتماعي (دار الفتيات القاصرات)	٧٠٠,٠	٤١٧,٠	٢٠١٩/٧/١	لم يحدد بعد	٦٥ %	الفتيات القاصرات بالاسكندرية
	مشروع استكمال خدمات اجتماعية (ادارة العامة + وحدة مريوط (	٢٢٥,٠	٩٥٠,٠	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٩٠ %	
	مشروع استكمال خدمات اجتماعية (ادارة برج العرب)	١	٧٢٥,٠	لم يحدد بعد	لم يحدد بعد	٥ %	
الاجمالي		١,٩٢٥	٢,٠٩٢				

٢١,٢٣٣ مليون جنية اجمالي المنصرف على عدد
(١٠) مشروعات تشرف عليها المديرية

الترميم

١٢,٣٤٥ مليون جنية عنبر الشمبرى و الضانى بمجزر
أبوقير

١,٨٥٥ مليون جنية مبنى الديوان العام حى شرق

٨١٩, مليون جنية مبنى محطة تزويد الوقود بالحضره
القبلية

٨٠٦, مليون جنية مبنى إدارة الجراج بالحضره القبلية

١,٧١٢ مليون جنية المبنى الادارى بالمجزر الآلى بالعامرية

الصيانة

١٩٧, مليون جنية

مبنى مديرية الاسكان
والمرافق

٣١٣, مليون جنية

سور بشرطة المرافق

الانشاء :

١,٨٣١ مليون جنية

شبكة مقاومة الحريق
بمستشفى المعمورة
للطب النفسى

١,٣٥٥ مليون جنية

سور حول الأرض
المخصصة لشرطة
المرافق بمنطقة
المنشية الجديدة

تطوير المناطق الغير مخططة

٢٥١,٥٨٥ مليون جنية إجمالي المنصرف على
تطوير المرافق العامة للمناطق الغير مخططة

١١٤,٦٤٢ مليون
جنيه

إحلال شبكة المياه والصرف
الصحي بمنطقة نادى
الصيد وإحلال شبكة الصرف
الصحي بمنطقة الحضرة
الجديدة حى وسط

١٣٦,٩٤٣
مليون جنية

إحلال شبكة المياه
والصرف الصحي بمنطقة
العصافرة قبلى حى
المنتزة ثان

المشروعات التى تم إنجازها

الحى	اسم المشروع	الاعتماد بالمليون ن	المنصر ف بالمليون	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ
المنتزة ثان	شبكة مقاومة الحريق بمستشفى المعمورة للطب النفسى	٥,٧٢٢	١,٨٣١	٢٠١٧/٢٢ ٩	٢٠٢٠/٣/٢١	١٠٠%
	ترميم عنبر الشمبرى و الضانى بمجزر أبو قير	٠,٩٤٤	١٢,٣٤٥	٢٠١٩/٣/٦	٢٠٢٠/١/٥	
شرق	صيانة مبنى مديرية الاسكان والمرافق	٠,١٧٦	٠,١٩٧	٢٠١٩/٦/١٣	٢٠١٩/٨/١٢	
	انشاء وحدة امتداد أبيس البيطرية	١,٢١٩	.	٢٠١٣/٣/٢٧ ٩	—	
	ترميم مبنى الديوان العام حى شرق	٢,٢١٩	١,٨٥٥	٢٠١٩/٣/١٩	٢٠٢٠/٢/١٨	
وسط	ترميم مبنى محطة تزويد الوقود بالحضره القبليّة	٠,٥٤٦	٠,٨١٩	٢٠١٩/٥/٥	٢٠١٩/١/٠٤	
	ترميم مبنى إدارة الجراج بالحضره القبليّة	٠,٥١٢	٠,٨٠٦	٢٠١٩/٤/٣٠	٢٠١٩/١/١٣	
	صيانة سور بشرطة المرافق	٠,٣٢٤	٠,٣١٣	٢٠٢٠/٤/١	٢٠٢٠/٦/٥	
غرب	إنشاء سور حول الأرض المخصصة لشرطة المرافق بمنطقة المنشية الجديدة	١,٧١٥	١,٣٥٥	٢٠٢٠/٣/١٨	٢٠٢٠/٦/٩	
العامرية	ترميم المبنى الادارى بالمجزر الآلى بالعامرية	٢,٣٥٣	١,٧١٢	٢٠١٩/٤/١٨	٢٠٢٠/٥/١٨	
الاجمالى		١٥,٧٣	٢١,٢٣٣			

تطوير المناطق الغير مخططة

الحى	اسم المشروع	وصف المشروع	تاريخ البدء	التكلفة بالمليون جنيه	العائد من المشروع
المنتزة ثان	عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة العصافرة قبلى	تطوير المرافق العامة للمناطق العشوائية	—	٩٦,٦٧٦	تطوير المرافق العامة للمناطق الغير مخططة
	عملية تطوير و إحلال شبكة مياه الشرب بمنطقة العصافرة قبلى		٢٠٢٠/٢/١٥	٤٠,٢٦٧	
اجمالى المنتزه ثان				١٣٦,٩٤٣	
وسط	عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة نادى الصيد		—	١٧,٨١٩	
	عملية تطوير وإحلال شبكة مياه الشرب بمنطقة نادى الصيد		٢٠٢٠/٦/١١	٤١,٣٧٤	
	عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة الحضرة الجديدة		—	٥٥,٤٤٩	
إجمالى وسط				١١٤,٦٤٢	
الاجمالى				٢٥١,٥٨٥	

مديرية الشباب والرياضة

٢,١٩٨ مليون جنيه

تكلفة ترميم وتطوير عدد (١) نادي ،
عدد (٢) مركز شباب ، (١) مبنى ادارى
، رفع كفاءة ملعب خماسى .

١,١٥٠ مليون جنيه

تكلفة ترميم نادي بحى شرق ومركز شباب
بحى العامرية ثان .

٠,٦٥٠ مليون جنيه

تكلفة تطوير مركز شباب بحى العامرية أول
ومبنى ادارى بحى شرق .

٠,٣٩٨ مليون جنيه


تكلفة رفع كفاءة ملعب خماسى
بحى شرق .



الحى	وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	العائد من المشروع
شرق	ترميم نادي الرمل الرياضي	٨٠٠	٨٠٠	٢٠١٩/٣/٢٧	٢٠١٩/٥/٢٩	- توفير مقر للموظفين - تطوير صالة الألعاب والاستفادة منها - تجهيز مقر السونا وتطوير صالة الجيم للاستفادة المثلي من النادي
	رفع كفاءة الملعب الخماسي بنادي باكوس	٤٠٠	٣٩٨	٢٠١٩/٥/١١	٢٠١٩/٥/٢٢	تطوير الملعب لتحقيق الاستفادة المثلي وممارسة الأنشطة الرياضية عليه
	تطوير المبني الإداري لمركز شباب ابيس ٢	٣٥٠	٣٥٠	٢٠١٩/٣/٢٨	٢٠١٩/٥/٢٢	الاستفادة من المركز وخدمة أهالي المنطقة
العامرية اول	تطوير مركز شباب طيبه	٣٠٠	٣٠٠	٢٠١٩/٣/٢٨	٢٠١٩/٥/٢٣	ممارسة الأنشطة الرياضية وخدمة أهالي المنطقة
العامرية ثان	ترميم مركز شباب احمد عرابي	٣٥٠	٣٥٠	٢٠١٩/٣/٢٧	٢٠١٩/٥/٢٣	توفير مقر للموظفين وصالة ألعاب لممارسة الأنشطة الرياضية وتوفير عناصر الأمن والسلامة
الاجمالي		٢,٢	٢,١٩٨			

1

تطوير عدد ١٠ مكاتب تموين



المنتزه ثان (٢)	غرب (١)
المنتزه أول (٢)	العجمي (١)
شرق (١)	العامة (١)
وسط (١)	برج العرب (١)

2

٩.٣١٣

بطاقة تموينية تم تسليمها للمواطنين .



3

١٣٢

ألف طن دقيق مورد للصوامع




المكاتب التموينية المطورة	
مركز خدمة أبو قير	
مركز خدمة طوسون	
مركز خدمة السيوف	
مركز خدمة حي شرق	
مركز خدمة حي غرب	
مركز خدمة العجمي	
مكتب تموين منتزه أول	
مكتب تموين باب شرق ثاني	
مكتب تموين العامرية	
مكتب تموين البرج الجديد	
البطاقات المسلمة للمواطنين	٩٠٣١٣ بطاقة تقريباً
كميات الدقيق الموردة للصوامع	١٣١٧١٤,٤٣٧ طن
المعارض المخفضة	لا يوجد معارض مخفضة أو شواذر ولكن تم البدء في فترة الأوكازيون للمحال التجارية من تاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٣

مليون
جنيه

الاعتماد المخصص لإنشاء معرض لتوفير جميع أنواع المبيدات
والمخصبات بجمعية التوفيقية بحى المنتزه

المشروع	الحى	وصف المشروع	الإعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	نسبة التنفيذ	عدد المستفيدين
جمعية التوفيقية	المنتزه	معرض لتوفير جميع أنواع المبيدات والمخصبات	١	يتم الصرف نقدي وآجل للمزارعين	من عام ٢٠١٨	مستمر حتى تاريخه	نسبة ١٠٠%	مزارعى الجمعية

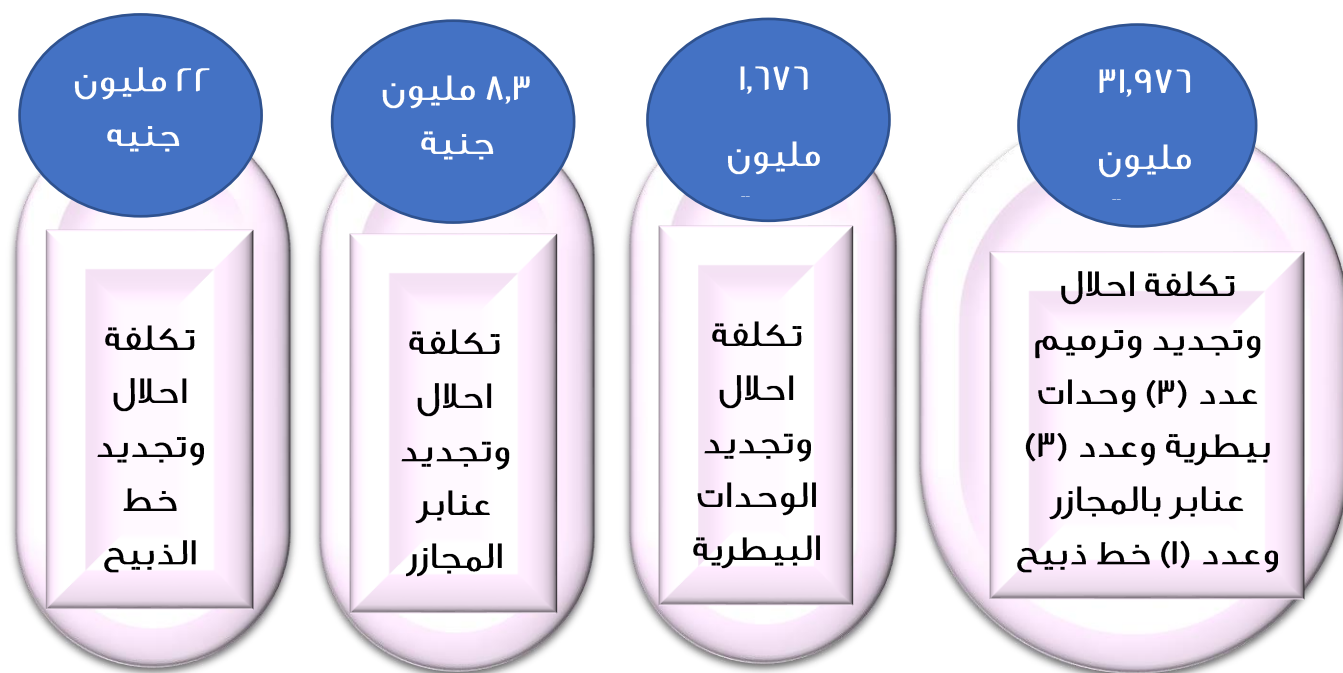

الحى	وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ %
المنتزه اول	إحلال وتجديد وحدة خورشيد		تمويل المنطقة الشمالية العسكرية	٢٠١٩/٤/٨	٢٠٢٠/٦/١	%١٠٠
وسط	إحلال وتجديد وحدة امتداد ابيس	١,٣	١,٣	٢٠١٩/٣/٢٧	٢٠١٩/٩/٢٦	%١٠٠
	ترميم وحدة أبيس	١,٧	٠,٢٦٢	٢٠٢٠/٣/٣	—	%٢٥
عامرية اول	استكمال إحلال وتجديد عنابر المجزر الالى	٣,٤	٣,٤	٢٠١٨/٧/١	٢٠٢٠/٦/٨	%١٠٠
	استكمال إحلال وتجديد باقي عنابر مجزر ابوقير	٣,٣	٣,٣	٢٠١٨/٤/١٨	٢٠٢٠/١/٤	%١٠٠
	استكمال إحلال وتجديد عنبر الخنزير بالمجزر الالى	٥,٦	١,٦	—	—	%٢٠
	إحلال وتجديد خط الذبيح المجزر الالى	٢٨,٢٥	٢٢	٢٠١٩/٢/٢٠	—	%٩٠
مركز ومدينة برج لعرب	إحلال وتجديد وحدة برج العرب	١,٧	٠,١١٤	٢٠٢٠/٣/٣	—	%٢٥
الاجمالي		٤٥,٢٥	٣١,٩٧٦			

١٩٣,١٩

مليون جنيه

اجمالي المنصرف على مشروعات
الاحلال والتجديد والانشاء واعادة
التأهيل لمنشآت شركة مياه
الشرب

٣,١

مليون جنيه

اجمالي المنصرف
على استكمال
تأهيل وترميم
منشآت محطة
مياه المنشية (١)

٢٤,٥

مليون جنيه

اجمالي المنصرف
على انشاء خزان
أرضي سعة ٦٥٠٠
م^٣ و عنبر توليد
برافع مرغم .

٥٦,٨

مليون جنيه

اجمالي المنصرف
على اعادة تأهيل
روافع وفروع
الشركة بأحياء
المنتزه ثان -
المنتزه اول - شرق
، منشآت محطة
مياه النزهة و
محطة شرقي
ومحطة ك
٤٠ والخطوط
الناقلة بأقطار
مختلفة في جميع
مناطق المحافظة


١٠٨,٧٩

مليون جنيه

اجمالي المنصرف
على احلال وتجديد
مأخذ محطة مياه
شرقي وشبكات
التوزيع لمياه
الشرب والخطوط
الناقلة بأقطار
مختلفة في جميع
مناطق المحافظة

شركة مياه الشرب

الحى	وصف المشروع	الإعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	نسبة التنفيذ %	عدد المستفيدين
	إعادة تأهيل روافع وفروع الشركة الواقعة شرق المحافظة (فرع سيدي بشر – فرع المندرة – فرع الرمل – فرع أبو قير) وروافع (المنتزه – المندرة – سيدي بشر – أبو النواتير)	٢٧,٤	١١,٧٠	٢٠١٩/٤/٣٠	جاري التنفيذ	٤٣%	٢٧٤٤٣٩٤
وسط	استكمال تأهيل وترميم منشآت محطة مياه المنشية (١) وإعداد المحطة للحصول على شهادة الإدارة الفنية طبقاً لمواصفات التشغيل والصيانة TSM المستدامة القياسية لرفع كفاءة التشغيل، وكفاءة مراحل التنقية بها	٢١,٢	٣,١٠	٢٠٢٠/٢/٨	جاري التنفيذ	٢٠%	٩٠٠١٨٩
	إحلال وتجديد مأخذ محطة مياه شرقي على ترعة مياه الشرب لزيادة كمية المياه العكرة المغذية للمحطة وتحسين جودة ونوعية المياه الداخلة لها	٩,٠٠	٩,١٠	٢٠١٨/٣/١٧		١٠٠%	٩٤٧٣٨١
	إعادة تأهيل منشآت محطة مياه النهضة والمائية لرفع كفاءة التشغيل وكفاءة مراحل التنقية بالمحطة	٦,٦٠	١,١٠	٢٠١٩/١٠/٢٧	جاري التنفيذ	٢٥%	٤٨٠٠٠٠
	إعادة تأهيل منشآت محطة شرقي لإعدادها للحصول على طبقاً لمواصفات TSM شهادة الإدارة الفنية المستدامة التشغيل والصيانة القياسية لرفع كفاءة التشغيل، وكفاءة مراحل التنقية بها	٢٧,٣٥	٢١,٤	٢٠١٨/٦/٩	جاري التنفيذ	٨١%	٩٤٧٣٨١
العامرية أول	إنشاء خزان أرضي سعة ٦٥٠٠ م³ برافع مرغم	٢٢,٥٠	٢١,٧	٢٠١٦/٧/١٦	٢٠١٩/١٠/٣٠	١٠٠%	٣٥٠٠٠٠ (منطقة خدمة الرافع فقط)
	إنشاء عنبر توليد برافع مرغم لتوفير مصدر بديل للكهرباء لتلافي مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربى بالمنطقة	٢,٨٥	٢,٨٠	٢٠١٨/٣/٢٢	٢٠١٩/٨/١٧	١٠٠%	٣٥٠٠٠٠ (منطقة خدمة الرافع فقط)
العامرية ثان	إعادة تأهيل منشآت محطة ك ٤٠ لرفع كفاءة وحدات التنقية وتجهيز مرحلتي التشغيل الثانية والثالثة (إيتالبا وهورس) للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة	٤٧,٥٠	٢٢,٦	٢٠١٩/١٠/٢٢	جاري التنفيذ	٤٨%	٤٠٤٧٧٢
جميع مناطق الاسكندرية	مشروعات احلال وتجديد شبكات التوزيع لمياه الشرب والخطوط الناقلة بأقطار مختلفة على أن يتم استبدال وتغيير المواسير المتهالكة ذات الأقطار الأقل والأكبر من ٣٠٠ مم بمواسير بأنواع مختلفة (٩ شهور)	.	٩٩,٦٩	٢٠٢٠/٢٠١٩		جاري استكمال تنفيذ مشروعات الشبكات	٥,١٧ مليون نسمة
الاجمالى		١٦٤,٤	١٩٣,١٩				

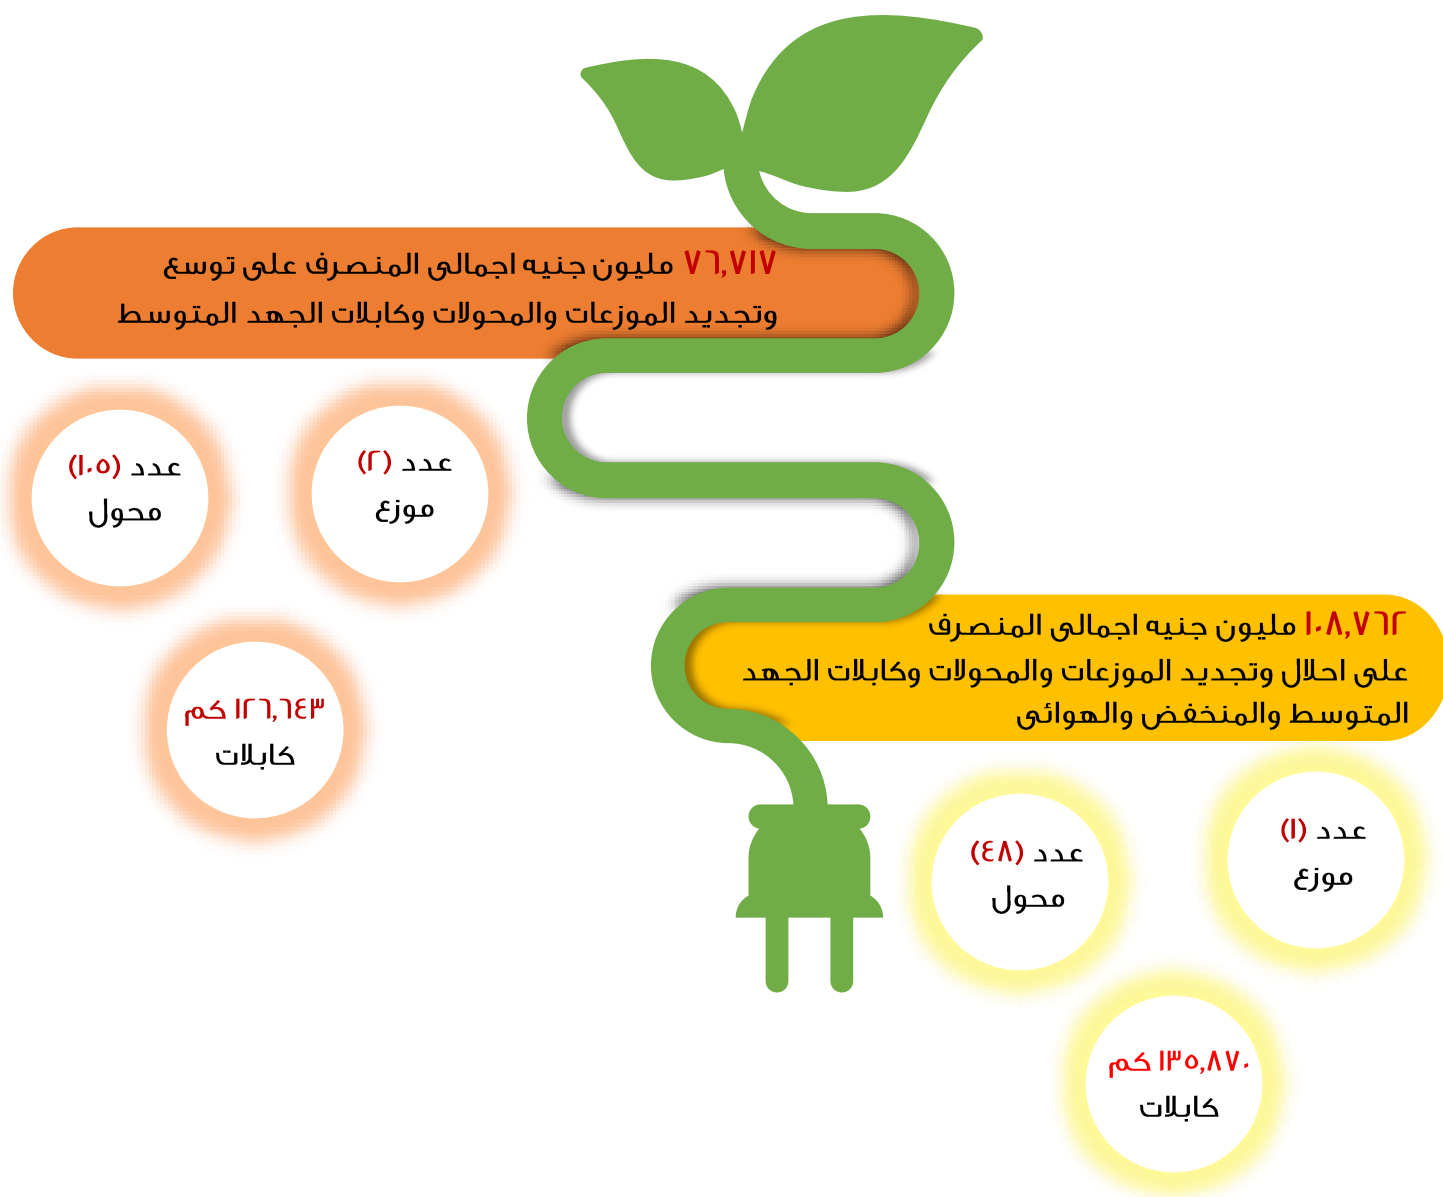

١. توسع وتجديد

الحى	وصف المشروع			الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	عدد المستفيدي ن
	موزعات (عدد)	محولات (عدد)	اطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والهوائى (كم)					
منتزة اول	.	١٣	٣١,٢٩٩	٨٩,٢٦٧	٧٦,٧١٧	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٨٠٩٨٠٠
منتزة ثان	.	٨	٢١,٣٢٣					
شرق	.	٨	٢٢,٠٨٨					
وسط	.	.	١٨,٥٠٩					
الجمرك	.	٢	١,٣٦٥					
غرب	١	.	٣,٩٨٦					
العامة اول	.	.	٢,٩٨٤					
العامة ثان	.	٢	٣,٤٨٤					
العجمى	.	٩	١٨,٩٠٨					
مركز ومدينة برج العرب والحمام	.	٦	١١,٩٢٤					
الاجمالى	١	٤٨	١٣٥,٨٧٠	٨٩,٢٦٧	٧٦,٧١٧			٢٨٠٩٨٠٠

٢. الاحلال وتجديد

الحى	وصف المشروع			الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	عدد المستفيدي ن
	موزعات (عدد)	محولات (عدد)	اطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والهوائى (كم)					
منتزة اول	.	١٧	١٦,٧٧١	٤٦,٢٠٧	١٠٨,٧٦٢	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٨٠٩٨٠٠
منتزة ثان	.	٨	١٧,٠٢٢					
شرق	.	٣٢	٢١,٤٠٧					
وسط	.	٧	١٣,٠٦					
الجمرك	١	٤	٦,٩٠٧					
غرب	١	٥	٣,٤٤٦					
العامة اول	.	٤	٧,٥٧٠					
العامة ثان	.	٥	٢,٦٦٢					
العجمى	.	١٤	١٩,٥٢١					
مركز ومدينة برج العرب والحمام	.	٩	١٨,٢٧٥					
الاجمالى	٢	١٠٥	١٢٦,٦٤٣	٤٦,٢٠٧	١٠٨,٧٦٢			٢٨٠٩٨٠٠

٩٣,١٢٤ مليون جنيه اجمالي المنصرف على مشروعات الاحلال والتجديد



انجازات شركة الصرف الصحي الاحلال والتجديد

الحى	وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ %	عدد المستفيدين
المنتزة	إحلال وتجديد شارع (٥٧) مع خالد بن الوليد وربطها على طريق الكورنيش وشارع ٥٦ بمنطقة المنتزة اول	٠,١	٠,١	٢٠١٩-٠٢-٠٩	٢٠١٩-٠٨-٠٨	١٠٠	١١٠٠٠
	إحلال وتجديد عدد ٢ ظلمية لمحطة ١ المنتزة	٥,١٣٣	٥,١٣٣	٢٠١٨-١١-٢٨	٢٠١٩-١١-٠٥	١٠٠	٩٣٠٠٠
	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمنطقة السيوف شماعة وربط المجمع بشارع وادى الملوك على نفق المنطقة الشرقية منطقة المنتزة اول (الجزء الاول)	٨,٨١٩	٨,٨١٩	٢٠١٩-٠٣-١٧	٢٠٢٠-٠٢-١٥	١٠٠	٢٤٠٠
	تدعيم شارع احمد عرابي ببيارة (ابو قير - منتزة ثانى)	٠,٠٨٤	٠,٠٨٤	٢٠١٧-٠٦-١٤	٢٠١٩-٠٧-١٨	١٠٠	٦٥٠
	توريد عدد (٣) طقم اصلاح خط طرد قطر ٧٠٠مم بطول ١٢٥ سم صلب بالجوانات والمسامير لمحطة ٦ المنتزة	٠,٢٧٤	٠,٢٧٤	خلال العام المالى		١٠٠	—
	مد خط طرد محطة (٥) الخروعة الى محطة (٣) خورشيد وانشاء غرفة محابس على الخط وغرفة تهدئة امام المحطة	٢,٣٦٥	٢,٣٦٥	٢٠٢٠-٠٣-٠٩	٢٠٢٠-٠٣-٢٢	١٠٠	١٢٠٠٠
	احلال وتجديد ظلمية رقم ٤ ظلمية بامبيس اوميجا ٦٠ محطة (٢) المنتزة	٠,٥٦٨	٠,٥٦٨	٢٠١٩-٠١-٢٧	٢٠١٩-٠٨-١٠	١٠٠	١٢٤٠٠٠
	توريد لوحة تحسين معامل قدرة لرفع كفاءة محطة سيدى بشر ٣	٠,٢٦٥	٠,٢٦٥	خلال العام المالى		١٠٠	٤٠٠٠٠٠
	احلال وتجديد الهبوط الحادث بشارع عبد الحليم محمود (شارع وهران سابقا) بطريقة الدفع النفقى	٨,٠٩٩	٨,٠٩٩	٢٠١٩-٠٩-٠٢	٢٠٢٠-٠٤-١٩	١٠٠	١٧٠٠٠
	إحلال وتجديد عدد (٤) ظلميات محطة ٦ دبانة	٣,٥٨٧	٣,٥٨٧	٢٠١٩-٠٣-٠٣	٢٠١٩-٠١-٠١	١٠٠%	٢٨٠٠٠
اجمالى المنتزة		٢٩,٢٠٤	٢٩,٢٠٤				
شرق	إحلال و تجديد عدد ٤ مجموعات رفع مجارى محطة الشيخ الصغرى	٦,٦١٩	٦,٦١٩	٢٠١٩-٠٢-٢٠	٢٠٢٠-٠٢-٢٠	١٠٠%	١٧٠٠
	احلال وتجديد خط الصرف بشارع عبدالله بن رواحة الصالحية	٠,٨١٦	٠,٨١٦	٢٠٢٠-٠١-٢٠	٢٠٢٠-٠٤-٠٩	١٠٠%	٣٠٠٠
	احلال وتجديد عدد(٣) ظلمية لمحطة اسكان حجر النواتية بعزبة القلعة بمنطقة شرق	٦,٢٥٢	٦,٢٥٢	٢٠١٨-١١-١٩	٢٠١٩-١٢-٢٩	١٠٠%	٢٧٠٠٠
	إحلال وتجديد عدايتى خط طرد محطة (١١) شرق اسفل ترعة المحمودية ابو سليمان	١,٧٥٥	١,٧٥٥	٢٠١٩-٠٤-١٥	٢٠١٩-٠٧-١٤	١٠٠%	مناطق متفرقة
	احلال وتجديد محابس الهواء بخطى الطرد واحلال وتجديد محابس عدم الراجع واصلاح محبس سكينه على خط الطرد قطر ٤٠٠مم لمحطة السيوف	٢,٩١٥	٢,٩١٥	٢٠١٩-١١-٢٤	٢٠٢٠-٠٦-٢٣	١٠٠%	١٦٠٠٠٠٠
اجمالى شرق		١٨,٣٥٧	١٨,٣٥٧				
وسط	تدعيم ورفع كفاءة بعض مطابق نفق المنطقة الوسطى بمنطقة غرب وغرفة مدخل العداية البحرية بطريق قنال المحمودية امام مبنى ١٤ مايو بمنطقة وسط	٠,١١٣	٠,١١٣	٢٠١٩-٠٨-٢٧	٢٠١٩-٠٩-١٠	١٠٠%	٤٥٠٠٠٠
	احلال وتجديد وتدعيم شارع سوق كوتاريللا وجزء من تصرفات الغيط الصعيدى على خط الصرف للعداية اسفل محور المحمودية الجارى تنفيذه	٠,٣٥٢	٠,٣٥٢	٢٠١٩-٠٢-١٣	٢٠١٩-٠٧-١٥	١٠٠%	٧٦٠٠
	احلال وتجديد وكابل تغذية محطة صرف صحى ابيس العاشرة	٠,١٢٥	٠,١٢٥	خلال العام المالى		١٠٠%	—
	رفع كفاءة عدد (١١) بوابة منزلقة بمحطة رفع سموحة بمنطقة وسط	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	٢٠١٨-١٢-١٠	تطبيق غرامة تاخير		٣٩٠٠٠٠
	احلال وتجديد منشية النزهة والغاء محطة سنية العبد بمنطقة وسط	٠,٧٤٩	٠,٧٤٩	٢٠١٨-١٢-١١	٢٠١٩-٠١-١٠	١٠٠%	١١٠٠٠
اجمالى وسط		١,٩٣٧	١,٩٣٧				

انجازات شركة الصرف الصحي الاحلال والتجديد

الحى	وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ %	عدد المستفيدين
جمرك	احلال وتجديد وتدعيم شبكة الصرف الصحي بشارع فرنسا بدءا من نفق المنطقة الوسطى وحتى مجمع قصر رأس التين والتفرعات	٠,٧٨	٠,٧٨	٢٠١٧-٠١-٠١	٢٠١٩-٠٧-٠١	%١٠٠	٨٠٠٠٠
غرب	احلال وتجديد السرنند الميكانيكى رقم او ٣ و ٤ بعنبر الرقع واصلاح البوابة الميكانيكية لخروج السرنند ١ و ٣ لمحطة التنقية الغربية	٠,١٥	٠,١٥	٢٠١٩-٠٢-٠٦	٢٠١٩-٠٨-٠٨	%١٠٠	٤٥٠٠٠٠
	ازالة (عدد ٤) مراوح طرد الهواء من البيارة الرطبة ومسارات الهواء خاصتها وتركيب عدد ٨ مشايات مكان الفتحات خاصتها لمحطة التنقية الغربية بعنبر الرقع	٠,٦٦	٠,٦٦	٢٠١٩-٠٨-٠٦	٢٠١٩-٠١-١١	%١٠٠	٤٥٠٠٠٠
اجمالى غرب		٠,٢٣١	٠,٢٣١				
العجمى	نقل التصريفات الواردة لمحطة صا عن طريق خط الانحدار قطر ١٠٠م بداية من شارع اسكندرية – مطروح مع شارع ريدينكس وربطها على محطة EPS	٢,٤٣١	٢,٤٣١	٢٠٢٠-٠٢-٠٨	٢٠٢٠-٠٩-٠٦	%١٠٠	٥٩٠٠٠
	انشاء بيارة بمحطة معالجة الهانوفيل سعة ٢٠٠٠ م٣/يوم (ارض الهيش)	٤,٣٢٥	٤,٣٢٥	٢٠١٩-٠٩-١٨	٢٠٢٠-٠٦-١٦	%١٠٠	١٢٨٠٠٠
	ترحيل كابل الومنيوم لمحطة صرف صحى الكيلو ٢١	٠,١٧٥	٠,١٧٥	خلال العام المالى		%١٠٠	————
	تاهيل وتدعيم ورفع الكفاءة الفنية لمحطة معالجة الهانوفيل (توريد نواشير هواء لوحدة المعالجة سعة ٣٠٠٠م٣/يوم)	٠,٨٢٢	٠,٨٢٢	٢٠٢٠-٠٤-١٣	٢٠٢٠-٠٧-١٢	%١٠٠	١٢٨٠٠٠
اجمالى العجمى		٧,٧٥٣	٧,٧٥٣				
العامرية	احلال وتجديد واستكمال بعض اجزاء الشبكة الكهربائية بموقع ٩ وتجهيزات لأخرى	٤,٩٠٥	٤,٩٠٥	٢٠١٨-٠٤-٣٠	٢٠٢٠-٠٢-٢٧	%١٠٠	٥١٦٣٧٥٠
	تدعيم بيارة داخل موقع ٩	٠,٣٩١	٠,٣٩١	٢٠١٩-٠٧-١٦	٢٠١٩-١١-٢٥	%١٠٠	٥١٦٣٧٥٠
	احلال وتجديد عدد ٤ اطقم وصلات فك وتركيب ووصلات لعدد ٤ طلمبات راسية KSB بمحطة عبد القادر قبلى العامرية	٠,٠٩	٠,٠٩	٢٠١٩-٠١-٠١	٢٠١٩-١٢-٠١	%١٠٠	————
اجمالى العامرية		٥,٣٨٦	٥,٣٨٦				
جميع انحاء المدينة	احلال وتجديد السرنندات وبوابات لبعض محطات الرقع لمناطق شرق والمنطرة والعامرية	٢,٠٥٧	٢,٠٥٧	٢٠١٩-٠٥-٠٩	٢٠١٩-٠١-٠٥	%١٠٠	مناطق متفرقة
	احلال وتجديد و تدعيم هبوطات شبكة الانحدار وخطوط الطرد بجميع انحاء المدينة	١٥,٤٠٨	١٥,٤٠٨	٢٠١٩-٠٢-١٤	٢٠١٩-٠١-١٧	%١٠٠	مناطق متفرقة
	تطهير وازالة التعثرات من خطوط الانحدار بالشبكات والبيارات	٦,٠٤١	٦,٠٤١	٢٠١٩-٠٩-٢٩	٢٠١٩-٠١-٢٨	%١٠٠	مناطق متفرقة
	احلال وتجديد كابلات كهربائية لبعض محطات الشركة	٠,١٩٥	٠,١٩٥	خلال العام المالى		%١٠٠	مناطق متفرقة
	توريد مواسير ومحابس لتطوير محور الحمودية	٥,٠٨٧	٥,٠٨٧	خلال العام المالى		%١٠٠	مناطق متفرقة
	احلال وتجديد وتدعيم الشبكات بشوارع متفرقة بجميع انحاء أنحاء المدينة	١,٣٩	١,٣٩	٢٠١٩-١٢-٢٦	٢٠٢٠-١٢-٢٥	%١٠٠	مناطق متفرقة
اجمالى انحاء المدينة		٣٠,١٧٨	٣٠,١٧٨				
الاجمالى		٩٣,١٢٤	٩٣,١٢٤			%١٠٠	

٢٥٣٨٥ عدد العملاء الذين تم توصيلهم بالغاز الطبيعي بنطاق حي العامرية


الحى	وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	عدد المستفيدين
العامرية	توصيل الغاز الطبيعي للمنازل	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٥٣٨٥

١٦٥٢٣ عميل تم توصيله بالغاز الطبيعي من خلال مبادرة توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط بحد أقصى (٧) سنوات

المشروع	المنطقة	العميل
مبادرة توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط بحد أقصى (٧) سنوات	منطقة غرب الاسكندرية	١٦٥٢٣

➤ ٨٩٥٥١ اجمالي عدد العملاء الذين تم تشغيلهم بالغاز الطبيعي .

- ١٧٨٧٦ عميل تم توصيله بالغاز الطبيعي (مشروع) .

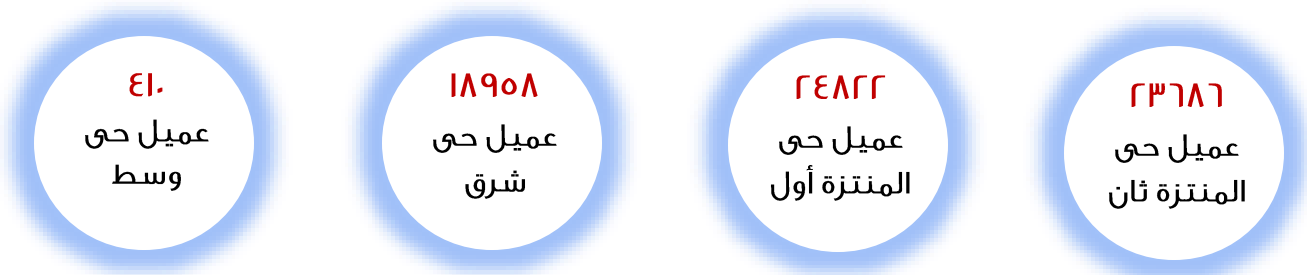

- ٢١٦٧٨ عميل تم توصيله بالغاز الطبيعي (خدمة العملاء) .

➤ ١٢٢,٠١٤ كم اجمالي ما تم تنفيذه من خطوط (رئيسية - فرعية) شبكات الغاز الطبيعي الأرضية .



أولا : توصيل الغاز الطبيعي للعملاء (مشروع)

الحى	المنطقة	عدد العملاء	
المنتزة ثان	منطقة ابو خروف ومساكن طلعت مصطفى	١٨٩٣	
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش مصطفى كامل – ش النبوي المهندس – ش ٣٠ عرامة – ش ٤٥ قبلي)	٨٢٠	
	منطقة سيكلام وإسكوت	٨٥٤	
	منطقة المنشية البحرية	٢٣٣١	
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش الاكاديمية – سكة حديد أبو قير – ش المستشارين – إمتداد المستشارين) منطقة مرور طوسون	٨٩٩	
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش المستشارين – إمتداد المستشارين – ش ١٠ – ش خالد بن الوليد – سكة حديد رشيد)	٥٦٩٦	
	منطقة الحرمين	٨٥١	
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش أبو قير – ش المصنع الحربي – ش البحر المتوسط – ميدان مسجد النهضة) منطقة أبو قير	٧٥٩٧	
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش التين – ش الطابية – سكة حديد رشيد – مزلقان ٢٥)	٢٠٤٣	
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش التين – ش الطابية – سكة حديد رشيد – مزلقان المعمورة)	٦٦٤	
	مساكن الحرمين والاقواق	٣٨	
	اجمالى المنتزة ثان		٢٣٦٨٦
المنتزة أول	منطقة أرض الفضالي	٩٩٠	
	منطقة عزبة أبو سلطان	٩١	
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش الشرنوبى – ش البكاتوشي – ش المراغى – ش مسجد يوسف)	٥٢٥٧	
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش المراغى – ش مسجد يوسف – ش مدرسة الشهيد محمد حمدي – ش البكاتوشي – ش الخروعة – ش المراغى)	٤٠٦	
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش المراغى – ش الخروعة – ش سوق خورشيد – ش قنال المحمودية البر البحري)	١٢٧٢	
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش ال ٥٠٠ – ش البكاتوشي – ش عزبة البحر – سور البحرية)	٢٢٩١	
	منطقة عزبة محسن الجديدة والقديمة	٧٣٣١	
	منطقة منشية ناصر و بسكو مصر	١٣٠	
	منطقة الفلكي	١٩٤٤	
	منطقة الرأس السوداء	٢٠٧	
	منطقة عزبة البحر بالعوايد بجوار شركة الاسكندرية للادوية	٦٠	
	منطقة عزبة العبيد بخورشيد	١٢٣٣	
	اجمالى المنتزة أول		٢٤٨٢٢

أولا : توصيل الغاز الطبيعي للعملاء (مشروع)

الحى	المنطقة	عدد العملاء
شرق	منطقة زعربانه والظاهرية بحري	٩٤١
	منطقة عزبة فتى خلف مرور أبيس	٢٦
	أبراج سوميد والشرطة قبلي المحمودية	١١٥
	ش النصر وعزبة حجازي	٥٧٠
	الحضرة الجديدة وعزبة مطابع محرم خلف شركة مطابع محرم	١١٤٥
	منطقة الرابعة الناصرية	٣٠٢٧
	منطقة قبلي المحمودية من نزلة أبو سعدة حتى العوايد	١٧٩٤
	عزبة الموظفين أسفل كوبري أبيس	٤٣٧
	أبيس الثانية	١٥٢٤
	ش مصطفى كامل من مزلقان غبريال حتى كوبري أبو سرحة	٣٠
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش ونجت قبلي - السكة الحديد - ش حجر النواتية - السكة الحديد)	٤٩٤
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش محطة السيوف - ش العشرين - ش حجر النواتية - إمتداد ش حجر النواتية - السكة الحديد)	٤١١
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش محطة السيوف - ش العشرين - ش الترعة المردومة - ش دنا العمومي - السكة الحديد)	١٥٦
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش مصطفى كامل - ش أحمد أبو سليمان - ش دنا العمومي - إمتداد ش دنا العمومي - السكة الحديد)	٦٨٥١
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش جميلة أبو حريد - ش الشركة العربية - ش أحمد أبو سليمان - ش مصطفى كامل)	١١
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش العشرين - ش أحمد أبو سليمان - ش دنا العمومي - ش الترعة المردومة)	٦٠٤
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش قنال المحمودية البر البحري - ش حجر النواتية - إمتداد ش حجر النواتية - ش العشرين - ش أحمد أبو سليمان)	٢٥٧
	منطقة عزبة سكيانة الجديدة والقديمة	٥٦٥
اجمالي شرق		١٨٩٥٨
وسط	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش الجواهر - ش السكة الحديد - ش جلال الدسوقي)	٤١٠
الاجمالي		٦٧٨٧٦

اجمالي عدد العملاء الذين تم تشغيلهم بالغاز الطبيعي :

طريقة التنفيذ	عدد العملاء
مشروع	٦٧٨٧٦
خدمة العملاء	٢١٦٧٥
الاجمالي	٨٩٥٥١

ثانيا : تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي الأرضية : خطوط رئيسية + خطوط فرعية

الحى	المنطقة	الطول كم
المنتزة ثان	منطقة الرحامنة والهلالية	١٥,٠٤٨
	منطقة مساكن القوات المسلحة بطوسون	١٢,٤٢٥
	منطقة الحرمين	١٢,٥١٣
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش المنشية البحرية – ش ٤٥ الدولي – إمتداد ش حي المنتزه ثالث – إمتداد ش سيكلام)	١٢,٠٧١
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش ١٠ – ش المستشارين – ش ١٦ – ش سور البحرية)	٢,٨٨٨
اجمالي المنتزة ثان		٥٤,٩٤٥
المنتزة أول	ش الخروج من مدرسة الشهيد محمد حمدي حتى تقاطعه مع ش سوق خورشيد	٠,٢٨٠
	عزبة العبيد بخورشيد	١٥,١٢٦
	عزبة المهاجرين	١,٠٩٤
	عزبة تحيمر بالعوايد	١,٠٠١
	جراج الحي – ش مدخل عزبة زقزوق – ش السيدة عائشة – ش مصطفى كامل	١٦,٥٤٨
	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش السيدة عائشة – ش مصطفى كامل – ش ٤٥ الدولي – ش إمتداد عزبة زقزوق)	٥,٧٩٥
	عزبة البحر بالعوايد	٤,٠٥١
اجمالي المنتزة أول		٤٣,٨٩٥
شرق	عزبة منسي قبلي المحمودية	١,٤٧٦
	منطقة الرابعة الناصرية	٢١,٦٩٨
اجمالي شرق		٢٣,١٧٤
الاجمالي		١٢٢,٠١٤

مدارس تم الانتهاء من التنفيذ و الاستلام الابتدائي خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ من ٢٠١٩/٠٧/٠١ حتي ٢٠٢٠/٠٧/٠١

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	نوع الإنشاء	المرحلة المستفيدة	عدد الفصول	الحي	القيمة التعاقدية بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ النهاية
١	الزهور ١،٢ الرسمية لغات	٢١٣٤١٩	انشاء جديد	رسمي لغات	٢٨	المنتزة ثان	١٣,٣٧٤	٢٠١٨/١٢/٣٠	٢٠٢٠/٢/١٢
٢	احمد مجدي أبو زيد ابتدائي	٢٠٩٣٠٦	توسع	ابتدائي	١٢	المنتزة ثان	٤,١٣٠	٢٠١٨/٠٣/١٥	٢٠١٧/٠٧/٠٩
٣	طوسون ث صناعي بنين	٢٠٦٢٨٤	توسع	صناعي	٣٠	المنتزة ثان	٨,١٧٧	٢٠١٩/٦/٩	٢٠٢٠/٢/٩
اجمالي المنتزة ثان							٢٥,٦٨١		
١	ارض الشركة المتحدة كرسمي لغات	٢١٤٠١١	انشاء جديد	رسمي لغات	٣٣	المنتزة اول	١٤,٧٩١	٢٠١٨/١٢/٠٤	٢٠١٩/١٢/١٢
٢	الفضالي ب	٢١٤٠٧٢	انشاء جديد	ابتدائي	٢٢	المنتزة اول	١١,٧٦٦	٢٠١٩/٧/١	٢٠١٩/١٢/٣٠
٣	المتحدة ٣ للتعليم الاساسي	٢١٤٠٢٣	انشاء جديد	اساسي	٢٢	المنتزة اول	١٠,٤٩١	٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/٠٥/١٩
٤	ارض الشركة المتحدة ١	٢١٤٠٠٩	إنشاء جديد	ابتدائي	١٦	المنتزة اول	٩,٠٥٣	٢٠١٨/٠٨/٠١	٢٠١٩/٠٧/١٦
٥	احمد ياقوت ابو حمده للتعليم الاساسي	٢١٣٩٣٨	إنشاء جديد	أساسي	٤٤	المنتزة اول	٢١,٩٤٣	٢٠١٧/٠٩/٢٣	٢٠١٩/٨/٢١
٦	عزبة محسن الجديدة الابتدائية المشتركة	٢٠٢٣٤٦	احلال كلي	ابتدائي	١٦	المنتزة اول	٧,١٣٤	٢٠١٨/٩/٢٣	٢٠١٧/٠٧/٠٩
٧	فاروق جرانة الابتدائية	٢١٠٣٠٠	توسع	ابتدائي	١١	المنتزة اول	٥,٠٤٢	٢٠١٩/٠٧/٠٤	٢٠٢٠/٣/١٥
٨	مصطفى كمال حلمي ب	٢١٠٢٣٥	توسع	ابتدائي	٩	المنتزة اول	٥,٠٩٢	٢٠١٩/٧/٠٤	٢٠٢٠/٤/١٢
٩	روحيه حجرع	٢٠٩١٩١	توسع	اعدادي	١٠	المنتزة اول	٦,٢١٨	٢٠١٩/٧/٢٨	٢٠٢٠/٤/٢٨
١٠	الامام عبد الحليم محمود	٢١٠٠٥٦	توسع	ابتدائي	١٦	المنتزة اول	٥,٨٣٥	٢٠١٩/٧/٢٨	٢٠٢٠/٠٥/١٣
١١	منير الجمال من حضانة للثانوي رسمية لغات	٢٠٧٢٧٧	توسع	من حضانة الى الثانوي لغات	٣٢	المنتزة اول	١٠,٧٥٥	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٩/٨/١٥
١٢	محمد البرادعي للتعليم الاساسي	٢١١٣١٧	توسع	اساسي	٢٢	المنتزة اول	١٠,١٩٥	٢٠١٨/١١/١٩	٢٠١٩/١٢/٨
اجمالي المنتزة أول							١١٨,٣١٥		

مدارس تم الانتهاء من التنفيذ و الاستلام الابتدائي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ من
٢٠١٩/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٠/٠٧/٠١

م	أسم المدرسة	الرقم التعريفي	نوع الإنشاء	المرحلة المستفيدة	عدد الفصول	الحي	القيمة التعاقدية بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ النهاية
١	كورونا لغات	٢٠٧٥٦٨	توسع	أساسي رسمي لغات	٩	شرق	٤,٣٢١	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٩/٠٧/٠٧
٢	باكوس ب	٢٠٠٢٣٢	توسع	ابتدائي	١٣	شرق	٤,١٠٦	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٩/٠٧/٢١
٣	ارض كلية الزراعة	٢٠٦٨٨٠	توسع	ابتدائي	٩	شرق	٤,٦٥٥	٢٠١٨/٠٨/٠١	٢٠١٩/٠٩/٠٣
٤	نجيب محفوظ الرسمية لغات	٢١١٦٠٨	توسع	رسمي لغات	٢٧	شرق	٨,٨٠٠	٢٠١٨/١٠/١٧	٢٠١٩/٩/٢٩
اجمالي شرق							٢١,٨٨٢		
١	مخازن الشرطة بالحضرة	٢١٤١٦١	انشاء جديد	اساسي	٢٢	وسط	١٢,٥٠٩	٢٠١٧/٠٧/٢٨ ٩	٢٠٢٠/١١/٢٣
٢	أبيس ٨ للتعليم الأساسي	٢٠١٣٧٥	توسع+تعلية	اساسي	٢٩	وسط	٧,٤٩٠	٢٠١٨/١١/١٨	٢٠١٩/١١/١٣
٣	عبد العزيز هارون للتعليم الأساسي	٢٠٩٩١٤	توسع	اساسي	١٢	وسط	٥,٠٤٨	٢٠١٨/١١/١١	٢٠١٩/١٢/١١
٤	نبويه موسى ث بنات	٢٠١٢٥٠	توسع	ثانوي عام	٢٣	وسط	٦,٩٩٦	٢٠١٨/١١/١١	٢٠٢٠/٠٥/٠٧
اجمالي وسط							٣٢,٠٤٣		
١	رفعت الجمهورية الابتدائية المشتركة	٢٠٦٧١٦	احلال كلي	ابتدائي	٦	الجمرك	٤,٩١٦	٢٠١٧/٠٧/٢٨ ٩	٢٠٢٠/١١/٢٣
١	طلائع العجمي الابتدائية	٢٠٧١٦٤	توسع	ابتدائي	٢٤	العجمي	٣,٨٥٥	٢٠١٧/٠٢/٠٦	٢٠١٩/٠٧/١٥
٢	ارض عباس حلمي ثانوي بنات	٢١٠٨٤٣	توسع	ثانوي عام	١٥	العجمي	٤,٤٤١	٢٠١٨/١١/١١	٢٠٢٠/١١/١٩
٣	الطبرى	٢٠٨١٦٠	توسع	ابتدائي	٨	العجمي	٣,٣٨٠	٢٠١٩/٠٦/٠٩	٢٠٢٠/٠٥/٠٧
اجمالي العجمي							١١,٦٧٦		
١	مصطفى الجبلي الإعدادية بنين	٢٠٤٤٠٠	توسع	اعدادي	١١	العامري	٥,٨٢٦	٢٠١٨/٠٨/٠١	٢٠١٩/٠٧/٠٢
٢	الرواد للتعليم الأساسي	٢٠٥٦٢١	توسع	اساسي	١٧	العامري	٤,٨٠١	٢٠١٨/٠٨/٠١	٢٠١٩/٠٨/٠٤
اجمالي العامرية							١٠,٦٢٧		

مدارس تم الانتهاء من التنفيذ و الاستلام الابتدائي خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
٢٠١٩/٠٧/٠١ حتي ٢٠٢٠/٠٧/٠١

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	نوع الإنشاء	المرحلة المستفيدة	عدد الفصول	الحي	القيمة التعاقدية بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ النهاية
١	بنجره	٢١٠٧٤٢	إنشاء جديد	ثانوي عام	١٥	برج العرب	٦,٠٨١	٢٠١٧/٠٨/٢٦	٢٠١٩/٧/٢
٢	سيدنا اسحاق الابتدائية	٢١٢٩٦٨	إنشاء جديد	ابتدائي	٨	برج العرب	٩,٦٠١	٢٠١٧/٠٦/٢٤	٢٠١٩/٧/٢
٣	بنجر ٣	٢١٤١٣٦	إنشاء جديد	أعدادي	٦	برج العرب	٥,٧٧٦	٢٠١٨/٠٨/٠٨	٢٠١٩/٠٧/٤
٤	قرية بهيج ب	٢١٢٩٥٦	إنشاء جديد	ابتدائي	٨	برج العرب	٥,٨٢١	٢٠١٧/٠٦/٢٤	٢٠١٩/٠٨/٠٤
٥	احمد عرابي الابتدائية	٢١٤١٤٨	إنشاء جديد	ابتدائي	١١	برج العرب	٥,٧٨٢	٢٠١٩/٠٦/٠٩	٢٠١٩/١١/٢٧
٦	برج العرب الجديد الرسمية لغات	٢١١١٦٤	توسع	من حضانة إلى الثانوي لغات	٢٦	برج العرب	٧,٢٠٢	٢٠١٨/١٢/٠٥	٢٠٢٠/٢/٢
٧	مصطفى اسماعيل اساسي	٢١٠٩٢٠	توسع	اساسي	٢٣	برج العرب	٦,٨٤٠	٢٠١٩/٠٦/٠٩	٢٠٢٠/٢/٢٣
٨	البراعم المفتحة الابتدائية	٢٠٧٤٤٤	توسع	ابتدائي	٢٢	برج العرب	٦,٢٧	٢٠١٩/٠٦/٠٩	٢٠٢٠/٣/١٨
٩	محمد عبد الوهاب تعليم اساسي	٢٠٤١٨٢	توسع	اساسي	١٧	برج العرب	٦,٠٦٦	٢٠١٩/٠٦/٠٩	٢٠٢٠/٠٦/٠٨
اجمالي برج العرب						١٣٦	٥٩,١٩٦		

إنجازات هيئة الأبنية التعليمية فرع الإسكندرية خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م

الحي	نوع الانشاء			عدد الفصول			التكلفة بالمليون جنية		
	انشاء جديد	توسع	احلال كلي	اجمالي	انشاء جديد	توسع	احلال كلي	اجمالي	اجمالي
المنتزة ثان	١	٢	٠	٣	٢٨	٤٢	٠	٧٠	٢٥,٦٨١
المنتزة أول	٥	٦	١	١٢	١٣٧	١٠٠	١٦	٢٥٣	١١٨,٣١٥
شرق	٠	٤	٠	٤	٠	٥٨	٠	٥٨	٢١,٨٨٢
وسط	١	٣	٠	٤	٢٢	٦٤	٠	٨٦	٣٢,٠٤٣
الجمرك	٠	٠	١	١	٠	٠	٦	٦	٤,٩١٦
العجمي	٠	٣	٠	٣	٠	٤٧	٠	٤٧	١١,٦٧٦
العامرية أول	٠	٢	٠	٢	٠	٢٨	٠	٢٨	١٠,٦٢٧
برج العرب	٥	٤	٠	٩	٤٨	٨٨	٠	١٣٦	٥٩,١٩٦
الاجمالي	١٢	٢٤	٢	٣٨	٢٣٥	٤٢٧	٢٢	٦٨٤	٢٨٤,٣٣٦

مدارس جاري العمل خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ و الخطط السابقة لها

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	عدد الفصول	تاريخ استلام الموقع	القيمة التعاقدية بالمليون جنية	الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المرحلة	الإدارة	نوع الأنشاء
١	ثانوية الكويت	٢٠٠٦٤٨	٦	٢٠٢٠/٠١/٠٨	٥,٧٠	اساسات	٣٠%	ثانوى عام	المنتزة ثان	توسع
٢	السماذ للتعليم الاساسى	٢٠٣٨٧١	٢١	٢٠١٩/١٢/٠٩	٩,٥٢٨	تشطيبات	٩٠%	اساسي	المنتزة ثان	توسع
٣	عبد السلام عبد الغفار الاعدادية	٢٠٩٢٨٠	١٢	٢٠٢٠/٠٢/٠٤	٥,٤٠٨	تشطيبات	٦٠%	اعدادي	المنتزة ثان	توسع
٤	ارض خلف مركز تدريب اصلاح الزراعي رسمى لغات	٢١٠٨٢٩	٢٩	٢٠٢٠/٠١/٠٨	١٢,٣٨	هيكل رابع	٦٥%	من حضانة الى الثانوى لغات	المنتزة ثان	توسع
٥	الحرمين تقسيم الزهور ثانوى بنات	٢١٠٩٤٤	٣٠	٢٠١٩/١٢/٠٩	٩,٥٦	تشطيبات	٨٠%	ثانوى عام	المنتزة ثان	توسع
	اجمالى التوسع		٩٨		٤١,١					
٦	عزبة الطوير الابتدائية	٢١٤٠٤٧	١٦	٢٠١٩/٠٦/٠٩	١١,٥٥٥	تشطيبات	٩٨%	ابتدائى	المنتزة ثان	انشاء جديد
	اجمالى المنتزة ثان		١١٤		٥٢,٦٥٥					
١	عائشة عبد الرحمن ث بنات	٢٠٩٢٩٢	٣٦	٢٠١٩/١٢/٠٩	١٠,٢٢٠	هيكل ثالث	٤٨%	ثانوى عام	المنتزة أول	توسع
٢	عاطف صدقي الابتدائية	٢١٠٣١٢	١٠	٢٠١٩/١٢/٠٣	٥,٤٩٢	تشطيبات	٨٠%	ابتدائى	المنتزة أول	توسع
٣	البكاتوشي ثانوى عام	٢١١٠٢٦	٣٠	٢٠١٩/١٢/٠٩	٩,٧٣٨	تشطيبات	٧٥%	ثانوى عام	المنتزة أول	توسع
٤	سعد عثمان الابتدائية	٢١١٣٣١	٥	٢٠١٩/٠٦/٠٩	٥,٤٧٧	تشطيبات	٩٠%	ابتدائى	المنتزة أول	توسع
	اجمالى التوسع		٨١		٣٠,٩٢٧					
٥	ارض الشركة المتحدة ٤ للتعليم الاساسي	٢١٤٠٣٥	٢٢	٠١/٠٧/٢٠١٩	١١,٥٢	تشطيبات	٦٤%	اساسي	المنتزة أول	انشاء جديد
	اجمالى المنتزة أول		١٠٣		٤١,٩٧٩					
١	نفرتيى الابتدائية	٢٠٠٠٤٢	٧	٢٠٢٠/٠٤/٢٦	٢,٤٥٣	هيكل ثالث	٣٠%	ابتدائى	شرق	توسع
٢	ايزيس الثانوية بنات	٢٠٠١٢٩	٢٧	٢٠١٩/١١/٢١	٦,٣٦٨	تشطيبات	٧٨%	ثانوى عام	شرق	توسع
٣	اختاتون الابتدائية	٢٠٢٩٣٠	١٧	٢٠٢٠/٠١/٢٦	٨,٠٤٤	هيكل ثانى	٤٥%	ابتدائى	شرق	توسع
٤	الشهيد اشرف الخوجة الابتدائية المشتركة	٢٠٤٩٠٥	٨	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٤,٦٢٧	تجهيز موقع	١%	ابتدائى	شرق	توسع
٥	رشدى الثانوية الصناعية بنات	٢٠٥٠٨٦	٠	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٥,١٦٥	متوقف	١%	ثانوى صناعي	شرق	توسع
٦	ابيس الرابعة الاعدادية	٢٠٧٧٦٠	٥	٢٠١٩/١١/٢٨	٣,٢٨٣	تشطيبات	٩٠%	اعدادي	شرق	توسع
٧	ابيس الاولى	٢١٣٠٥٢	٣٨	٢٠١٦/١١/٢١	٦,١١٢	مطالبة و جاري الاستلام	٩٨%	من الحضانة للثانوى	شرق	توسع
	اجمالى شرق		١٠٢		٣٦,٥٥٢					

مدارس جاري العمل خطة العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وخطط السابقة لها

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	عدد الفصول	تاريخ استلام الموقع	القيمة التعاقدية بالمليون جنية	الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المرحلة	الإدارة	نوع الأشاء
١	عمر بن الخطاب الاعدادية	٢٠٠٤٨٣	١٤	٢٠١٧/٢٨/٩	٧,٤٩١	تشطيبات	٧٩%	اعدادي	وسط	توسع
٢	السيدة خديجه الابتدائية	٢٠١٣٤٠	٩	٢٠١٩/١٢/٠٣	٤,٩٤٩	مباني	٦٧%	ابتدائي	وسط	توسع
٣	ابيس ٧ الاعدادية المشتركة	٢٠١٤١٥	٦	٢٠١٩/١٢/٠٣	٤,١٧٣	مباني	٦٧%	اعدادي	وسط	توسع
	اجمالي التوسع		٢٩		١٦,٦١٣					
٤	ارض الاشرم اساسي لغات	٢١٤١٧٣	٣٣	٢٠١٧/٢٨/٩	١٣,٨٩٦	تشطيبات	٥٦%	أساسي لغات	وسط	انشاء جديد
	اجمالي وسط		٦٢		٣٠,٥٠٩					
١	كبس القطن الابتدائية	٢١١٢٣٠	٢٤	٢٠١٩/١٢/١١	٦,٥١١	تشطيبات	٥٦%	ابتدائي	غرب	توسع + تعلية
١	البيطاش الابتدائية	٢٠٤١٤٥	١٣	٢٠١٩/١٢/٠١	٤,٦١٧	هيكل رابع	٤٢%	ابتدائي	عجمي	توسع
٢	حسن صبحي الاعدادية الثانوية	٢٠٥٦٤٥	٢٦	٢٠١٩/٧/٢٠١٨	٦,٨٩٠	تشطيبات	٩٢%	اعدادي وثانوي	عجمي	توسع
٣	شباب المستقبل	٢٠٦٣٧٣	٢٠	٢٠١٩/٠٧/٠٤	٥,٢٠٥	مطالبة و جاري الاستلام	٩٢%	أساسي	عجمي	توسع
٤	خير الله راغب للتعليم الاساسي	٢٠٧٣٣١	٢٠	٢٠١٩/١٢/٠٣	٦,٤٢٩	تشطيبات	٥٤%	اساسي	عجمي	توسع
٥	الادريسي الاعدادية	٢٠٩٨٧٤	٣٣	٢٠١٩/١٢/٠١	٧,٦٤١	تشطيبات	٩٢%	اعدادي	عجمي	توسع
	اجمالي العجمي		١١٢		٣٠,٧٨٢					

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	عدد الفصول	تاريخ استلام الموقع	القيمة التعاقدية بالمليون جنية	الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المرحلة	الإدارة	نوع الأتشاء
١	الشروق (مبارك) للتعليم الاساسي	٢٠١٨٤٥	٤٣	٢٠١٩/١٢/٠١	١١,٦٦٦	تشطيبات	%٨٥	اساسي	عامرية	توسع
٢	سيدى عبد القادر الابتدائية المشتركة	٢٠٤١٣٣	٤	٢٠١٩/١٢/٠١	٢,٩٢١	تشطيبات	%٩٥	ابتدائى	عامرية	توسع
٣	العامرية الاعدادية بنات	٢٠٤٣٢٣	٢٧	٢٠١٩/١٢/٠١	٦,٧٧٢	تشطيبات	%٧٧	اعدادي	عامرية	توسع
٤	البيضا من الحضانة للثانوى	٢٠٤٨٤٢	٢٥	٢٠٢٠/٠١/١٤	٧,٤٤٠	تشطيبات	%٧٥	من الحضانة للثانوى	عامرية	توسع
٥	العامرية الثانوية الصناعية بالتروكيماويات	٢٠٦١٠٨	٢٦	٢٠٢٠/٠٢/٢٣	٦,٢٧٢	هيكل رابع	%٤٣	ثانوي صناعي	عامرية	توسع
٦	النهضة الجديدة الابتدائية	٢٠٧٢٣٠	٤	٢٠١٨/٠٤/٠١	٢,٥١٤	تشطيبات	%٩٢	ابتدائى	عامرية	توسع
٧	الثورة سوزان مبارك للتعليم الاساسي	٢٠٨٥٩٠	١٨	٢٠٢٠/٠١/٠١	٦,١٤١	تشطيبات	%٧٥	اساسي	عامرية	توسع
اجمالى العامرية					٤٣,٦٧٦					
١	الوادي للتعليم الاساسي	٢٠٤٧٦٤	١٦	٢٠١٩/١٢/٠١	٥,٦٨٤	هيكل ثان	%٣٥	اساسي	برج العرب	توسع
٢	الحرية (١) الابتدائية	٢٠٤٨٩١	٢٠	٢٠١٩/١٢/٠١	٦,٤٨٢	هيكل رابع	%٥٥	ابتدائى	برج العرب	توسع
٣	بغداد من الحضانه الي الثانوي رسمي لغات	٢٠٧٣٢٩	١٨	٢٠١٩/١٢/٠١	٨,٦٥٢	تشطيبات	%٦٥	من حضانة الي الثانوى لغات	برج العرب	توسع
٤	الجويرة تعليم اساسي	٢٠٧٥٧٠	٢٢	٢٠٢٠/٠٢/٠٤	٩,٤٣٧	تشطيبات	%٦٠	اساسي	برج العرب	توسع
٥	برج العرب الابتدائية	٢٠٨٤٠٢	٣٢	٢٠٢٠/٠٦/٢٩	٨,٩٥٥	تجهيز موقع	%١	ابتدائى	برج العرب	توسع
٦	بغداد تعليم اساسي	٢٠٨٩٥٦	٣٤	٢٠١٩/١٢/٠١	٩,٦٧٨	تشطيبات	%٦٥	اساسي	برج العرب	توسع
٧	ك ٣٤ ابتدائى مشترك	٢١١٧١١	١٠	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٣,٣٩٧	اساسات	%٥	ابتدائى	برج العرب	توسع
اجمالى التوسع					٥٢,٢٨٥					
١	الحى الثانى المجتمع الثالث الرسمية المتميزة	٢١٤٢١٣	٣٣	٢٠١٨/١٢/٠٣	.	تشطيبات	%٨٩	أساسى رسمى لغات	برج العرب	انشاء جديد
١	الغربانيات الابتدائية المشتركة	٢٠٠٨٨٧	٢٠	٢٠١٩/١٢/٠٣	٧,٨٧٩	تشطيبات	%٦٠	ابتدائى	برج العرب	احلال جزئي
اجمالى برج العرب					٦٠,١٦٤					

مدارس جاري العمل خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ و الخطط السابقة لها


الحى	نوع الانشاء				عدد الفصول				التكلفة بالمليون جنية			
	انشاء جديد	توسع	احلال جزئى	اجمالى	انشاء جديد	توسع	احلال جزئى	اجمالى	انشاء جديد	توسع	احلال جزئى	اجمالى
المنتزة ثان	١	٥	.	٦	١٦	٩٨	.	١١٤	١١,٥٥٥	٤١,١	.	٥٢,٦٥٥
المنتزة أول	١	٤	.	٥	٢٢	٨١	.	١٠٣	١١,٥٥٢	٣٠,٩٢٧	.	٤١,٩٧٩
شرق	.	٧	.	٧	.	١٠٢	.	١٠٢	.	٣٦,٥٥٢	.	٣٦,٥٥٢
وسط	١	٣	.	٤	٣٣	٢٩	.	٦٢	١٣,٨٩٦	١٦,٦١٣	.	٣٠,٥٠٩
غرب	.	١	.	١	.	٢٤	.	٢٤	.	٦,٥١١	.	٦,٥١١
العجمى	.	٥	.	٥	.	١١٢	.	١١٢	.	٣٠,٧٨٢	.	٣٠,٧٨٢
العامرية أول	.	٧	.	٧	.	١٤٧	.	١٤٧	.	٤٣,٦٧٦	.	٤٣,٦٧٦
برج العرب	١	٧	١	٩	٣٣	١٥٢	٢٠	٢٠٥	.	٥٢,٢٨٥	٧,٨٧٩	٦٠,١٦٤
الاجمالى	٤	٣٩	١	٤٤	١٠٤	٧٤٥	٢٠	٨٦٩	٣٦,٥٠٣	٢٥٨,٤٤٦	٧,٨٧٩	٣٠٢,٨٢٨

إنجازات هيئة الأبنية التعليمية فرع الإسكندرية خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

الحى	نوع الانشاء				عدد الفصول				التكلفة بالمليون جنية			
	انشاء جديد	توسع	احل كلى	اجمالى	انشاء جديد	توسع	احل كلى	اجمالى	انشاء جديد	توسع	احل كلى	اجمالى
المنتزة ثان	١	٢	.	٣	٢٨	٤٢	.	٧٠	١٣,٣٧٤	١٢,٣٠٧	.	٢٥,٦٨١
المنتزة أول	٥	٦	١	١٢	١٣٧	١٠٠	١٦	٢٥٣	٦٨,٠٤٤	٤٣,١٣٧	٧,١٣٤	١١٨,٣١٥
شرق	.	٤	.	٤	.	٥٨	.	٥٨	.	٢١,٨٨٢	.	٢١,٨٨٢
وسط	١	٣	.	٤	٢٢	٦٤	.	٨٦	١٢,٥٠٩	١٩,٥٣٤	.	٣٢,٠٤٣
الجمرك	.	.	١	١	.	.	٦	٦	.	.	٤,٩١٦	٤,٩١٦
العجمى	.	٣	.	٣	.	٤٧	.	٤٧	.	١١,٦٧٦	.	١١,٦٧٦
العامرية أول	.	٢	.	٢	.	٢٨	.	٢٨	.	١٠,٦٢٧	.	١٠,٦٢٧
برج العرب	٥	٤	.	٩	٤٨	٨٨	.	١٣٦	٣٣,٠٦١	٢٦,١٣٥	.	٥٩,١٩٦
الاجمالى	١٢	٢٤	٢	٣٨	٢٣٥	٤٢٧	٢٢	٦٨٤	١٢٦,٩٨٨	١٤٥,٢٩٨	١٢,٠٥	٢٨٤,٣٣٦


مدارس تم الاسناد و لم يبدأ العمل لحين استخراج التراخيص

م	اسم المدرسة	الرقم التعريفي	نوع الإنشاء	القطاع	عدد الفصول	المرحلة	الموقف التنفيذي
١	المشير عبد الغنى الجمسى ثانوي عام	٢١٠٣٢٤	توسع	المنتزة	٤٦	ثانوي	جاري استخراج تراخيص
٢	خلف مركز تدريب الاصلاح الزراعى الثانوية	٢١١٢٨٩	توسع	المنتزة	٢٤	ثانوي	جاري استخراج تراخيص
٣	مدرسة الكابلات الرسمية لغات	٢١٤٢٢٥	انشاء جديد	المنتزة	٢٨	من الحضانة للثانوي	جاري استخراج تراخيص
٤	شهيد عقيد / ماجد احمد كمال قلينى للغات اساسى	٢٠٦٩٠٦	توسع	شرق	٨	أساسي	جاري استخراج تراخيص
٥	حسن عباس حلمى الثانوية	٢٠٤٨١٦	توسع	العجمي	١٨	ثانوي عام	جاري استخراج تراخيص
٦	بلال بن رباح الاعدادية بنين	٢١٠٤٢٥	توسع	العجمي	٧	اعدادي	جاري استخراج تراخيص
٧	نعيم ابو طالب تعليم اساسى	٢٠٠٦٩٧	توسع	العامة	٩	أساسي	جاري استخراج تراخيص
٨	الانطلاق الثانوية المشتركة	٢٠٤٣٧٢	توسع	العامة	١٠	ثانوي	جاري استخراج تراخيص
٩	عبد ربه خالد الابتدائية المشتركة	٢٠٧٤٧٩	توسع	برج العرب	١٦	ابتدائي	جاري استخراج تراخيص
١٠	خالد بن الوليد تعليم اساسى	٢٠١٩١٠	توسع	برج العرب	١٣	أساسي	جاري استخراج تراخيص
١١	قرية مراقيا الجنوبية الابتدائية	٢٠٤١٩٤	احلال كلي	برج العرب	٨	ابتدائي	جاري استخراج تراخيص
١٢	الحرية الجديدة للتعليم اساسى	٢٠٧٨١٢	توسع	برج العرب	١١	أساسي	جاري استخراج تراخيص
١٣	عمر المختار تعليم اساسى	٢٠٨٨٣٢	توسع	برج العرب	١٢	أساسي	جاري استخراج تراخيص
١٤	ابو بكر الصديق تعليم اساسى	٢٠٨٩٢١	توسع	برج العرب	١٢	أساسي	جاري استخراج تراخيص
١٥	البصرة الثانويه الصناعيه بنات	٢٠٤٣٩٦	احلال كلي	برج العرب	١٢	ثانوي صناعي	جاري استخراج تراخيص
الاجمالي					٢٣٤		

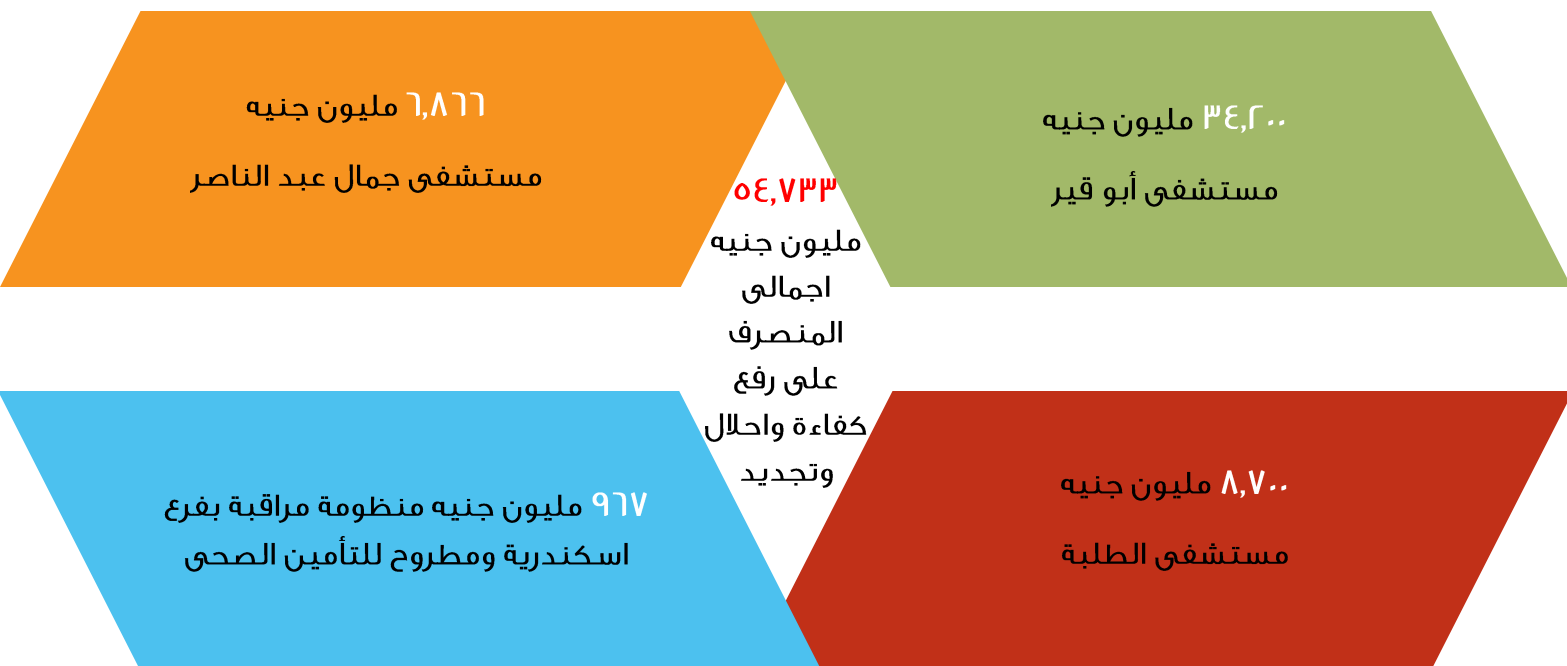

الحى	وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ
المنتزة ثان	تطوير ورفع كفاءة بعض اقسام م . ابو قير مرحلة اولى	٣٢,٧١٦	١٨	٢٠١٩/١٢/٣١ تسليم موقع ٢٠٢٠/٢/٤	مرحلة اولى تحت الصرف	٦٠%
	احلال وتجديد تكييف مركزى م . ابوقير	١٦,١٨٨	١٦,٢٠٠	٢٠١٩/١/٩	تعاقد + مستجدة تحت الصرف	٩٠%
شرق	تكييف مركزى م . الطلبة	٦,٩٤٩	٨,٧٠٠	٢٠١٩/٥/١٢	٢٠٢٠/٧/١١	١٠٠%
		٠,٤١٩				
وسط	احلال وتجديد ٩ مصاعد م. جمال عبد الناصر	٤,٣٩٢	٤,٣٩٢	٢٠١٩/٢/١٢	٢٠٢٠/٤/٢٣	١٠٠%
	ترميم مبنى الجراحات م . جمال عبد الناصر	٢٤,٥٥٤	٢,٤٧٤	٢٠١٦/٣/٩	٢٠٢٠/٣/٨	١٠٠%
جميع نطاق الفرع اسكندرية + مطروح	مشروع توريد وتركيب منظومة مراقبة متكاملة كاميرات	٤,٨٣٩	٤,٩٦٧	٢٠١٩/٧/٢	٢٠٢٠/٥/١	١٠٠%
الاجمالى		٩٠,٠٥٧	٥٤,٧٣٣			

➤ ١٨٥٦ مليون جنيه اجمالي المنصرف على انشاء واحلال وتجديد وصيانة وترميم منشآت الجامعة

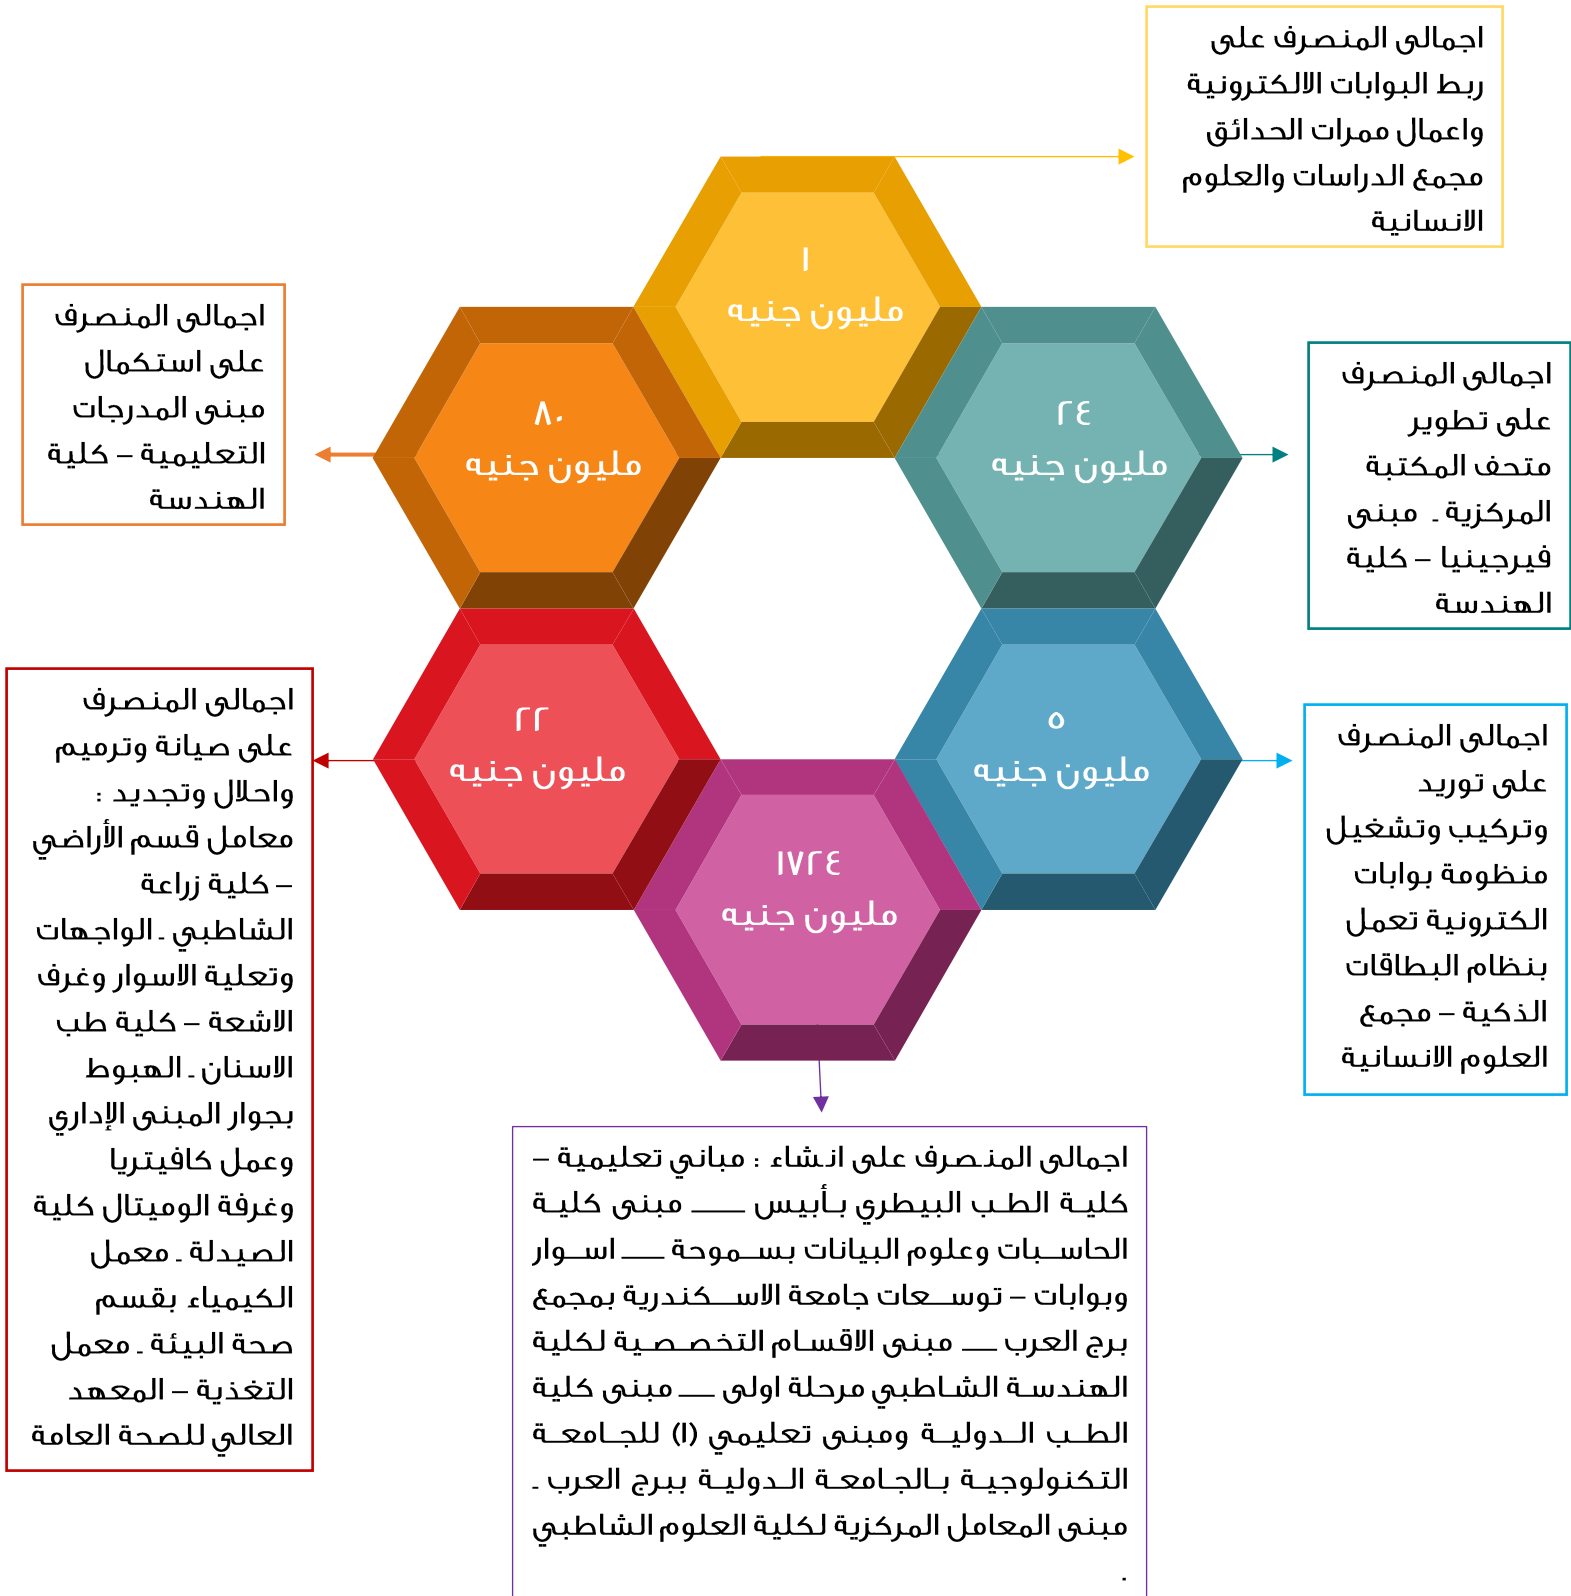

اسم المشروع	وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة بالمليون جنيه	العائد من المشروع
مرحلة اولى – انشاء مباني تعليمية – كلية الطب البيطري بأبيس	انشاء مباني تعليمية	١٨/٥/٢٠١٧	١/١١/٢٠٢٠	١٣١	استيعاب اعداد جديدة من الطلاب
انشاء اسوار وبوابات – توسعات جامعة الاسكندرية بمجمع برج العرب	انشاء اسوار وبوابات – توسعات جامعة الاسكندرية	٢٠/٩/٢٠١٧	٢٠/٩/٢٠٢٠	٥٢	حماية الطلاب والمنشآت
صيانة وترميم معامل قسم الأراضي – كلية زراعة الشاطبي	صيانة وترميم معامل قسم الأراضي	٢٣/٥/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠٢٠	٣	تطوير و اصلاح التالف من المباني
استكمال مبنى المدرجات التعليمية – كلية الهندسة	استكمال مبنى المدرجات التعليمية – كلية الهندسة	٩/١/٢٠١٩	١/١٢/٢٠٢٠	٨٠	استيعاب اعداد جديدة من الطلاب
ربط البوابات الالكترونية واعمال الحدائق مجمع الدراسات والعلوم الانسانية	ربط البوابات الالكترونية واعمال الحدائق مجمع الدراسات والعلوم الانسانية	١٣/٥/٢٠١٩	٢١/١٠/٢٠٢٠	١	حماية الطلاب والمنشآت
اعمال الترميم والصيانة – كلية الصيدلة	اعمال الترميم والصيانة	٢٨/٥/٢٠١٩	٢٤/٨/٢٠٢٠	٢	تطوير واصلاح التالف من المباني
تطوير متحف المكتبة المركزية	تطوير متحف المكتبة المركزية	٣١/٧/٢٠١٩	٣٠/٧/٢٠٢٠	٨	تطوير واصلاح التالف من المباني
تعلية مبنى الثافل ومبنى المكفوفين وانشاء مبنى ادارة الحسابات المركزية – كلية الآداب	تعلية مبنى الثافل ومبنى المكفوفين وانشاء مبنى ادارة الحسابات المركزية – كلية الآداب	٣١/٧/٢٠١٩	١٩/٩/٢٠٢٠	١١	استيعاب اعداد جديدة من الطلاب
تطوير مبنى فيرجينيا – كلية الهندسة	تطوير مبنى فيرجينيا – كلية الهندسة	٢٥/٨/٢٠١٩	١/١١/٢٠٢٠	١٦	تطوير واصلاح التالف من المباني
ترميم واحلال وتجديد الواجهات وتعلية الاسوار وغرف الاشعة – كلية طب الاسنان	ترميم واحلال وتجديد الواجهات وتعلية الاسوار وغرف الاشعة – كلية طب الاسنان	١٦/٩/٢٠١٩	٢٠/١٢/٢٠٢٠	١٥	حماية الطلاب والمنشآت
عملية انشاء بوابة كلية السياحة	عملية انشاء بوابة كلية السياحة	١٩/٩/٢٠١٩	٢١/١٠/٢٠٢٠	١	حماية الطلاب والمنشآت
انشاء مبنى كلية الحاسبات وعلوم البيانات بسموحة	انشاء مبنى كلية الحاسبات وعلوم البيانات	١٩/١٢/٢٠١٩	١٩/١٠/٢٠٢١	١١٣	استيعاب اعداد جديدة من الطلاب
اعمال اصلاح الهبوط بجوار المبنى الإداري وعمل كافيتريا وغرفة الوميتال	اعمال اصلاح الهبوط بجوار المبنى الإداري وعمل كافيتريا وغرفة الوميتال	٣٠/١٢/٢٠١٩	٣٠/٩/٢٠٢٠	١	تطوير واصلاح التالف من المباني
انشاء مبنى الاقسام التخصصية لكلية الهندسة الشاطبي مرحلة اولى	انشاء مبنى الاقسام التخصصية لكلية الهندسة	١/١/٢٠٢٠	١/١/٢٠٢١	١٠٥	تطوير وانشاء بديل التالف من المباني

اسم المشروع	وصف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة بالمليون جنيه	العائد من المشروع
انشاء مبنى كلية الطب الدولية ومبنى تعليمي (I) للجامعة التكنولوجية بالجامعة الدولية ببرج العرب	انشاء مبنى كلية الطب الدولية ومبنى تعليمي (I) للجامعة التكنولوجية بالجامعة الدولية	١٥/٣/٢٠٢٠	١٥/١/٢٠٢٢	١٥٣	استيعاب اعداد جديدة من الطلاب
انشاء مبنى المعامل المركزية لكلية العلوم الشاطبي	انشاء مبنى المعامل المركزية	١٩/٤/٢٠٢٠	١٩/٤/٢٠٢٢	٢٦٠	استيعاب اعداد جديدة من الطلاب
اعمال توريد وتركيب وتشغيل منظومة بوابات الكترونية تعمل بنظام البطاقات الذكية – مجمع العلوم الانسانية	اعمال توريد وتركيب وتشغيل منظومة بوابات الكترونية تعمل بنظام البطاقات الذكية – مجمع العلوم الانسانية	١/٥/٢٠٢٠	١١/٩/٢٠٢٠	٥	حماية الطلاب والمنشآت
انشاء كلية الالسن واللغات التطبيقية بأرض الجامعة بأبيس	انشاء كلية الالسن واللغات التطبيقية	٤/٥/٢٠٢٠	١٢/٥/٢٠٢١	٢٥١	تطوير وانشاء بديل التالف من المباني
كلية الطب البيطري (انشاء مبنى المدرجات ومبنى المعامل مرحلة ثانية تشطيبات)	انشاء مبنى المدرجات ومبنى المعامل	١/٨/٢٠٢٠	١/٤/٢٠٢٢	٢٠٠	استيعاب اعداد جديدة من الطلاب
انشاء كلية التربية النوعية وكلية رياض الاطفال بأرض الجامعة بأبيس	انشاء كلية التربية النوعية وكلية رياض الاطفال	٥/٨/٢٠٢٠	٥/١٠/٢٠٢٠	١٥٥	تطوير وانشاء بديل التالف من المباني
احلال وتجديد معمل الكيمياء بقسم صحة البيئة	احلال وتجديد معمل الكيمياء بقسم صحة البيئة	١٧/٥/٢٠٢٠	١٧/١٠/٢٠٢٠	١	تطوير واصلاح التالف من المباني
احلال وتجديد معمل التغذية – المعهد العالي للصحة العامة	احلال وتجديد معمل التغذية	١٧/٥/٢٠٢٠	١٧/١٠/٢٠٢٠	٠	تطوير واصلاح التالف من المباني
الاجمالي		١٨٥٦			

➤ ٣١,٦٧٢ مليون جنيه اجمالى المنصرف على مشروعات الانشاء والصيانة والترميم
واعادة التأهيل ورفع الكفاءة



جهاز تعمير الساحل الشمالى

الحي	وصف المشروع	التكلفة بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ
المنتزة	اعادة تأهيل اعمال فواصل واسوار ودهانات لعدد ٤ كباري سيارات بالطريق الدولي ٤٥	٩,٦٣٩	١,٠٢٥	٢٧-٠٢-٢٠٢٠	٢٦-٠٨-٢٠٢٠	١٠٪
المنتزة اول	عملية ترميم وإعادة تأهيل نفق سيدي بشر	٤,٨٨٣	.	٢٧/٢/٢٠٢٠	٢٦-١١-٢٠٢٠	٢٠٪
منتزة ثان	مشروع صيانته وإعادة تأهيل كوبري العامة بالطابية	٢,٤٨٣	٢,١٣٤	١٣/٢/٢٠١٩	١٢-٠٢-٢٠٢٠	%١٠٠
	صيانة وإعادة تأهيل كوبري ١٤ مايو	٧,٠٨٥	٤,٥٠٩	٠٨-٠٩-٢٠١٩	٠٦-٠٤-٢٠٢٠	%١٠٠
	ترميم واعادة تأهيل مشروع كوبري ناصر	٢,٢٤٣	٠,٩٤٧	٢٧/٢/٢٠٢٠	٢٦-١١-٢٠٢٠	٧٥٪
	مشروع استبدال اسوار كوبري العوايد وكوبري الناموس	٥,٦٦٣	٤,٨٣١	١٨-٠٢-٢٠١٩	١٧-١١-٢٠١٩	%١٠٠
	مشروع استبدال فواصل كوبري العوايد	٤,٥٥٥	٣,٥٢٣	١٥-١٢-٢٠١٩	٠٦-٠١-٢٠٢٠	%١٠٠
	مشروع استبدال فواصل كوبري ابيس	٣,١٢٨	٣,١٢٨	٠٢-٠٣-٢٠١٩	٠١-٠٦-٢٠١٩	%١٠٠
	انشاء نفق مشاه للربط بين شارع النصر وشارع المواسير جرين بلازا	٢٩,١٧	.	١١-٠٦-٢٠٢٠	١٠-٠٩-٢٠٢٠	-
	مشروع استبدال الفواصل بكوبري ١٤ مايو	٠,٧٨٥	٠,٣٧٨	١٢-٠٩-٢٠١٩	١٧-٠٩-٢٠١٩	%١٠٠
شرق	كوبري صينية محرم بك			٢٥-٠١-٢٠٢٠	٠٦-٠٢-٢٠٢٠	%١٠٠
وسط	اعادة تأهيل كوبري الأسكندرية بمحرم بك واستكمال اعمال المطالع والمنازل	٢,٨٢٤	.	٢٠-٠٤-٢٠٢٠	١٩-٠٦-٢٠٢٠	%١٠٠
	ترميم ورفع كفاءة كوبرى سيارات الحضرة (كوبرى ناريمان)	١,٨٠٥	.	٢٠٢٠/٢/٢٧	٢٠٢٠/١١/٢٦	%٠
	رفع كفاءة كوبرى صينية محرم بك	٣,٠٧٨	٠,٧٣	٢٠٢٠/٣/١٨	٢٠٢٠/٥/١٧	%١٠٠
	مشروع انشاء أسوار لاستراحة السكة الحديد بالحضرة	٠,٥٠٠	٠,٤٧٢	٢٠٢٠/١/١٤	٢٠٢٠/٤/١٣	%١٠٠
العجمي	انشاء سور حاجز رؤية كوبري الملح	١,٠٧٨	.	٢٧-٠٢-٢٠٢٠	٢٦-٠٥-٢٠٢٠	٨٥٪
العامة اول	كوبري مشاة كم ٣٢ صحراوي	٤,٢	٣,٩٧٧	٠٥-٠١-٢٠١٧	٠٤-٠١-٢٠١٨	%١٠٠
العمرية ثاني	كوبري مشاة عند مدخل قرية الجلاء	٨,٤٤٤	٢,٤٩٩	٠٨-٠٤-٢٠٢٠	٠٧-٠١-٢٠٢١	%٣
	كوبري مشاة عند مدخل قرية الهوارية	٤,٧٠٠	١,٤٩٩	٢٢/٣/٢٠٢٠	٢١-١٢-٢٠٢٠	%٢٥
الاحياء	صيانه كورنيش الاسكندرية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠	٦	٢,٠٢	٢٩-٠٣-٢٠٢٠	٢٨-٠٦-٢٠٢٠	%١٠٠
الاجمالى		١٠٢,٢٦٣	٣١,٦٧٢			

٤١,١ مليون جنيه المنصرف على إحلال وتجديد شبكات مياه بطول ٦,٥ كم و إحلال وتجديد شبكات للصرف الصحي بطول ٣,١٧ كم بحى العامرية أول لخدمة ١٢ ألف نسمة .

الحى	وصف المشروع	الاعتماد بالمليون جنية	المنصر ف بالمليون جنية	تاريخ البدا	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ %	عدد المستفيدي ن
العامرية أول	إحلال وتجديد شبكات مياه بطول ٦,٥ كم	١٣,٧٥	٢١,٤٤	٢٠١٩/٢/٣	٢٠٢٠/١٢/٣	٣٥%	١٢ ألف نسمة
	إحلال وتجديد شبكات للصرف الصحي بطول ٣,١٧ كم	٠,٢٥	١٩,٦٦	٢٠١٩/١/٢٧ ٩	٢٠٢٠/٦/٨	٩٥%	
الاجمالى		١٤	٤١,١				

مع تحيات الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق

إدارة الدعم

أ / أمال فهمي عبد الوهاب
مدير الإدارة

أسرة الإدارة

سها الهرميل
ميرفت خليل ابراهيم
ياسمين محمد

إدارة النشر

أ / هويدا علي عبد العال
مدير الإدارة

أسرة الإدارة

صفاء عبد المنعم
نجوى خليل إبراهيم
أية يوسف

**أسرة
الإعداد**

الإشراف العام

م / نهى أحمد السيد

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق
