



محافظة الإسكندرية

مديرية الطرق والنقل

مركز المعلومات

بيان تقديري عن أعمال مديرية الطرق والنقل حتى مارس للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

بيان الموقف المالي لخطة الصرف للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ - شهر مارس					
م	اسم العملية	الخطة	اسم الشركة	مبلغ الترسية (جنيه)	نسبة التنفيذ عينا
١	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي المنتزه اول ١	خطة استثمارية	الندا كريت	١٢,٢٤٣,٩٥٠	%٥
٢	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي المنتزه اول ٢	خطة استثمارية	الندا كريت	٨,٩٩٦,٧٣٠	%٠
٣	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي المنتزه ثان ١	خطة استثمارية	الغزال	٤,٩٠٩,٥٠٠	%١٥
٤	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي المنتزه ثان ٢	خطة استثمارية	حورس	١١,٠٦٣,٩١٠	%٢٥
٥	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي شرق ١	خطة استثمارية	شركة اسكندرية للمقاولات	١٥,٠١٧,٥٠٠	%١
٦	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي شرق ٢	خطة استثمارية	أحمد رفعت أحمد الجزار	٦,٨٦٧,٧٩٠	%١٠
٧	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي وسط ١	خطة استثمارية	شركة الأمل (أشرف فودة)	١٠,٤٩٦,٨٥٠	%٦٥
٨	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي وسط ٢	خطة استثمارية	الجمعية (دمنهور)	٣,٦٧٦,٣٨٠	%٠
٩	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي غرب ١	خطة استثمارية	رمضان عوض الله لإنشاء ورصف الطرق	٨,٩٥١,٣٧٠	%٣٠
١٠	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي غرب ٢	خطة استثمارية	الجمعية (ايهاب فؤاد)	٦,٩٩٩,٠٠٠	%٣٥
١١	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي الجمرك	خطة استثمارية	العربية للمقاولات ورصف الطرق	٥,٥١١,٠٨٣	%١٠
١٢	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي العجمي ١	خطة استثمارية	عباد الرحمن	٨,٢٩٢,٤٠٠	%٤٠
١٣	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي العجمي ٢	خطة استثمارية	محمد عبد الله	٨,٤٩٩,٨٤٠	%٤٠
١٤	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي العامرية أول ١	خطة استثمارية	عبد الحميد محمد سالم	٨,٤٩٨,٤٦٥	%٣٥
١٥	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي العامرية أول ٢	خطة استثمارية	معروف	٧,٦٩٨,٢٩٠	%٣٥
١٦	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي العامرية ثان ١	خطة استثمارية	محمد عباس	٨,٩٩٧,٨٣٠	%٣٠
١٧	رصف طرق و ارصفة بنطاق حي العامرية ثان ٢	خطة استثمارية	عبد الحميد محمد سالم	٥,٣٨٥,٦٠٠	%٣٠
١٨	مركز ومدينة برج العرب		يتبع مبادرة حياء كريمة		




- مدة الأعمال بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢١ تقريبا خمسة أشهر ونصف من تاريخ استلام الموقع.
- تم الإنتهاء من العمل بقطاعات طريق مصطفى كامل أعمال رفع الكفاءة بنطاق حي المنتزة أول وحي المنتزة ثان .

الاعمال الجارى تنفيذها :

- إجمالي ما تم تنفيذه ٥٥٣.٦٦ مليون جنيه وبطول تقريبي ٢٧٦.٨٢ كم من بداية الخطة حتى تاريخه وبيانها كالتالى :

- أولا : تم تنفيذ أعمال بقيمة ٤٠٧.٢١ مليون عشوائيات بطول تقريبي ٢٠٣.٦٠ كم .
 - ثانيا : تم تنفيذ أعمال بقيمة ١٠٠.٦٨ مليون إعادة الشئ لأصله بطول تقريبي ٥٠.٣٤ كم للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
 - ثالثا: تم تنفيذ أعمال بقيمة ٣٤.١٦ مليون بالخطة الاستثمارية بطول تقريبي ١٧.٠٨ كم للعام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢١ .
 - رابعا :تم تنفيذ أعمال بقيمة ١١.٦١ مليون جنيه بالمنحة الأوروبية بطول تقريبي ٥.٨ كم.
- مرفق بيان بالمربعات وكذلك بيان بالصور لمواقع العمل .

اولا : اعمال العشوائيات ٢٠٢٠/٢٠٢١

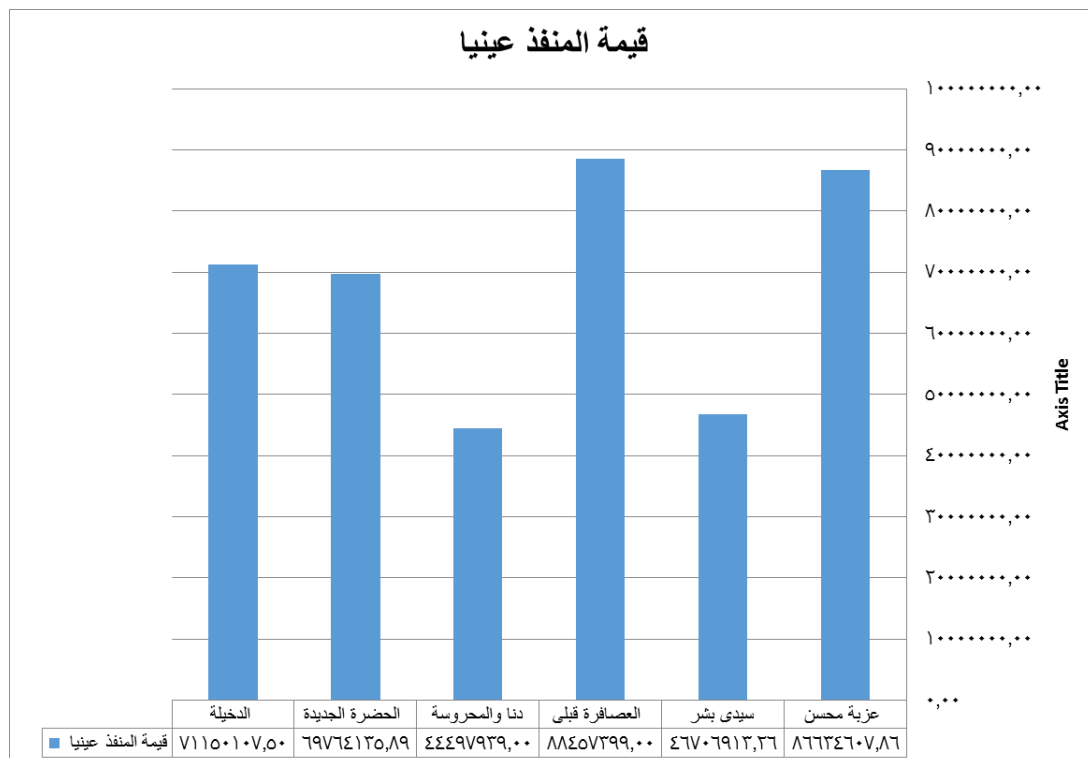



ثانيا : أعمال إعادة الشيء لأصله

تم تنفيذ أعمال بقيمة ١٠٠.٦٨ مليون إعادة الشيء لأصله بطول تقريبي ٥٠.٣٤ كم.
جارى العمل لإعادة الشيء لأصله لجميع المرافق وتجهيز ما يستجد من أعمال أولا بأول
ومرفق بيان مصور بأسماء الشوارع لبعض مواقع الأعمال .

ويذكر على سبيل المثال:

- أعمال الصيانة للأعمال الصغيرة و توصيلات الأهالي لحي الجمرك لصالح شركة المياه.
- أعمال صيانة الأرصفة والأعمال الطارئة والهبوطات و توصيلات الأهالي لأحياء وسط و الجمرك و غرب لصالح شركة الكهرباء.
- أعمال الصيانة وتوصيلات الاهالي و الاعطال الصغيرة لحي غرب للعام المال ٢٠١٩/٢٠١٨ لصالح التليفونات.
- أعمال صيانة الأرصفة والأعمال الطارئة والهبوطات و توصيلات الاهالي لأحياء وسط و الجمرك و غرب للعام المال ٢٠١٩/٢٠١٨ لصالح الأهالي.
- أعمال سنوية صيانة الاهالي والاعطال الصغيره لحي العجمي لصالح شركة المصرية للاتصالات.
- أعمال سنوية صيانة الاهالي والاعطال الصغيره لحي منتزة ثان لصالح الأهالي.
- أعمال صيانة الشوارع بالأسفلت بحي منتزة أول لصالح المحافظة.
- أعمال صيانة الاهالي والاعطال الصغيره لحي العجمي لصالح شركة ناتجاس.
- أعمال الصيانة الصغيرة و توصيلات الاهالي لحي جمرك لصالح الأهالي.
- سنوية توصيلات الاهالي والاعطال الصغيرة لحي غرب ٢٠١٨/٢٠١٩ لصالح شركة الكهرباء.
- سنوية صيانة الشوارع بالأسفلت لحي العجمي(مساكن الضباط طوسن امام نادي الفتح بجوار معسكر الذخيرة) لصالح شركة الصرف الصحي.
- صيانة الأعمال الصغيرة والأعمال الطارئة وتوصيلات الأهالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ ش الاسماعيليه مع ش ذو الفقار فيلا المخابرات الحربية) لصالح المحافظة.
